N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/23**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/23	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/23	Mar 07/02/23
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/23	Mar 14/02/23
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/23
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/23
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/23	Ven 31/03/23
11			**Execution**	**523 jours**	**Ven 31/03/2**	**Mar 01/04/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/23	Ven 28/04/23
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/23	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
24			Administration du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
25			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
26			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
27			Gestion des stages	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
28			Validation sprint 1	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
29			Itération 4: Gérer les paiements	60 jours	Lun 02/10/23	Ven 22/12/23
30			Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
31			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
32			Validation Sprint 2	0 jour	Ven 22/12/23	Ven 22/12/23
33			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Lun 25/12/23	Ven 15/03/24
34			Sprint 3	0 jour	Ven 15/03/24	Ven 15/03/24
35			Gérer la discipline	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
36			Gestion des enseignements	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
37			Sprint 4	0 jour	Ven 07/06/24	Ven 07/06/24
38			Admission	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
39			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
40			Sprint 5	0 jour	Ven 30/08/24	Ven 30/08/24
41			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Lun 02/09/24	Ven 22/11/24
42			Sprint 6	0 jour	Ven 22/11/24	Ven 22/11/24
43			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Lun 25/11/24	Mar 24/12/24
44			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mer 25/12/24	Mar 07/01/25
45			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mer 08/01/25	Mar 01/04/25
46			FIN	0 jour	Mar 01/04/25	Mar 01/04/25

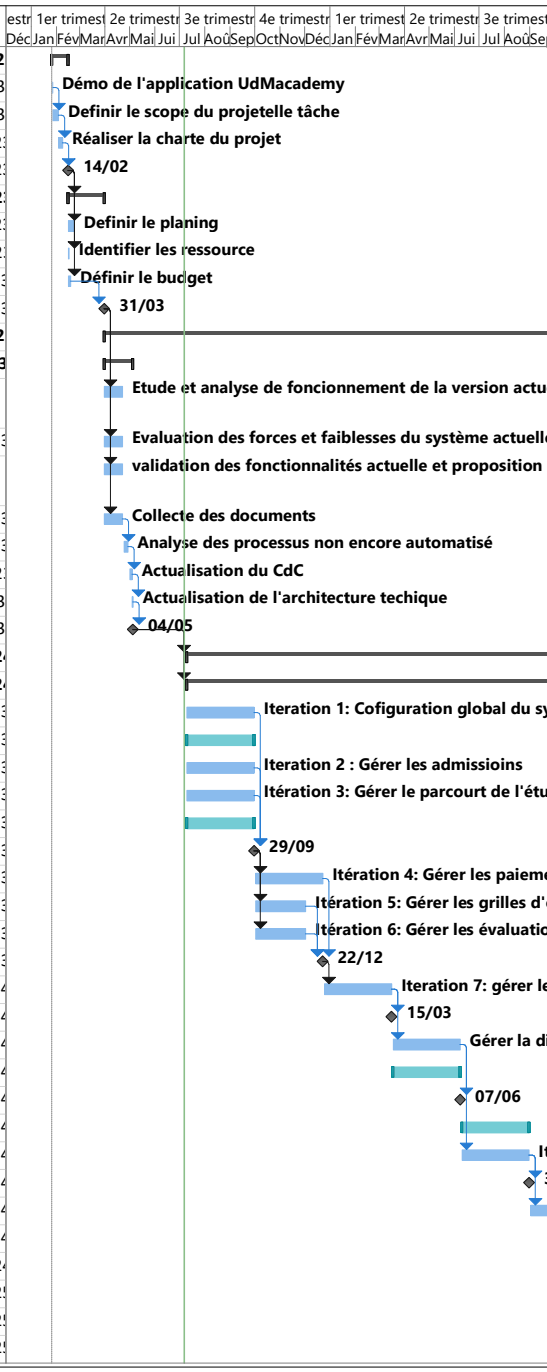
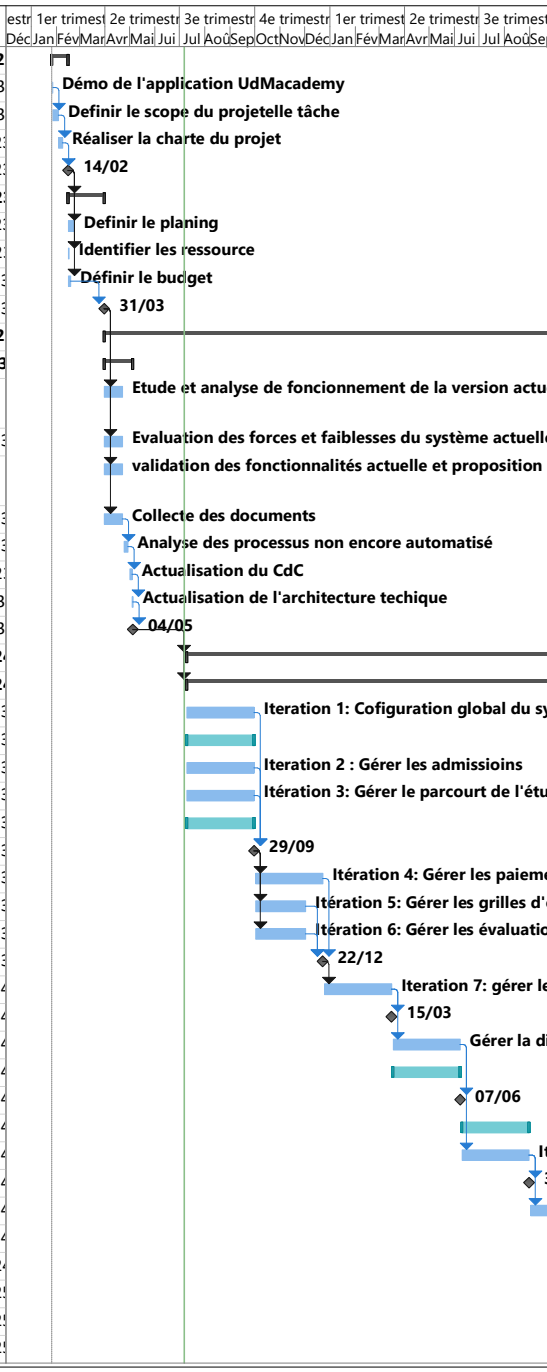
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/23**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/23	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/23	Mar 07/02/23
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/23	Mar 14/02/23
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/23
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/23
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/23	Ven 31/03/23
11			**Execution**	**523 jours**	**Ven 31/03/2**	**Mar 01/04/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/23	Ven 28/04/23
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/23	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
24			Administration du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
25			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
26			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
27			Gestion des stages	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
28			Validation sprint 1	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
29			Itération 4: Gérer les paiements	60 jours	Lun 02/10/23	Ven 22/12/23
30			Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
31			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
32			Validation Sprint 2	0 jour	Ven 22/12/23	Ven 22/12/23
33			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Lun 25/12/23	Ven 15/03/24
34			Sprint 3	0 jour	Ven 15/03/24	Ven 15/03/24
35			Gérer la discipline	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
36			Gestion des enseignements	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
37			Sprint 4	0 jour	Ven 07/06/24	Ven 07/06/24
38			Admission	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
39			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
40			Sprint 5	0 jour	Ven 30/08/24	Ven 30/08/24
41			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Lun 02/09/24	Ven 22/11/24
42			Sprint 6	0 jour	Ven 22/11/24	Ven 22/11/24
43			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Lun 25/11/24	Mar 24/12/24
44			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mer 25/12/24	Mar 07/01/25
45			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mer 08/01/25	Mar 01/04/25
46			FIN	0 jour	Mar 01/04/25	Mar 01/04/25
