N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/23**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/23	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/23	Mar 07/02/23
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/23	Mar 14/02/23
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/23
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/23
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/23	Ven 31/03/23
11			**Execution**	**523 jours**	**Ven 31/03/2**	**Mar 01/04/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/23	Ven 28/04/23
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/23	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
24			Administration du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
25			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
26			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
27			Gestion des stages	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
28			Validation sprint 1	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
29			Itération 4: Gérer les paiements	60 jours	Lun 02/10/23	Ven 22/12/23
30			Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
31			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
32			Validation Sprint 2	0 jour	Ven 22/12/23	Ven 22/12/23
33			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Lun 25/12/23	Ven 15/03/24
34			Sprint 3	0 jour	Ven 15/03/24	Ven 15/03/24
35			Gérer la discipline	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
36			Gestion des enseignements	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
37			Sprint 4	0 jour	Ven 07/06/24	Ven 07/06/24
38			Admission	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
39			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
40			Sprint 5	0 jour	Ven 30/08/24	Ven 30/08/24
41			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Lun 02/09/24	Ven 22/11/24
42			Sprint 6	0 jour	Ven 22/11/24	Ven 22/11/24
43			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Lun 25/11/24	Mar 24/12/24
44			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mer 25/12/24	Mar 07/01/25
45			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mer 08/01/25	Mar 01/04/25
46			FIN	0 jour	Mar 01/04/25	Mar 01/04/25

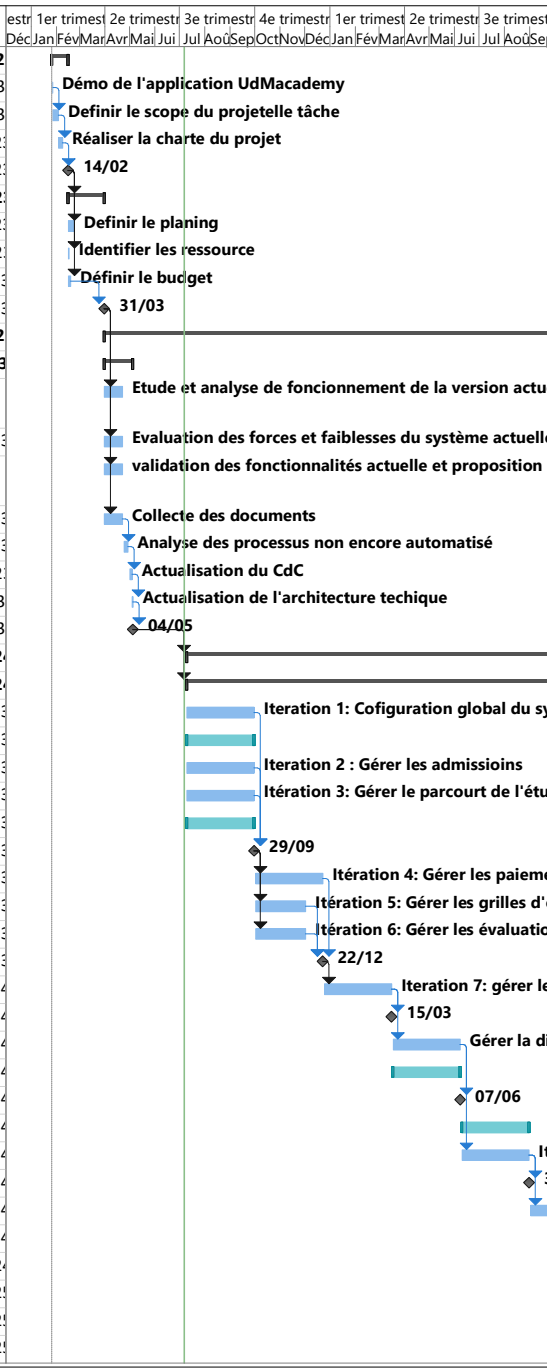

DEVELOPPEMENT ET MI
PLACE D'UNE SYSTÈ
INTEGRE DE GESTIC
ACADEMIQUE A L'Uc

Contexte et justification du projet

- La plateforme Udmacademy 2.0 vise à offrir une plateforme se
des informations académique basée sur les technologies du w
- Cette plateforme est opérationnelle à l'UdM depuis 2019 et
données liées à l'inscription académique et au traitement des r
- Son exploitation est limitée à 5 scolarités sur les 6 existantes
- Son développement n'intègre pas toutes les problématique
académique à l'UdM
- Ce projet tient son intérêt de l'impérieuse nécessité de finali
de cette plateforme, assurer que son fonctionnement est con
spécifications de l'UdM, mais aussi et surtout garantir un trans
l'équipe en place pour l'accompagnement et éventuellemen
développements futurs

Objectif: Dématérialisation de la gestion a

D'un point de vue général il s'agira de doter l'UdM dans un délais de deux ans d'un ERP fonctionnel

Plus spécifiquement il s'agit de:

- Faire un transfert de compétence pour la prise en main complète de la solution UDMACADEMY
- Maturer les modules fonctionnels
- Compléter les modules non encore intégrés

Périmètre du projet

- Ce projet couvre l'ensemble des besoins liés à la gestion a
de gérer le parcourt de l'étudiant depuis son admission j
proposant des outils pour répondre aux besoins liés à l'i
paiements des frais de scolarité, planification des exame
cours, et productions des états y afférents etc…

Délais: deux ans
du 26/01/2023 au 03/03/2025

Méthode de travail:

Nous proposons une méthode de travail basée sur les techniques agiles.
Nous procéderons à un découpage du projet en sous projet. La validation des fonctionnalité d
enclenchera la planification du sous projet suivant.
De cette façon nous pourrons mesurer l'évolution réelle du projet et évaluer son adaptabilité a
l'UdM

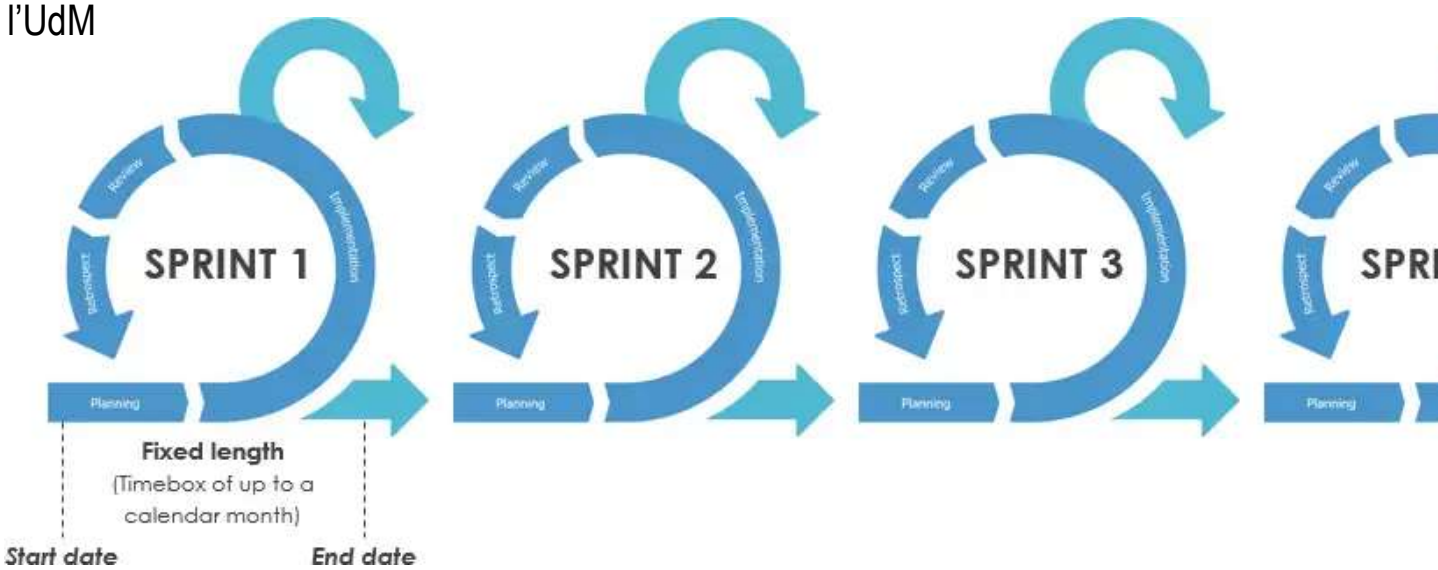

Etat des lieux des fonctionalitées ac
UdMAcademy :

-Configuration générale

-Gestion des grilles

-Gestion des évaluations

-Parcourt de l'étudiant

-Inscriptions en ligne

-Suivi des règlements des frais de scolarité

-Etats (PVs,relevés de note, certificat de scolarité, listes de présence….)

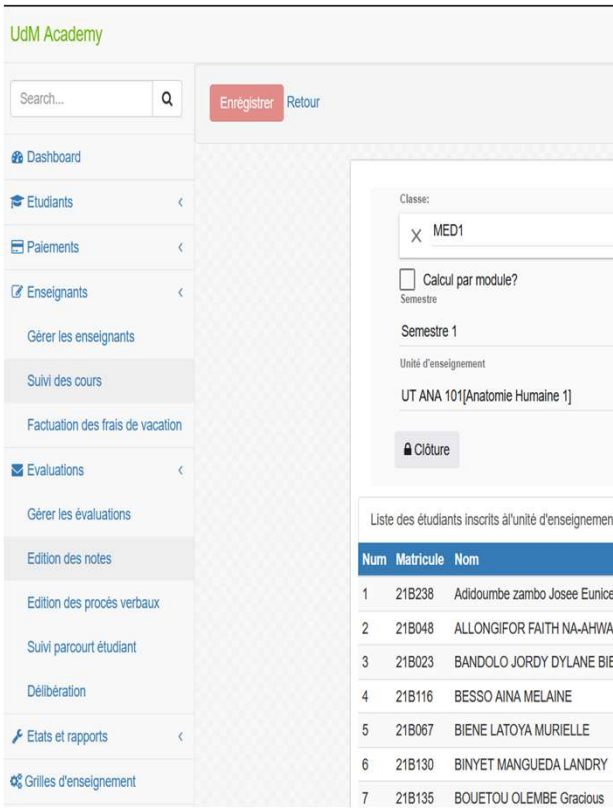

Notre approche de travail

- Compte tenu du fait que l'application a connu une avancée de
ou moins importante, Il serait impératif que l'équipe techni
procède à une analyse des fonctionnalités actuelles afin de
maturation. Le plan de maturation permettra de propo
d'amélioration des fonctionnalités actuelles et de garantir qu
aux besoins de l'institution. Cette démarche débouchera su
livrables.
- Après la maturation des modules opérationnels, nou
développement des module non encore existants suivant la m
démarrage de chaque module un document de spécifications
soumis par le maître d'ouvrage. Ce document servira de bou
garantir que les livrables conviennent aux attentes.
- Chaque itération sera validé par un cahier de recette dûmen
maître d'ouvrage

Organisation de l’application

L’application est organisée selon une architecture modulaire:

- **SchoolGlobalConfig** : il s’agit du module contenant l’ensemble des composants de config
- **User** : le module de gestion des utilisateurs, contient les composants permettant de groupes et les permissions
- **Registration** : il s’agit du module permettant de gérer les inscriptions académiques et les permettra en outre (en cours de développement) de produire les différents actes académic
- **Payment** : ce module permet de gérer les recouvrements de frais de scolarité. Dans ce un composant qui a été mis à la disposition de la banque UBA. Ce composant permet de d’étudiant avec la la base de donnée. Cette synchronisation se fait en temps réel.
- **Exam** : ce module contient l’ensemble des composants permettant de gérer les évaluatio calculer les notes, calculer les notes pondérées et produire les procès-verbaux
- **Application :** il s’agit du module qui ne contient que les entités du domaine

Technologies utilisées

- Front end: bootstrap, angularjs, jquery
- backend: PHP
- Framework: laminas
- Database: Mysql
- ORM: Doctrine 2

Planification

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/2**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/2	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/2	Mar 07/02/2
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/2	Mar 14/02/2
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/2
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/2
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/2	Ven 31/03/2
11			**Execution**	**502 jours**	**Ven 31/03/2**	**Lun 03/03/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUI**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/2	Ven 28/04/2
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/2	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itération**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
24			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
25			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiante>	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
26			validation iteration 1, 2, 3	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
27			Itération 4: Gérer les frais de scolarité	60 jours	Ven 28/07/2	Jeu 19/10/23
28			Itération 5: Gérer les enseignements	45 jours	Ven 28/07/2	Jeu 28/09/23
29			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Ven 28/07/2	Jeu 28/09/23
30			Validation iteration 4,5,6	0 jour	Ven 24/11/2	Ven 24/11/2
31			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Ven 24/11/2	Jeu 15/02/24
32			validation iteration 7	0 jour	Jeu 15/02/24	Jeu 15/02/24
33			Iteration 8: planification des enseignements	60 jours	Ven 16/02/2	Jeu 09/05/24
34			Validation iteration 8	0 jour	Jeu 09/05/24	Jeu 09/05/24
35			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Ven 10/05/2	Jeu 01/08/24
36			validation iteration 9	0 jour	Jeu 01/08/24	Jeu 01/08/24
37			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Ven 02/08/2	Jeu 24/10/24
38			Validation itération 10	0 jour	Jeu 24/10/24	Jeu 24/10/24
39			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Ven 25/10/2	Lun 25/11/24
40			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mar 26/11/2	Lun 09/12/24
41			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mar 10/12/2	Lun 03/03/25
42			FIN	0 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25

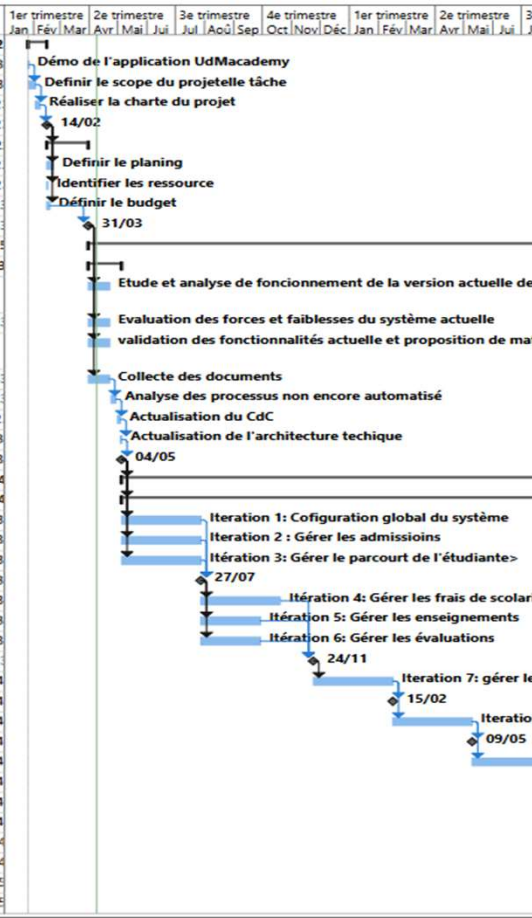

Notre équipe

- Chef de Projet: Wangun Parfait Wangun Ing Informaticien
- Senior Developper: MESSANGA Landry Ing Informaticien
- Junio Develooper: FANSEU Stevy Developperu

Résultats attendus

- Gain de temps dans le processus de gestion académique
- Limitation des érreurs
- Base de données centralisées
- Interaction avec toutes les parties prenantes de la gestion
- Fiabilité des informations
- Sécurisation de la plateforme

Merci
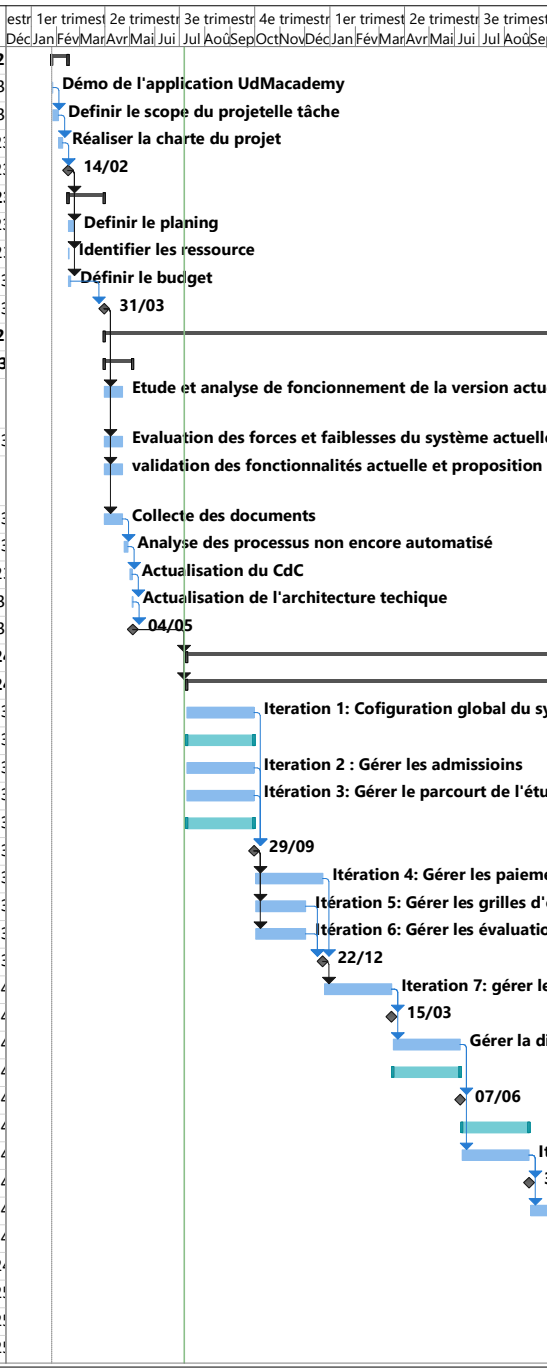
N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/23**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/23	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/23	Mar 07/02/23
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/23	Mar 14/02/23
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/23
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/23
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/23	Ven 31/03/23
11			**Execution**	**523 jours**	**Ven 31/03/2**	**Mar 01/04/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/23	Ven 28/04/23
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/23	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior**	**360 jours**	**Lun 10/07/2**	**Ven 22/11/2**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
24			Administration du système	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
25			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
26			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiant	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
27			Gestion des stages	60 jours	Lun 10/07/23	Ven 29/09/23
28			Validation sprint 1	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
29			Itération 4: Gérer les paiements	60 jours	Lun 02/10/23	Ven 22/12/23
30			Itération 5: Gérer les grilles d'enseignement	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
31			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Lun 02/10/23	Ven 01/12/23
32			Validation Sprint 2	0 jour	Ven 22/12/23	Ven 22/12/23
33			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Lun 25/12/23	Ven 15/03/24
34			Sprint 3	0 jour	Ven 15/03/24	Ven 15/03/24
35			Gérer la discipline	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
36			Gestion des enseignements	60 jours	Lun 18/03/24	Ven 07/06/24
37			Sprint 4	0 jour	Ven 07/06/24	Ven 07/06/24
38			Admission	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
39			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Lun 10/06/24	Ven 30/08/24
40			Sprint 5	0 jour	Ven 30/08/24	Ven 30/08/24
41			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Lun 02/09/24	Ven 22/11/24
42			Sprint 6	0 jour	Ven 22/11/24	Ven 22/11/24
43			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Lun 25/11/24	Mar 24/12/24
44			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mer 25/12/24	Mar 07/01/25
45			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mer 08/01/25	Mar 01/04/25
46			FIN	0 jour	Mar 01/04/25	Mar 01/04/25
