DEVELOPPEMENT ET MISE EN PLACE D'UNE SYSTÈME INTEGRE DE GESTION ACADEMIQUE A L'UdM

Université des Montagnes

W-TECH
BEYONG THE OBVIOUS

Contexte et justification du projet

- La plateforme Udmacademy 2.0 vise à offrir une plateforme sécurisée de traitement des informations académique basée sur les technologies du web2.0
- Cette plateforme est opérationnelle à l'UdM depuis 2019 et permet de traiter les données liées à l'inscription académique et au traitement des notes
- Son exploitation est limitée à 5 scolarités sur les 6 existantes
- Son développement n'intègre pas toutes les problématiques liées à la gestion académique à l'UdM
- Ce projet tient son intérêt de l'impérieuse nécessité de finaliser le développement de cette plateforme, assurer que son fonctionnement est conforme aux besoins et spécifications de l'UdM, mais aussi et surtout garantir un transfère de compétence à l'équipe en place pour l'accompagnement et éventuellement de la poursuite des développements futurs

Objectif: Dématérialisation de la gestion académique

D'un point de vue général il s'agira de doter l'UdM dans un délais de deux ans d'un ERP fonctionnel

Plus spécifiquement il s'agit de:

- Faire un transfert de compétence pour la prise en main complète de la solution UDMACADEMY
- Maturer les modules fonctionnels
- Compléter les modules non encore intégrés

Périmètre du projet

- Ce projet couvre l'ensemble des besoins liés à la gestion académique. Il s'agit de gérer le parcourt de l'étudiant depuis son admission jusqu'à sa sortie, en proposant des outils pour répondre aux besoins liés à l'inscription, suivi des paiements des frais de scolarité, planification des examens, planification des cours, et productions des états y afférents etc…

Délais: deux ans
du 26/01/2023 au 03/03/2025

Méthode de travail:

Nous proposons une méthode de travail basée sur les techniques agiles.
Nous procéderons à un découpage du projet en sous projet. La validation des fonctionnalité d'un sous projet enclenchera la planification du sous projet suivant.
De cette façon nous pourrons mesurer l'évolution réelle du projet et évaluer son adaptabilité aux besoins de l'UdM

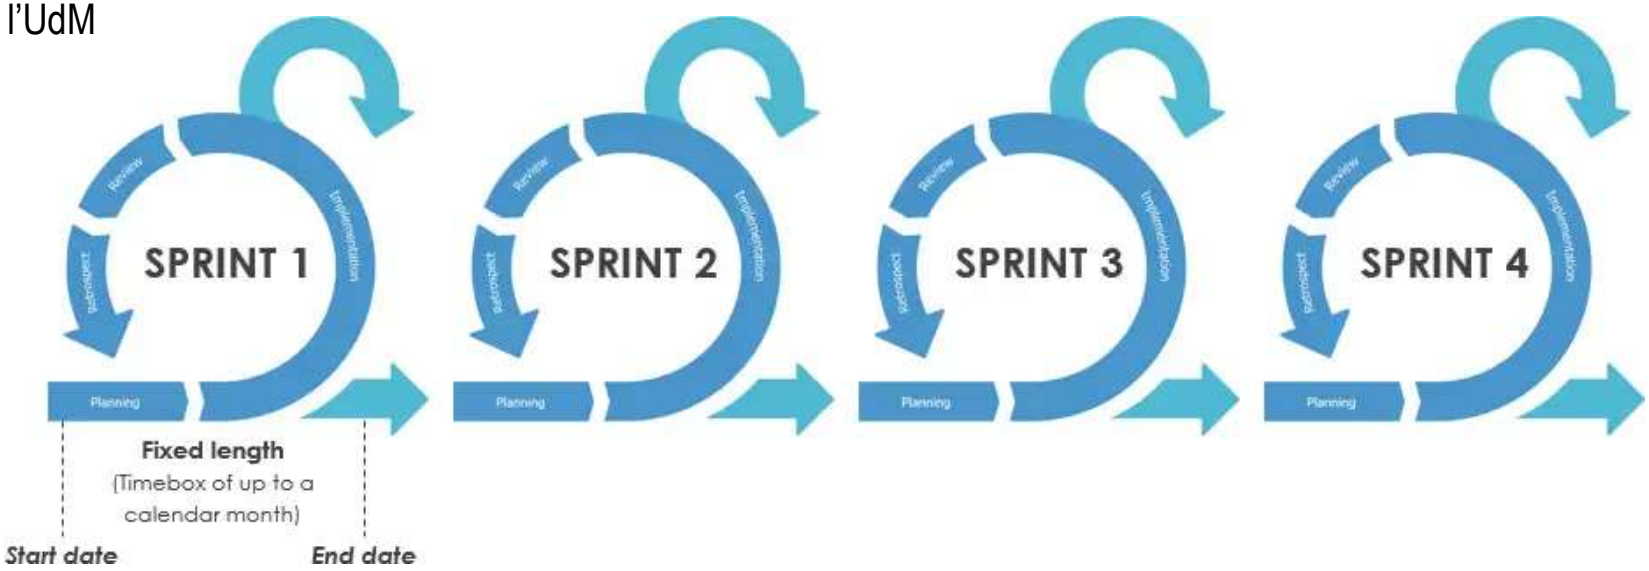

Etat des lieux des fonctionalitées actuelles de UdMAcademy :

-Configuration générale

-Gestion des grilles

-Gestion des évaluations

-Parcourt de l'étudiant

-Inscriptions en ligne

-Suivi des règlements des frais de scolarité

-Etats (PVs,relevés de note, certificat de scolarité, listes de présence….)

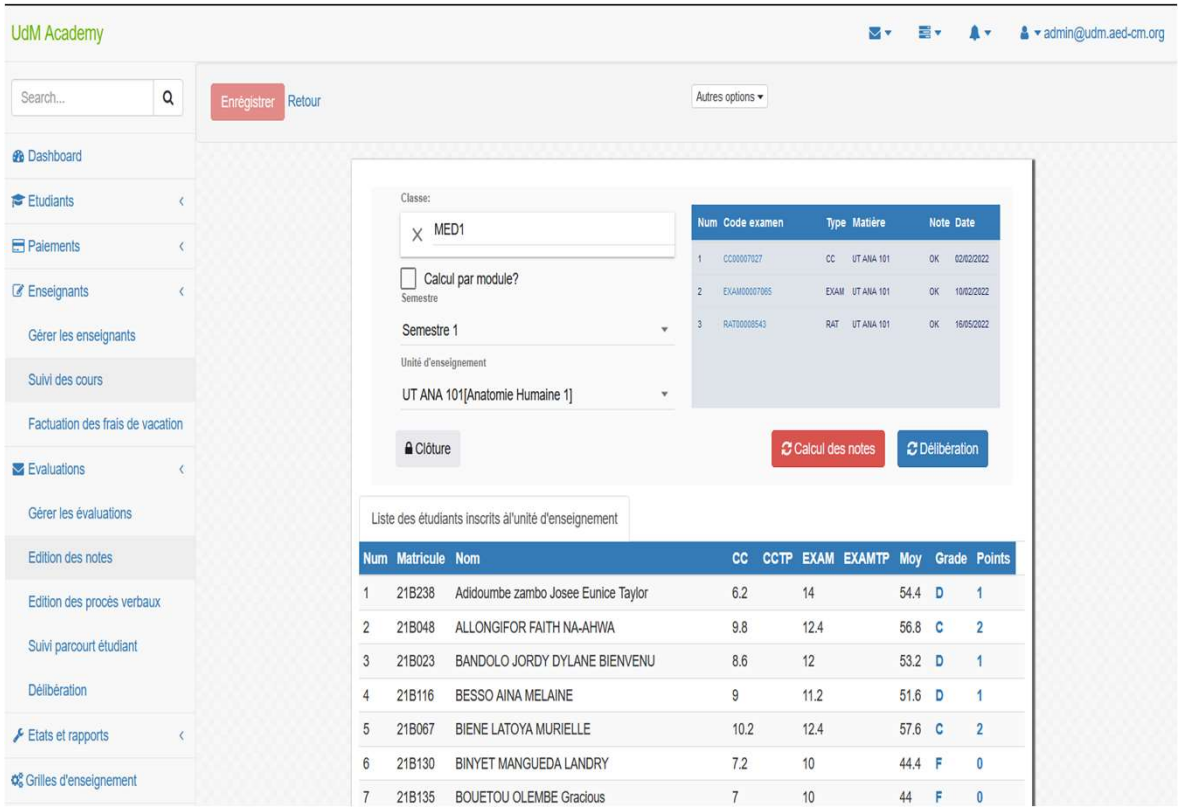

Notre approche de travail

- Compte tenu du fait que l'application a connu une avancée de développement plus ou moins importante, Il serait impératif que l'équipe technique pour s'imprégner procède à une analyse des fonctionnalités actuelles afin de suggérer un plan de maturation. Le plan de maturation permettra de proposer une démarche d'amélioration des fonctionnalités actuelles et de garantir qu'elles s'adaptent bien aux besoins de l'institution. Cette démarche débouchera sur une validation des livrables.
- Après la maturation des modules opérationnels, nous procèderons au développement des module non encore existants suivant la méthode agile. Avant le démarrage de chaque module un document de spécifications bien détaillés doit être soumis par le maître d'ouvrage. Ce document servira de boussole et permettra de garantir que les livrables conviennent aux attentes.
- Chaque itération sera validé par un cahier de recette dûment présenté par le me maître d'ouvrage

Organisation de l’application

L’application est organisée selon une architecture modulaire:

- **SchoolGlobalConfig** : il s’agit du module contenant l’ensemble des composants de configuration de l’application
- **User** : le module de gestion des utilisateurs, contient les composants permettant de gérer les utilisateurs, créer les groupes et les permissions
- **Registration** : il s’agit du module permettant de gérer les inscriptions académiques et les inscriptions pédagogiques. Elle permettra en outre (en cours de développement) de produire les différents actes académiques.
- **Payment** : ce module permet de gérer les recouvrements de frais de scolarité. Dans ce module nous avons développé un composant qui a été mis à la disposition de la banque UBA. Ce composant permet de synchroniser chaque paiement d’étudiant avec la la base de donnée. Cette synchronisation se fait en temps réel.
- **Exam** : ce module contient l’ensemble des composants permettant de gérer les évaluations, collecter les notes, traiter et calculer les notes, calculer les notes pondérées et produire les procès-verbaux
- **Application :** il s’agit du module qui ne contient que les entités du domaine

Technologies utilisées

- Front end: bootstrap, angularjs, jquery
- backend: PHP
- Framework: laminas
- Database: Mysql
- ORM: Doctrine 2

Planification

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/2**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/2	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/2	Mar 07/02/2
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/2	Mar 14/02/2
6			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
7			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/2
8			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
9			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/2
10			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/2	Ven 31/03/2
11			**Execution**	**502 jours**	**Ven 31/03/2**	**Lun 03/03/2**
12			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUI**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
13			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
14			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
15			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
16			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
17			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/2	Ven 28/04/2
18			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/2	Mer 03/05/2
19			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
20			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
21			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
22			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itération**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
23			Iteration 1: Cofiguration global du système	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
24			Iteration 2 : Gérer les admissioins	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
25			Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiante>	60 jours	Ven 05/05/2	Jeu 27/07/23
26			validation iteration 1, 2, 3	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
27			Itération 4: Gérer les frais de scolarité	60 jours	Ven 28/07/2	Jeu 19/10/23
28			Itération 5: Gérer les enseignements	45 jours	Ven 28/07/2	Jeu 28/09/23
29			Itération 6: Gérer les évaluations	45 jours	Ven 28/07/2	Jeu 28/09/23
30			Validation iteration 4,5,6	0 jour	Ven 24/11/2	Ven 24/11/2
31			Iteration 7: gérer les enseignants	60 jours	Ven 24/11/2	Jeu 15/02/24
32			validation iteration 7	0 jour	Jeu 15/02/24	Jeu 15/02/24
33			Iteration 8: planification des enseignements	60 jours	Ven 16/02/2	Jeu 09/05/24
34			Validation iteration 8	0 jour	Jeu 09/05/24	Jeu 09/05/24
35			Iteration 9: Gérer l'espace Etudiant	60 jours	Ven 10/05/2	Jeu 01/08/24
36			validation iteration 9	0 jour	Jeu 01/08/24	Jeu 01/08/24
37			Itération 10: Gérer l'espace enseignant	60 jours	Ven 02/08/2	Jeu 24/10/24
38			Validation itération 10	0 jour	Jeu 24/10/24	Jeu 24/10/24
39			FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE	22 jours	Ven 25/10/2	Lun 25/11/24
40			MISE NE PRODUCTION	10 jours	Mar 26/11/2	Lun 09/12/24
41			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mar 10/12/2	Lun 03/03/25
42			FIN	0 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25

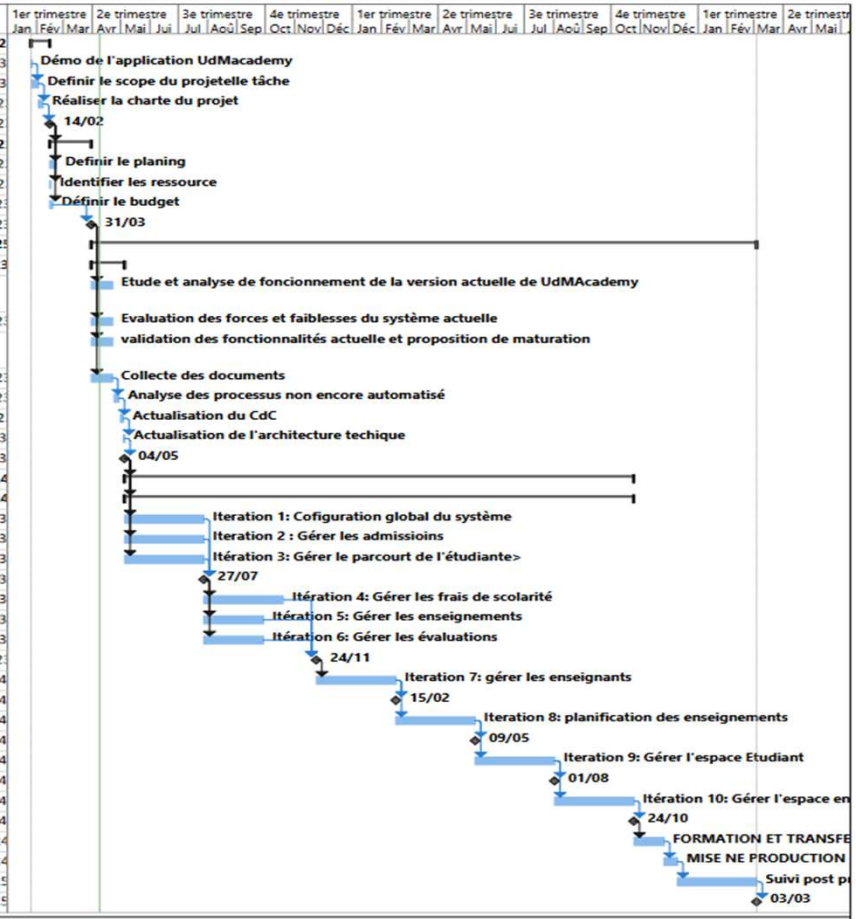

Notre équipe

- Chef de Projet: Wangun Parfait Wangun Ing Informaticien
- Senior Developper: MESSANGA Landry Ing Informaticien
- Junio Develooper: FANSEU Stevy Developperu

Résultats attendus

- Gain de temps dans le processus de gestion académique
- Limitation des érreurs
- Base de données centralisées
- Interaction avec toutes les parties prenantes de la gestions académique
- Fiabilité des informations
- Sécurisation de la plateforme

Merci
