N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**Initiation**	**14 jours**	**Jeu 26/01/23**	**Mar 14/02/2**
2			Démo de l'application UdMacademy	1 jour	Jeu 26/01/23	Jeu 26/01/23
3			Definir le scope du projetelle tâche	5 jours	Ven 27/01/2	Jeu 02/02/23
4			Réaliser la charte du projet	3 jours	Ven 03/02/2	Mar 07/02/2
5			Approbation du projet	0 jour	Mar 14/02/2	Mar 14/02/2
6						
7			**Panification**	**32 jours**	**Mer 15/02/2**	**Ven 31/03/2**
8			Definir le planing	5 jours	Mer 15/02/2	Mar 21/02/2
9			Identifier les ressource	1 jour	Mer 15/02/2	Mer 15/02/2
10			Définir le budget	3 jours	Mer 15/02/2	Ven 17/02/2
11			lancement du projet	0 jour	Ven 31/03/2	Ven 31/03/2
12			**Execution**	**502 jours**	**Ven 31/03/2**	**Lun 03/03/2**
13			**ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION ACADEMIQUE ACTUE**	**25 jours**	**Ven 31/03/2**	**Jeu 04/05/23**
14			Etude et analyse de foncionnement de la version actuelle de UdMAcademy	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
15			Evaluation des forces et faiblesses du système actuelle	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
16			validation des fonctionnalités actuelle et proposition de maturation	16 jours	Ven 31/03/23	Ven 21/04/23
17			Collecte des documents	16 jours	Ven 31/03/2	Ven 21/04/2
18			Analyse des processus non encore automatisé	5 jours	Lun 24/04/2	Ven 28/04/2
19			Actualisation du CdC	3 jours	Lun 01/05/2	Mer 03/05/2
20			Actualisation de l'architecture techique	1 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23

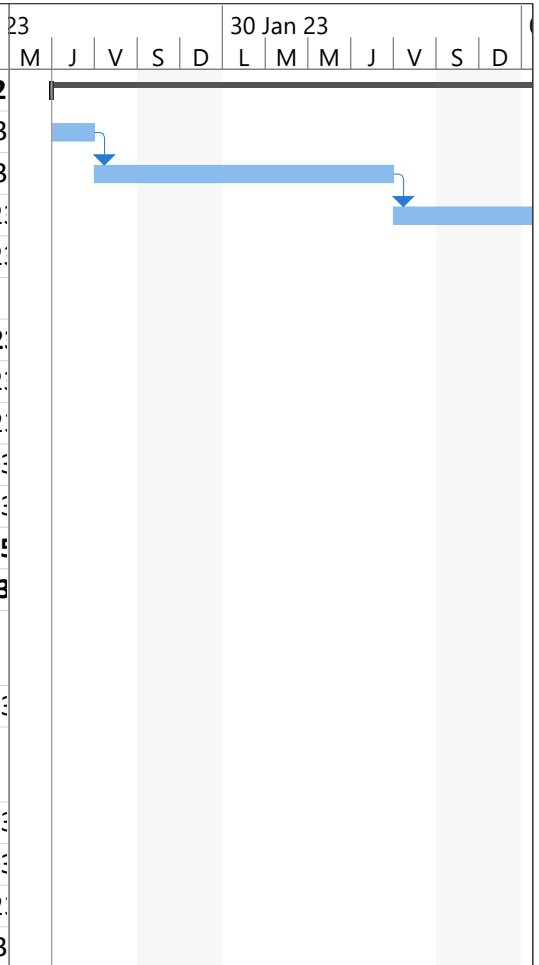

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
21			Approbation du Cdc et demarrrage de la phase d'execution	0 jour	Jeu 04/05/23	Jeu 04/05/23
22			**DEVELOPPMENT ET MISE EN PRODUCTION**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
23			**Découpage modulaire et fonctionnel (Identifier les itératior**	**385 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 24/10/24**
24			**Iteration 1: Cofiguration global du système**	**60 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 27/07/23**
25			Analyse et conception	10 jours	Ven 05/05/2	Jeu 18/05/23
26			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 19/05/2	Jeu 29/06/23
27			Test	20 jours	Ven 30/06/2	Jeu 27/07/23
28			validation des livrables	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
29			**Iteration 2 : Gérer les admissioins**	**60 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 27/07/23**
30			Analyse et conception	10 jours	Ven 05/05/2	Jeu 18/05/23
31			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 19/05/2	Jeu 29/06/23
32			Test	20 jours	Ven 30/06/2	Jeu 27/07/23
33			validation des livrables	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
34			**Itération 3: Gérer le parcourt de l'étudiante>**	**60 jours**	**Ven 05/05/2**	**Jeu 27/07/23**
35			Analyse et conception	10 jours	Ven 05/05/2	Jeu 18/05/23
36			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 19/05/2	Jeu 29/06/23
37			Test	20 jours	Ven 30/06/2	Jeu 27/07/23
38			validation des livrables	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
39			validation iteration 1, 2, 3	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
40			**Itération 4: Gérer les frais de scolarité**	**45 jours**	**Ven 28/07/2**	**Jeu 28/09/23**
41			Analyse et conception	5 jours	Ven 28/07/2	Jeu 03/08/23
42			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 04/08/2	Jeu 14/09/23

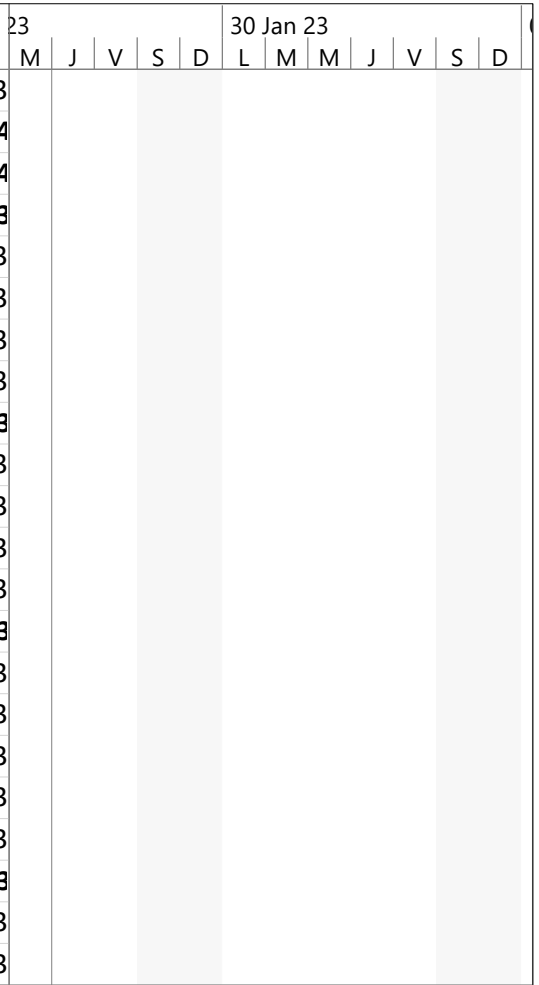

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
43			Test	10 jours	Ven 15/09/23	Jeu 28/09/23
44			validation des livrables	0 jour	Jeu 28/09/23	Jeu 28/09/23
45			**Itération 5: Gérer les enseignements**	**40 jours**	**Ven 29/09/2**	**Jeu 23/11/23**
46			Analyse et conception	5 jours	Ven 29/09/23	Jeu 05/10/23
47			Programmation fonctionnelle	25 jours	Ven 06/10/23	Jeu 09/11/23
48			Test	10 jours	Ven 10/11/23	Jeu 23/11/23
49			validation des livrables	0 jour	Jeu 23/11/23	Jeu 23/11/23
50			**Itération 6: Gérer les évaluations**	**85 jours**	**Ven 28/07/2**	**Ven 24/11/2**
51			Analyse et conception	10 jours	Ven 28/07/23	Jeu 10/08/23
52			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 11/08/23	Jeu 21/09/23
53			Test	20 jours	Ven 22/09/23	Jeu 19/10/23
54			validation des livrables	0 jour	Jeu 19/10/23	Jeu 19/10/23
55			Validation iteration 4,5,6	0 jour	Ven 24/11/23	Ven 24/11/23
56			**Itération 7: gérere les enseignants**	**60 jours**	**Ven 24/11/2**	**Jeu 15/02/24**
57			Analyse et conception	10 jours	Ven 24/11/23	Jeu 07/12/23
58			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 08/12/23	Jeu 18/01/24
59			Test	20 jours	Ven 19/01/24	Jeu 15/02/24
60			validation des livrables	0 jour	Jeu 15/02/24	Jeu 15/02/24
61			**Itération 8: gérer la plannification des enseignemesnts**	**60 jours**	**Ven 16/02/2**	**Jeu 09/05/24**
62			Analyse et conception	10 jours	Ven 16/02/24	Jeu 29/02/24
63			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 01/03/24	Jeu 11/04/24
64			Test	20 jours	Ven 12/04/24	Jeu 09/05/24

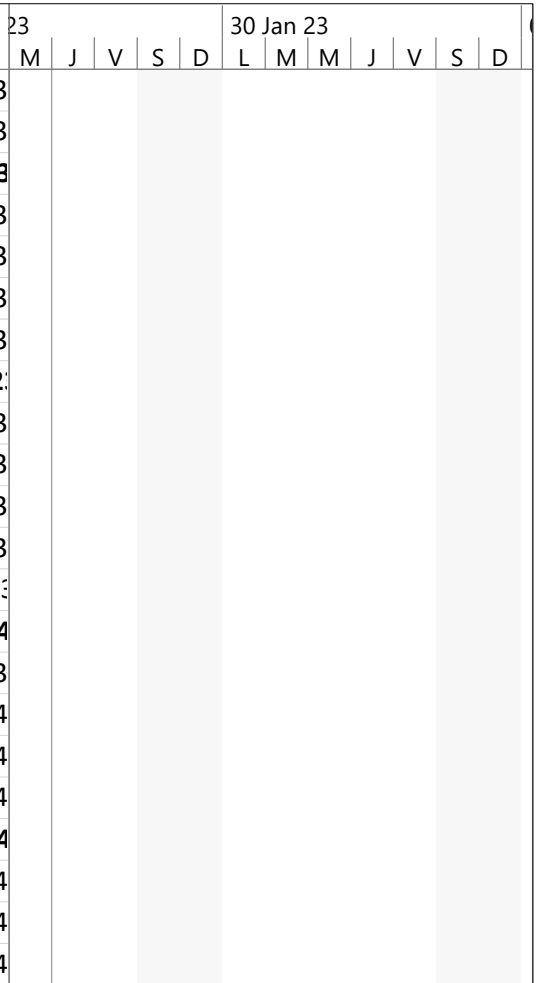

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
65			validation des livrables	0 jour	Jeu 09/05/24	Jeu 09/05/24
66			**Itération 9: Gérer l'espace étudiants**	**60 jours**	**Ven 10/05/2**	**Jeu 01/08/24**
67			Analyse et conception	10 jours	Ven 10/05/24	Jeu 23/05/24
68			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 24/05/24	Jeu 04/07/24
69			Test	20 jours	Ven 05/07/24	Jeu 01/08/24
70			validation des livrables	0 jour	Jeu 01/08/24	Jeu 01/08/24
71			**Itération 10: Gérer l'espace enseignant**	**60 jours**	**Ven 02/08/2**	**Jeu 24/10/24**
72			Analyse et conception	10 jours	Ven 02/08/24	Jeu 15/08/24
73			Programmation fonctionnelle	30 jours	Ven 16/08/24	Jeu 26/09/24
74			Test	20 jours	Ven 27/09/24	Jeu 24/10/24
75			validation des livrables	0 jour	Jeu 24/10/24	Jeu 24/10/24
76			**FORMATION ET TRANSFERT DE COMPETENCE**	**22 jours**	**Ven 25/10/2**	**Lun 25/11/24**
77			Identiccation de la cible à former	1 jour	Ven 25/10/24	Ven 25/10/24
78			definir les objectifs	1 jour	Lun 28/10/24	Lun 28/10/24
79			préparer le materiel pédagogique ainsi que les supports	5 jours	Mar 29/10/2	Lun 04/11/24
80			Formation admainistrateur et équipe technique	5 jours	Mar 05/11/2	Lun 11/11/24
81			formation des métiers	10 jours	Mar 12/11/2	Lun 25/11/24
82			validation de la recette de formation	0 jour	Lun 25/11/24	Lun 25/11/24
83			**MISE NE PRODUCTION**	**10 jours**	**Mar 26/11/2**	**Lun 09/12/24**
84			Installation de l'environnement d'exploitation	1 jour	Mar 26/11/2	Mar 26/11/2
85			Configuration de l'application avec les données de l'entrepri	1 jour	Mer 27/11/2	Mer 27/11/2
86			Chargement des données et referentiels	5 jours	Jeu 28/11/24	Mer 04/12/2

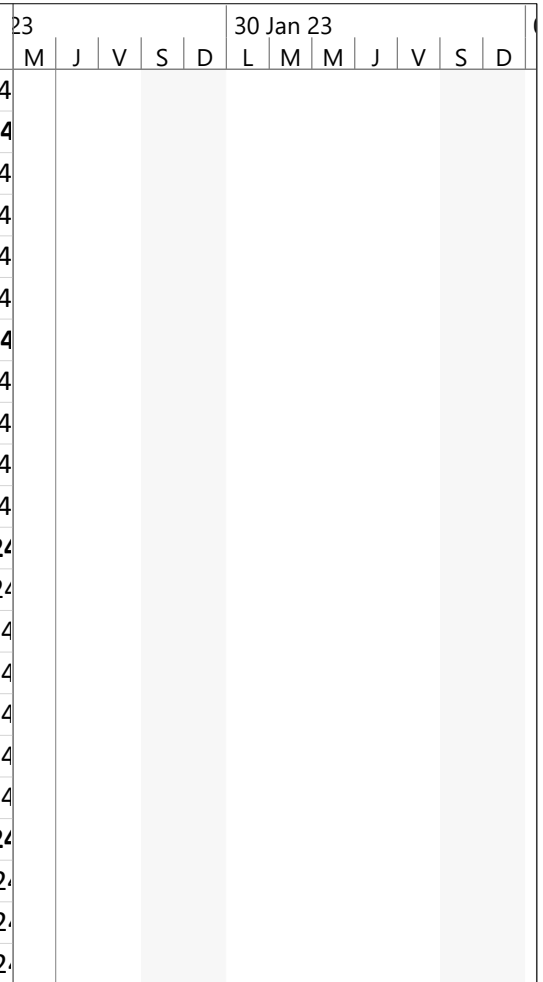

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche
Fractionnement
Jalon
Récapitulative
Récapitulatif du projet
Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif
Tâche manuelle
Durée uniquement
Report récapitulatif manuel
Récapitulatif manuel
Début uniquement
Fin uniquement
Tâches externes
Jalons externes
Échéance
Avancement
Progression manuelle

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
87			Configuration et sécurisation de l'accès à distance	3 jours	Jeu 05/12/24	Lun 09/12/24
88			Validation mise en exploitation	0 jour	Lun 09/12/24	Lun 09/12/24
89			Suivi post production et correction des bugs	60 jours	Mar 10/12/2	Lun 03/03/25

23 30 Jan 23
M J V S D L M M J V S D

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

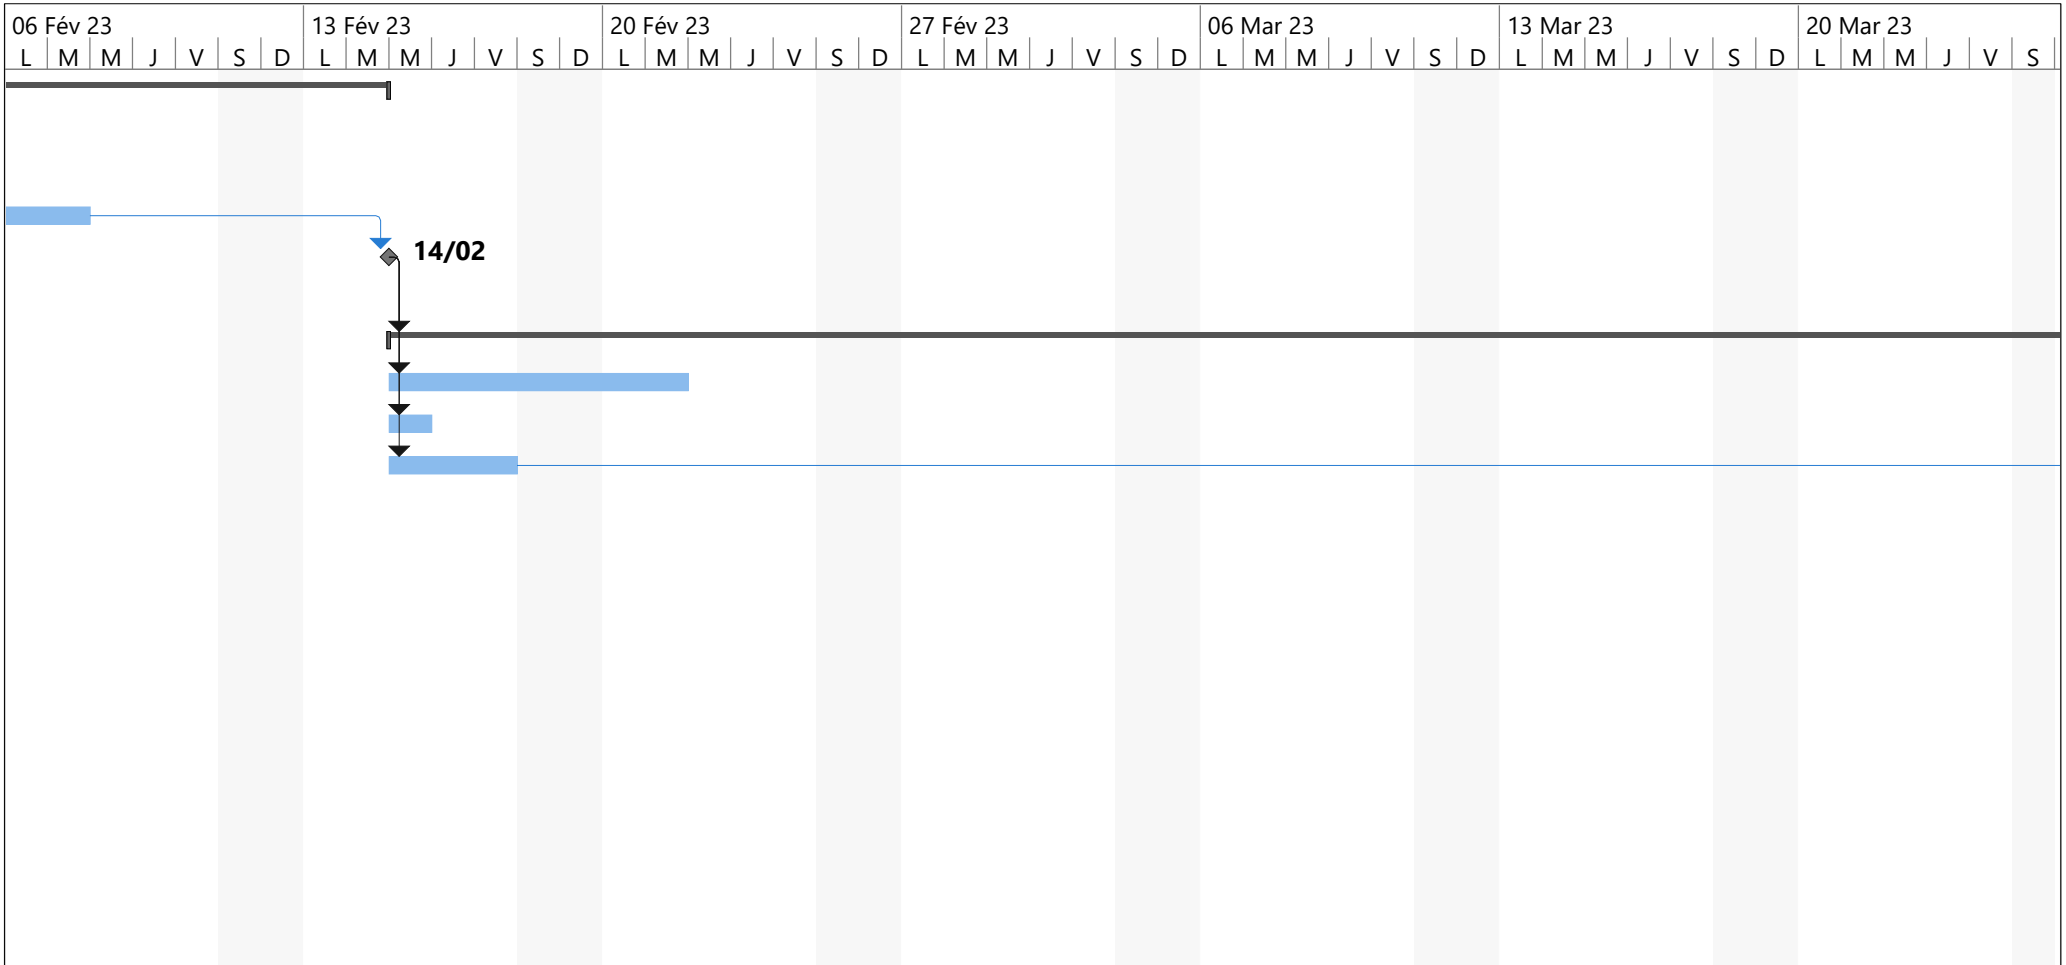

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

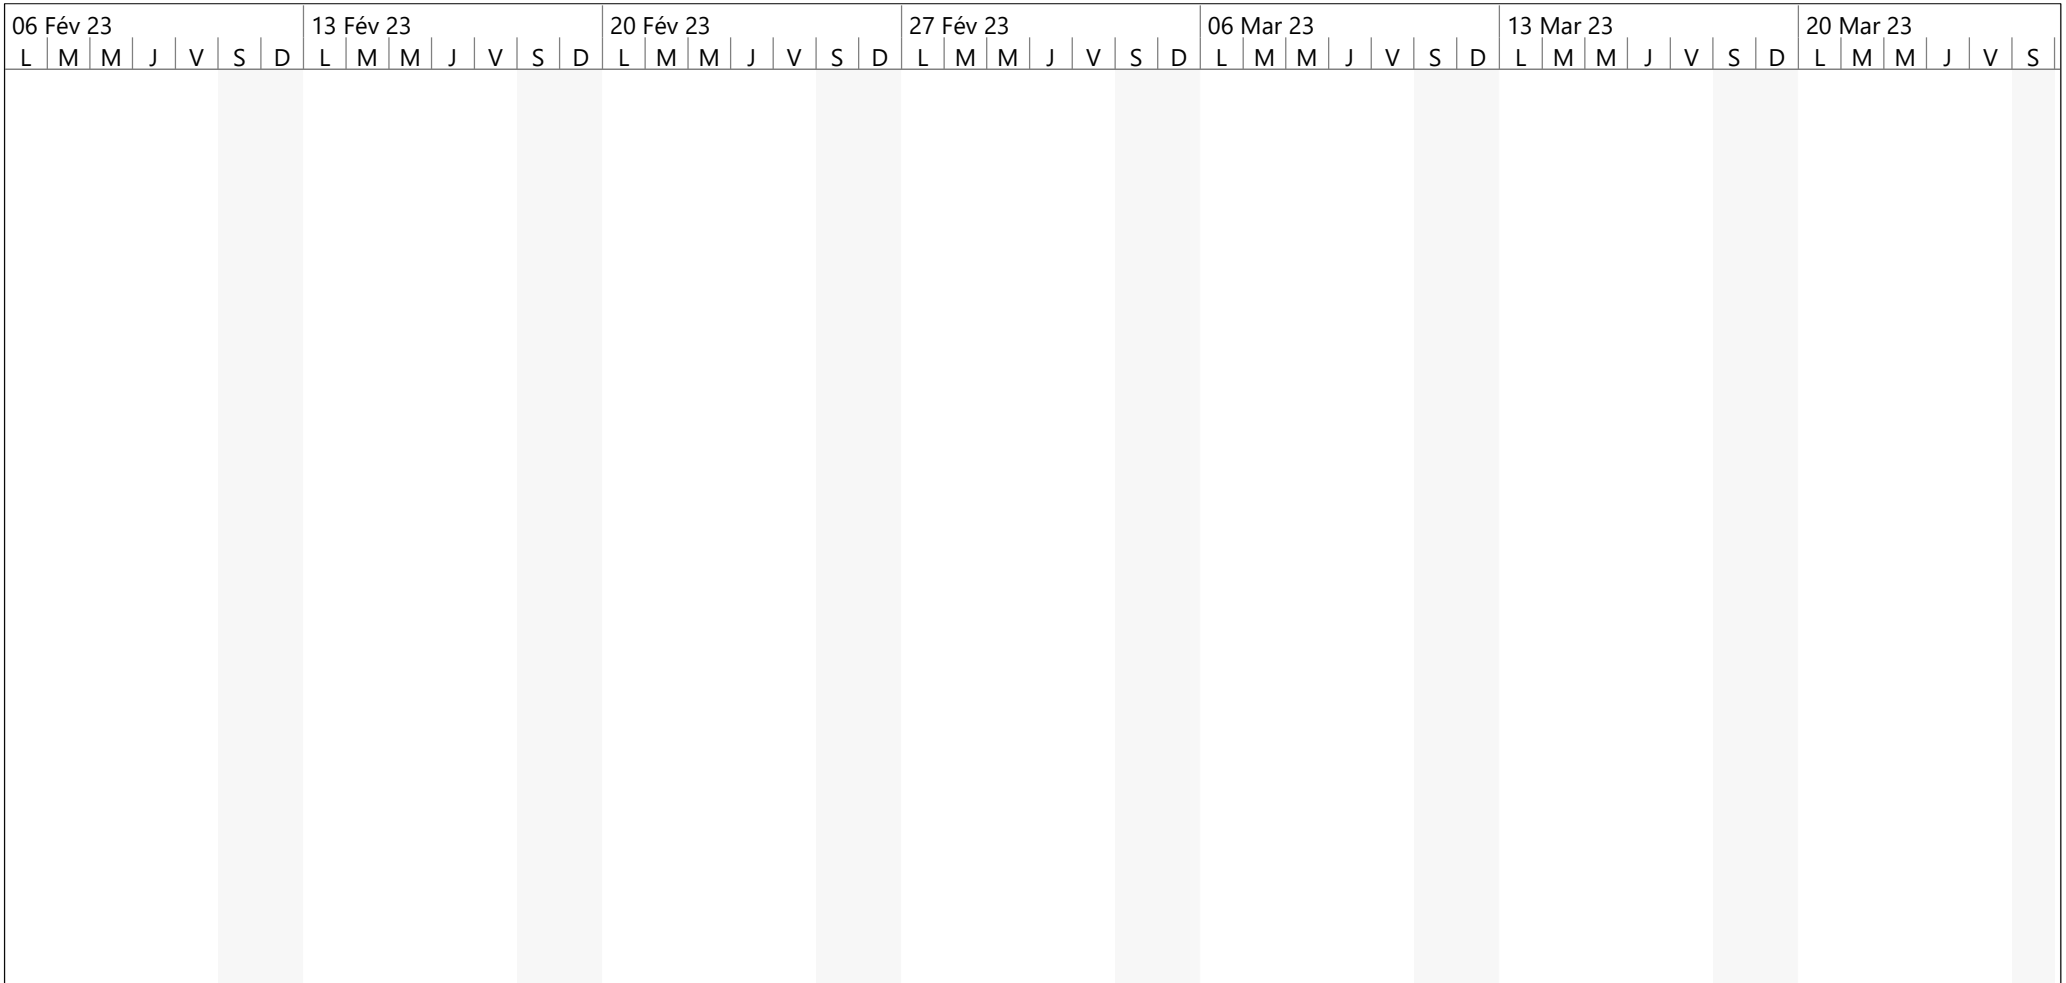

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

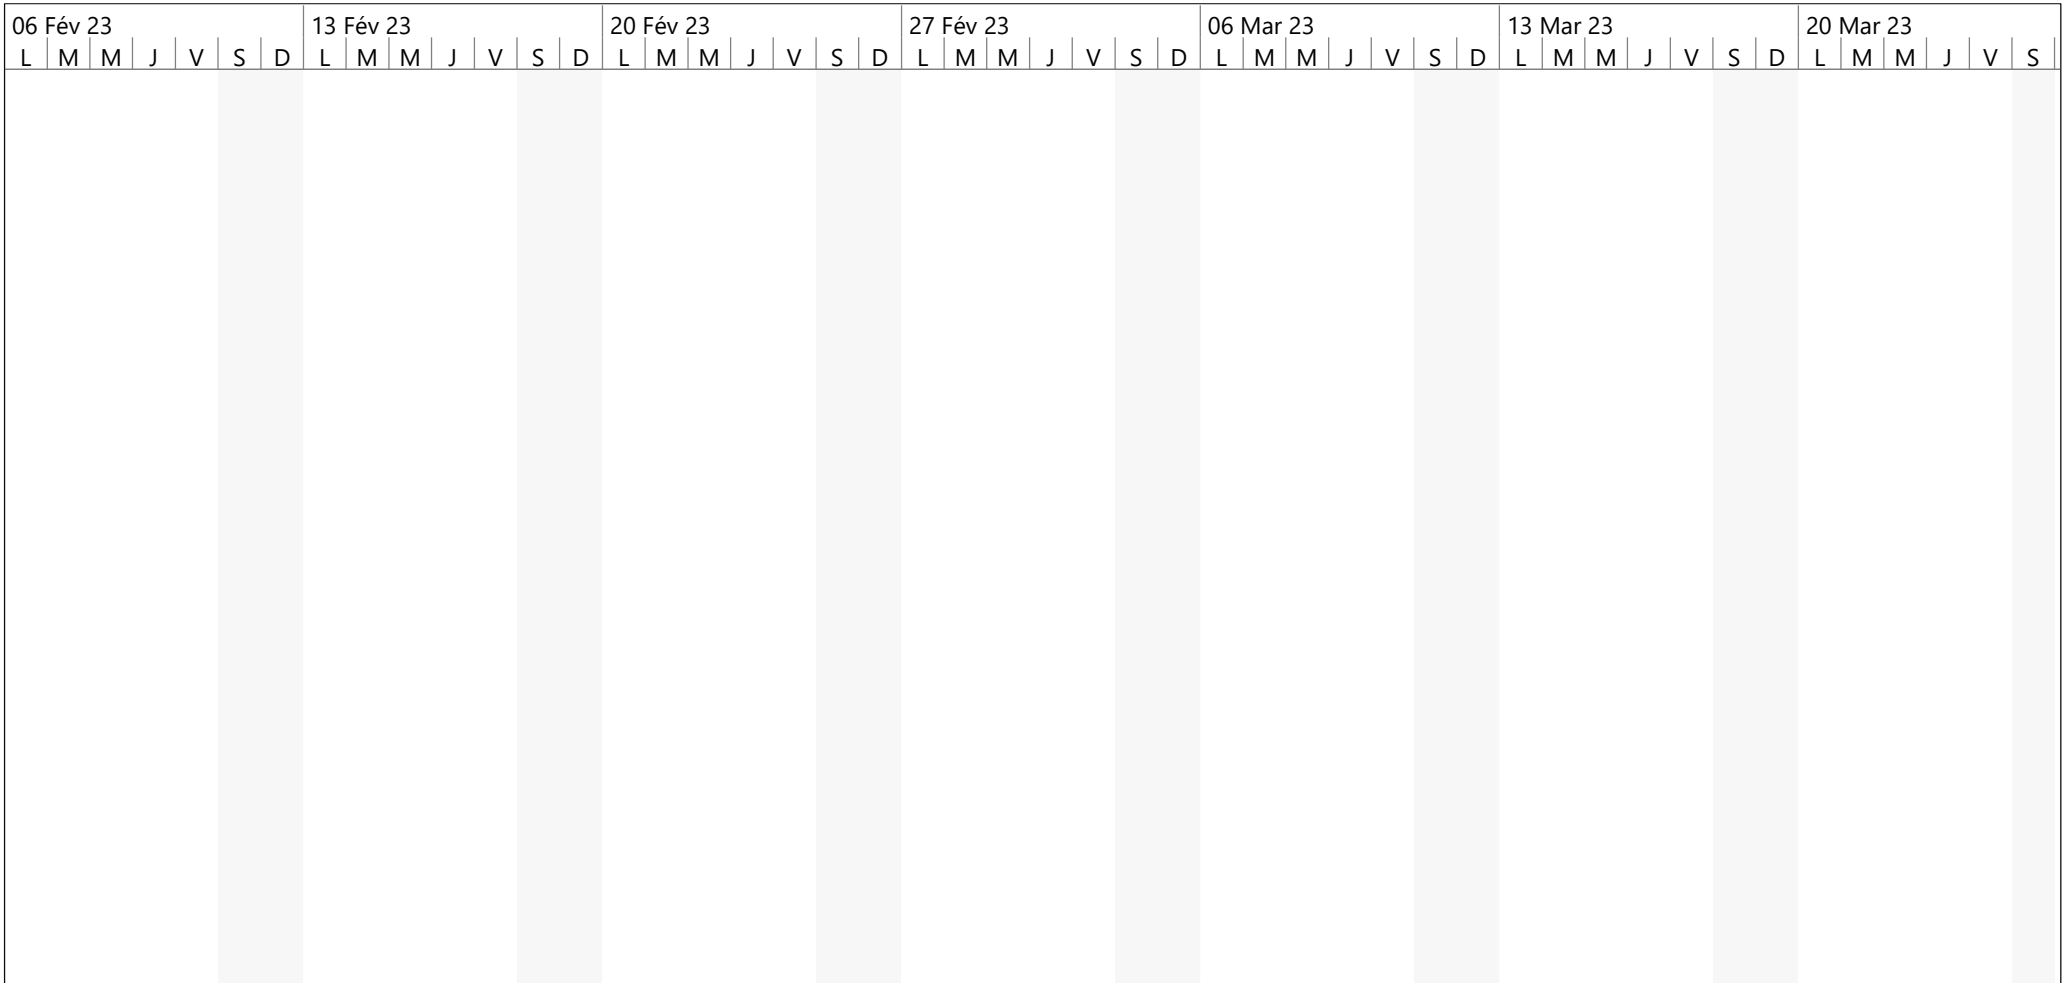

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

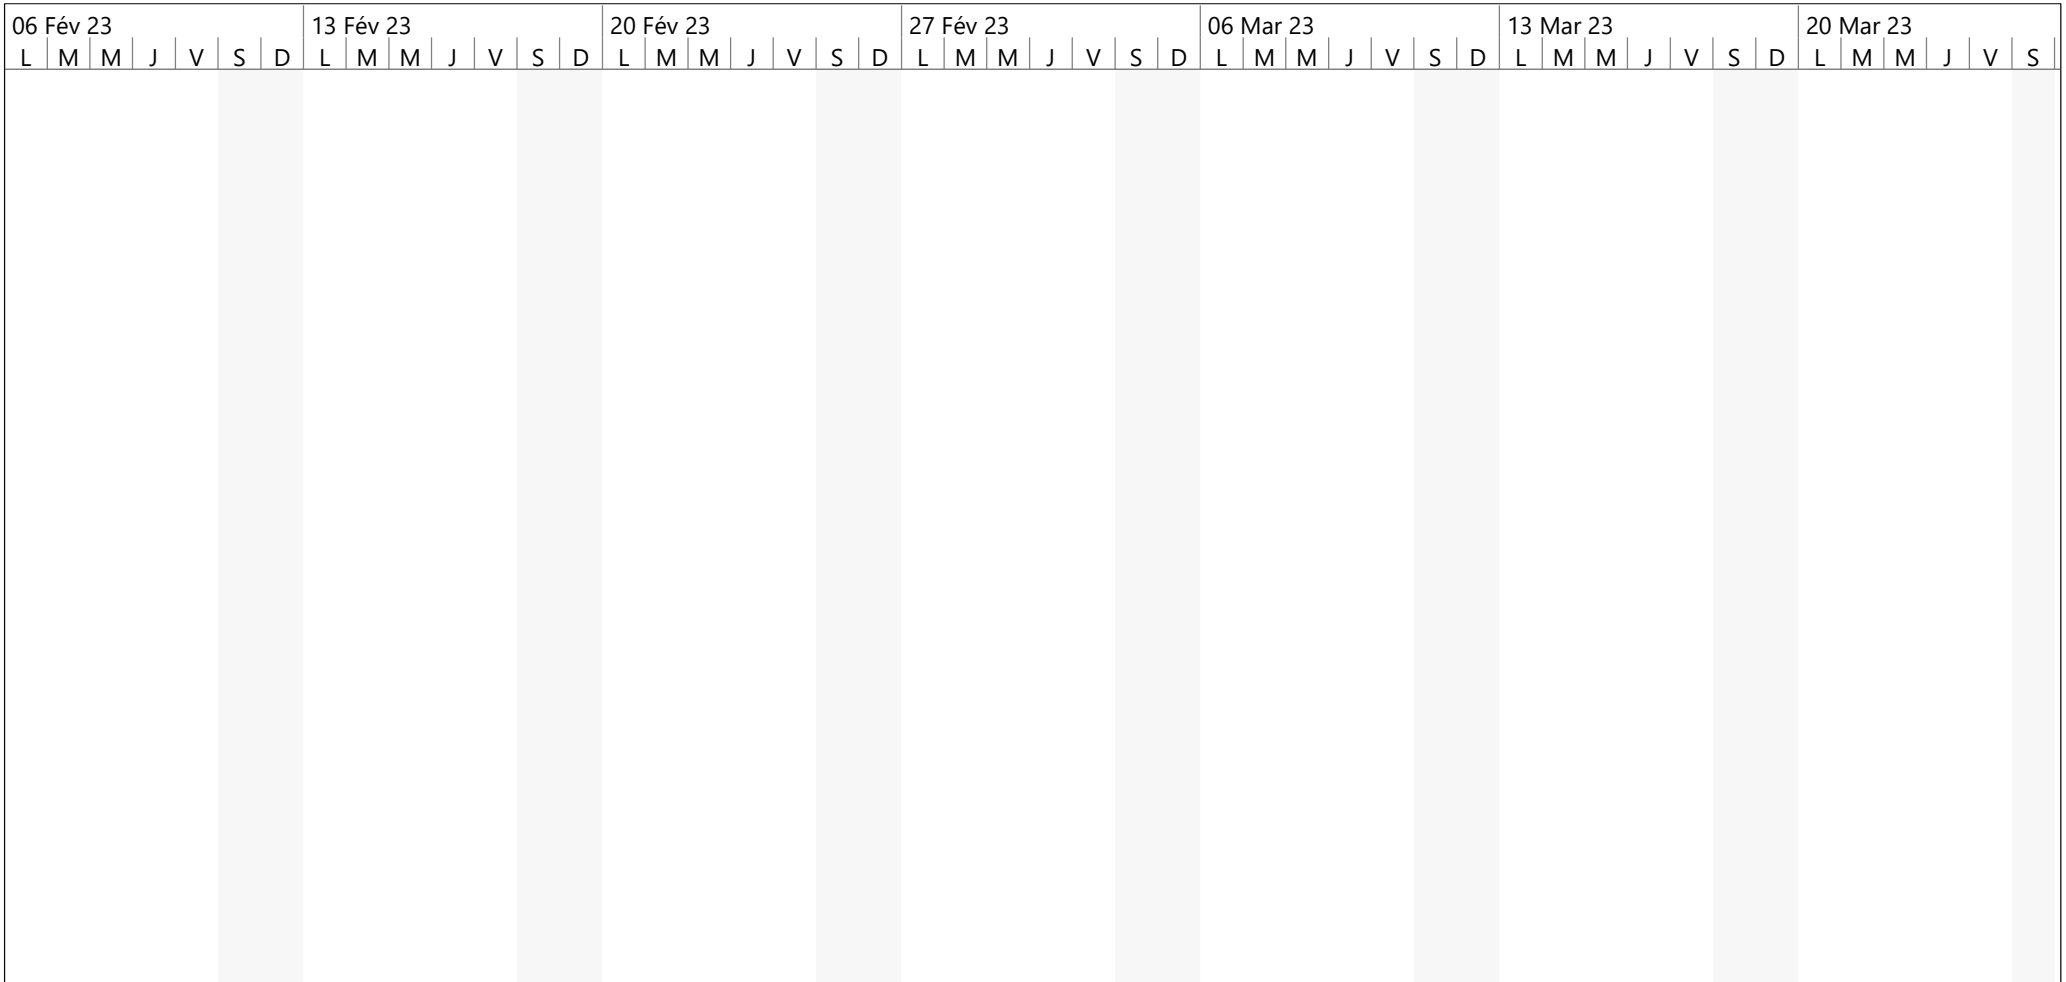

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

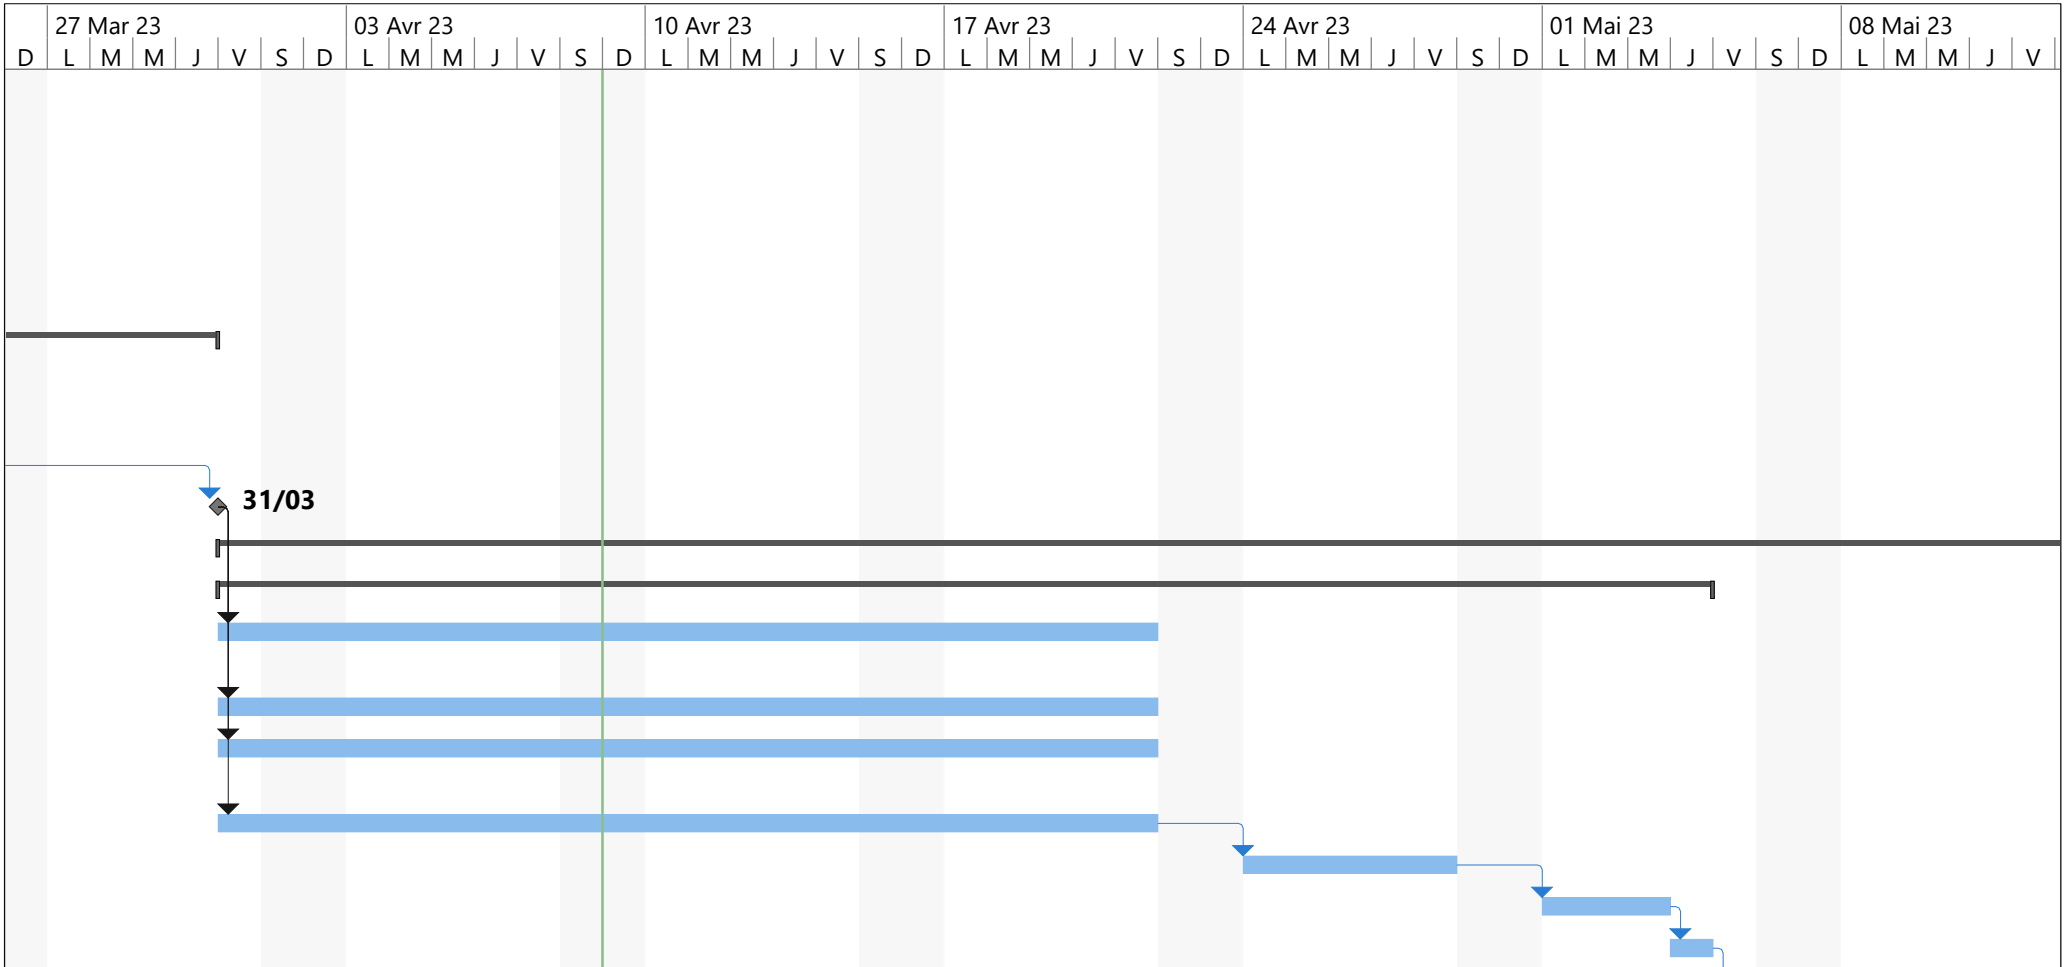

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

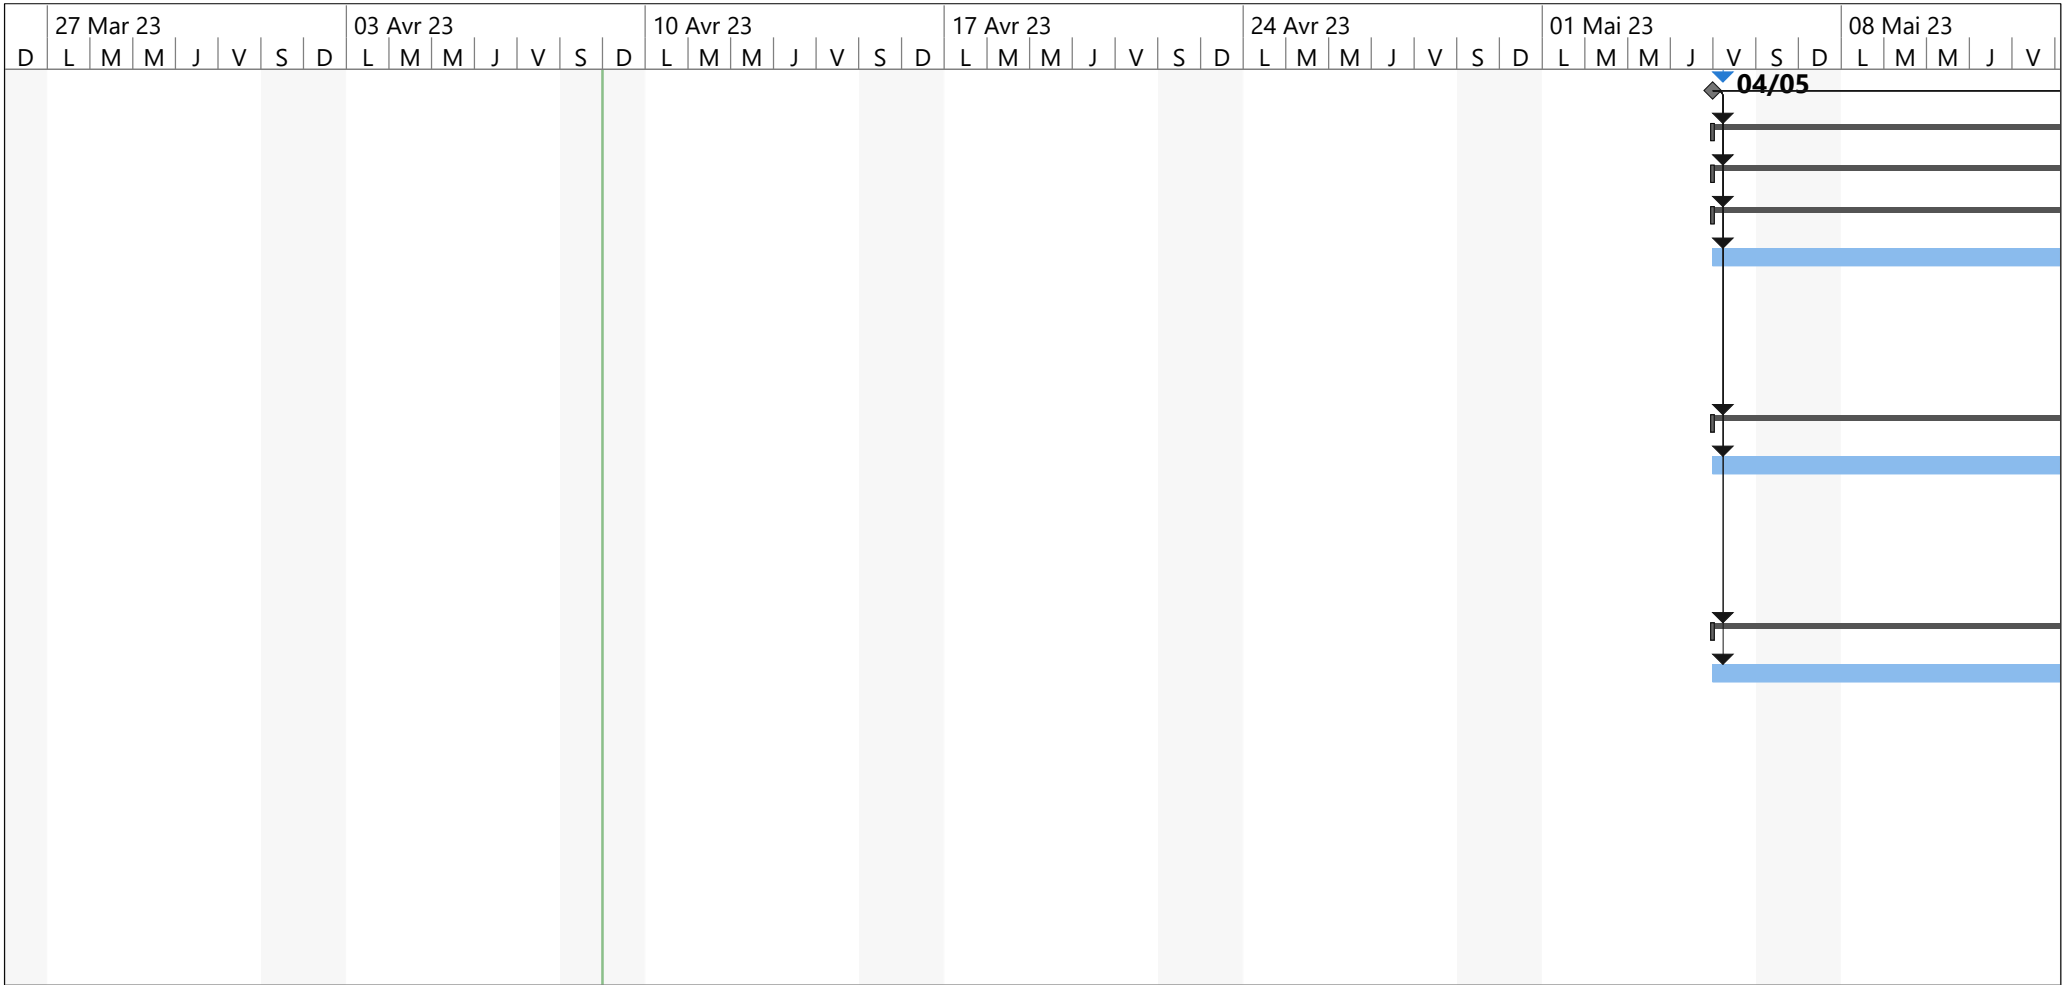

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

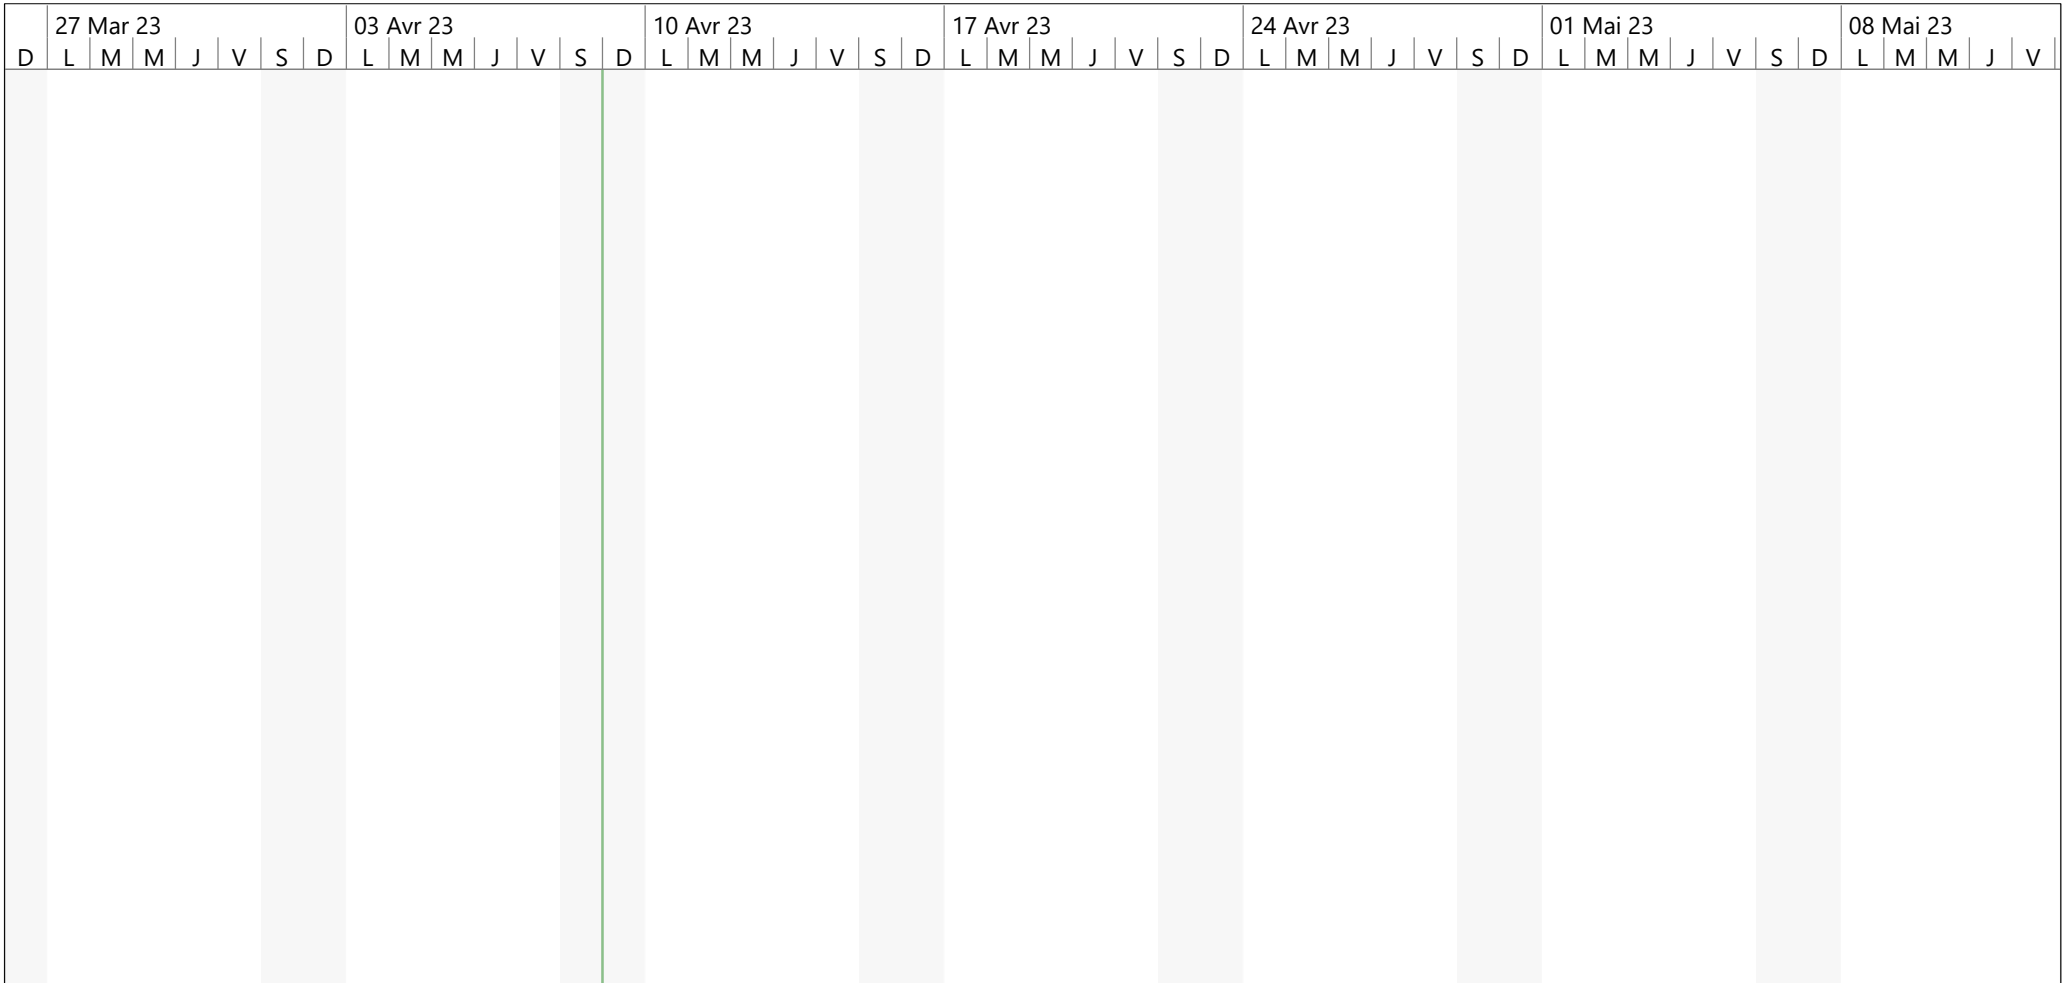

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

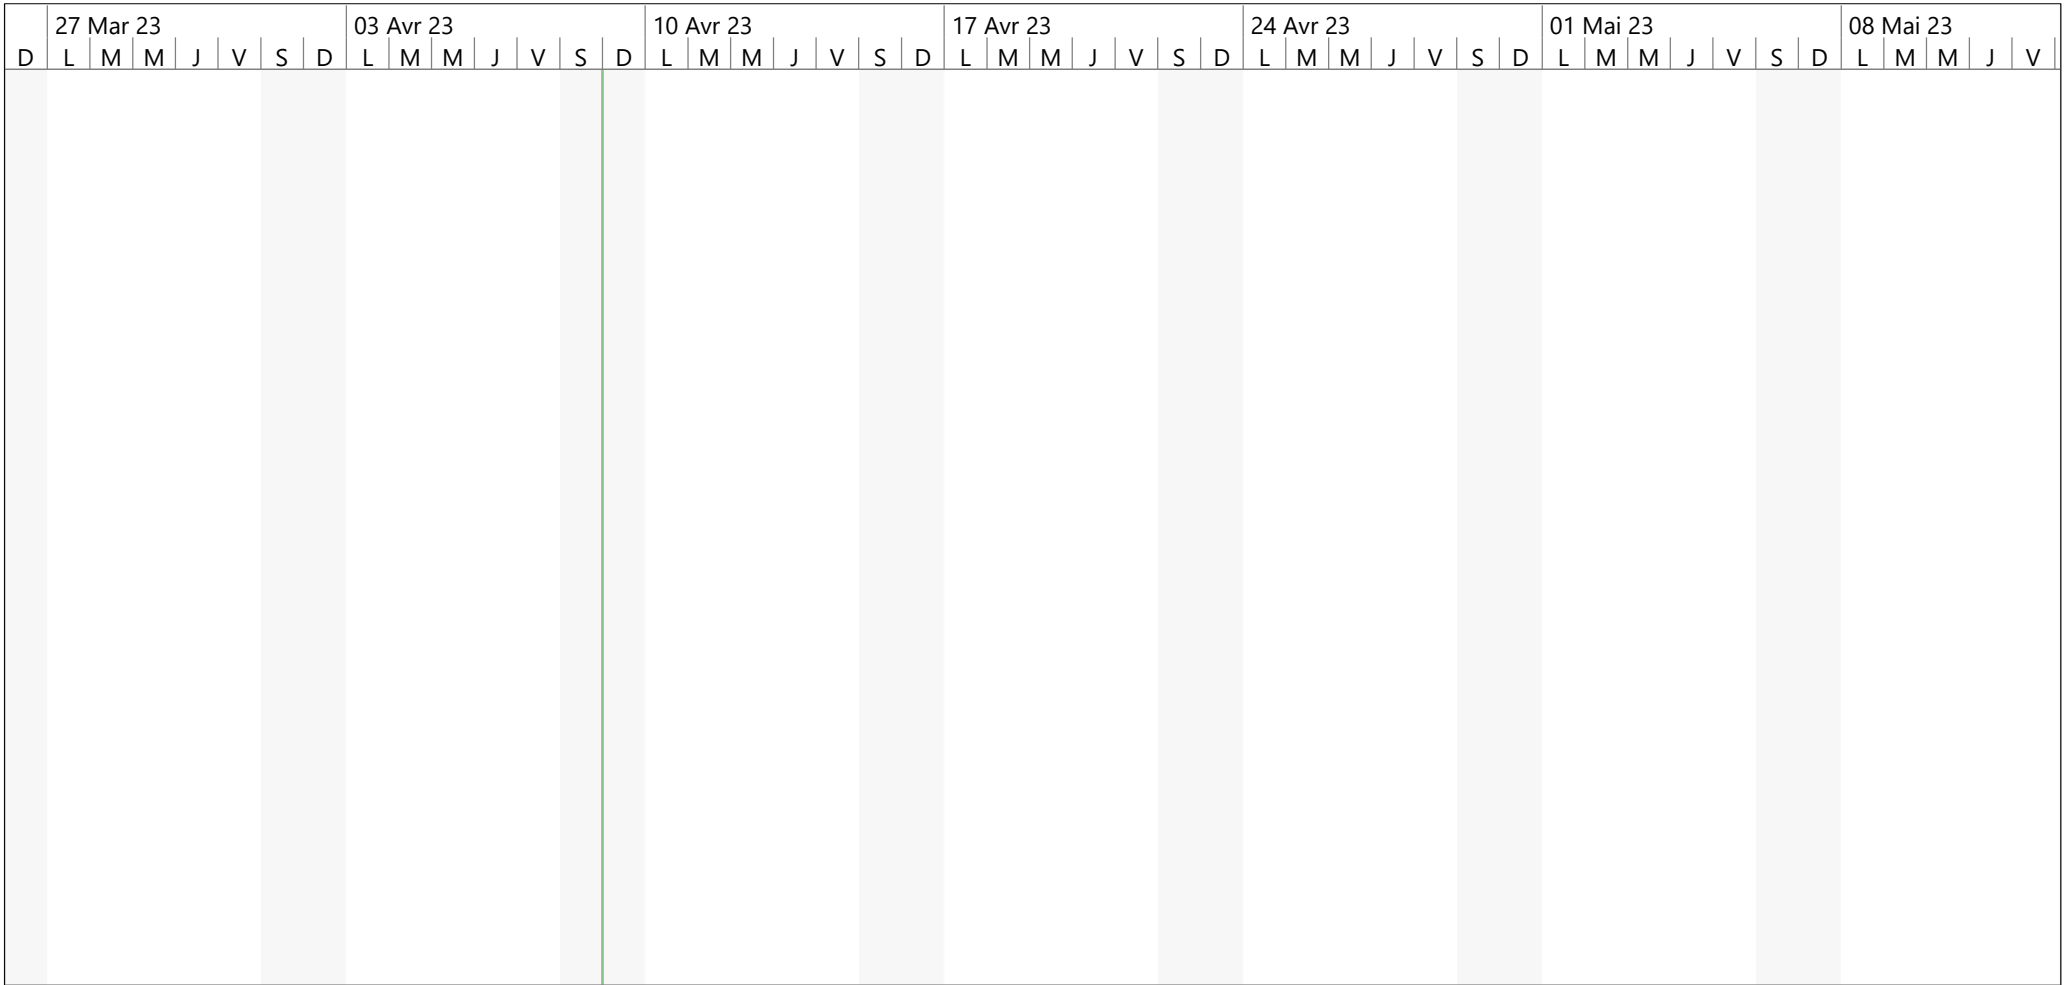

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

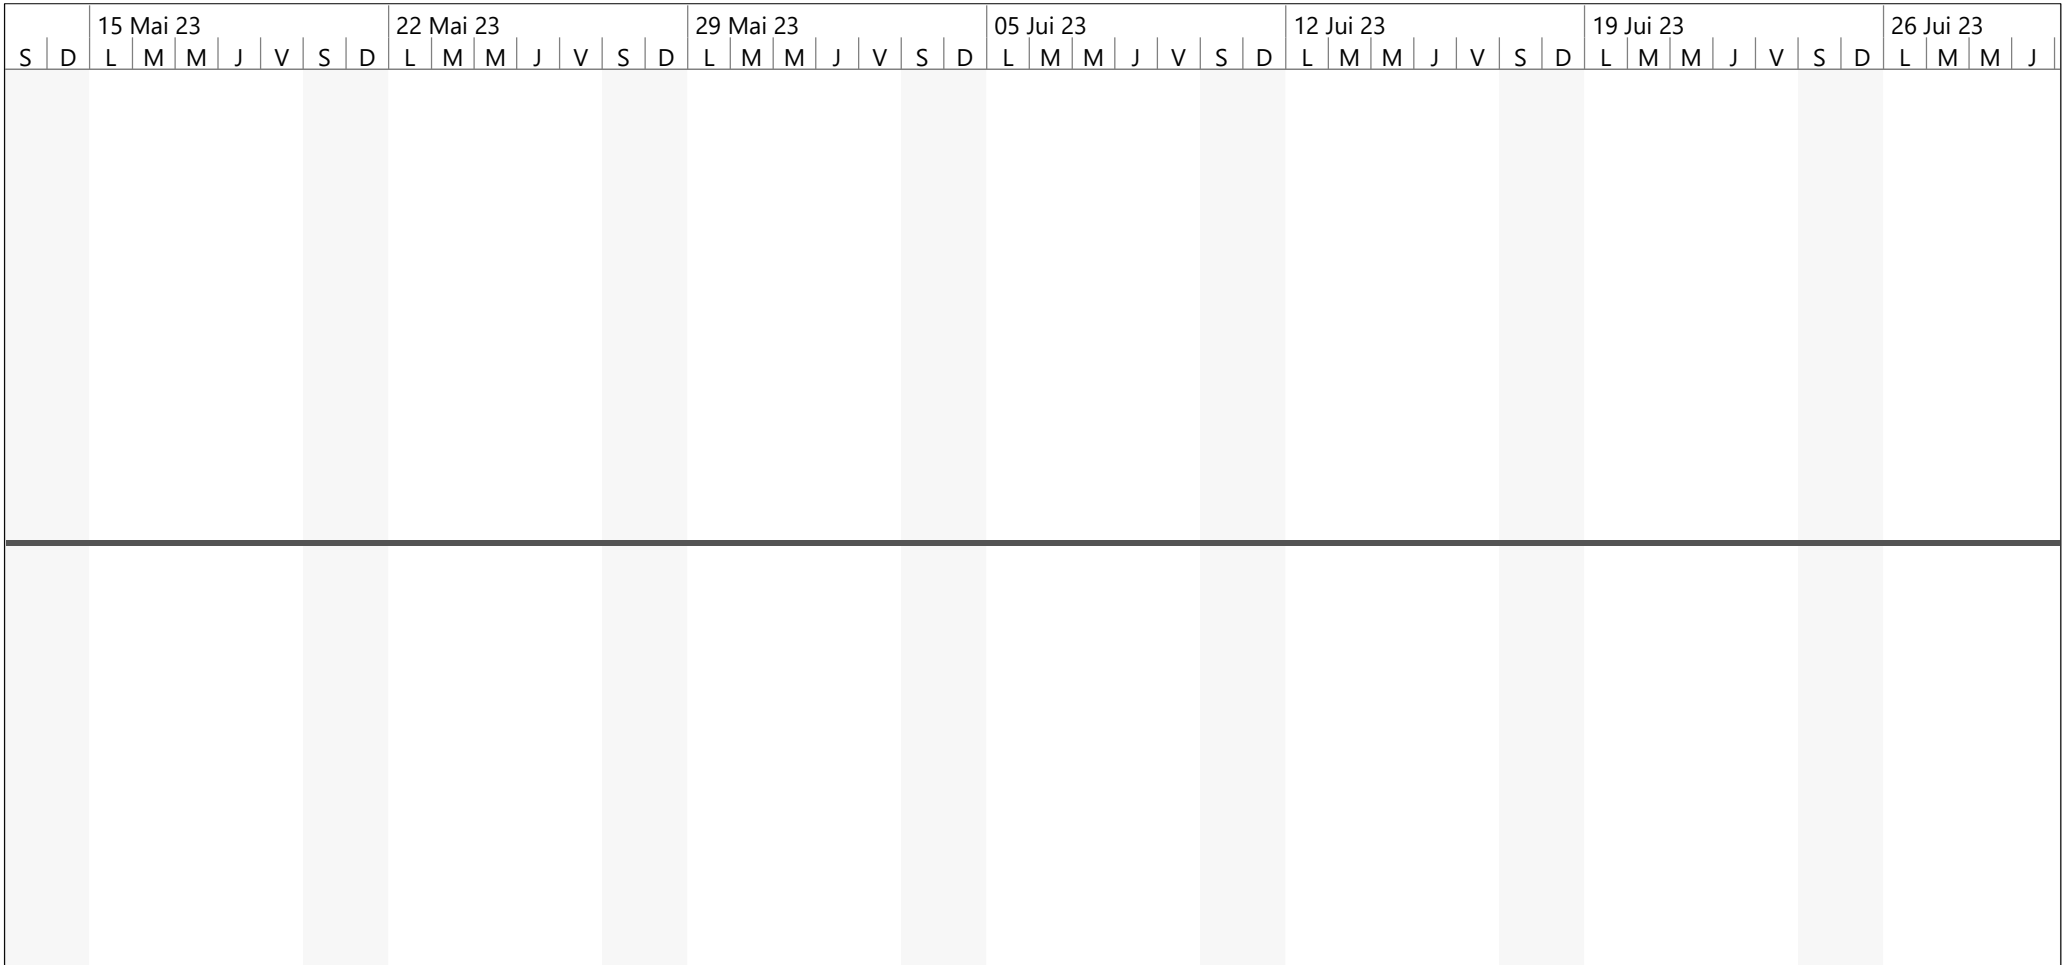

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

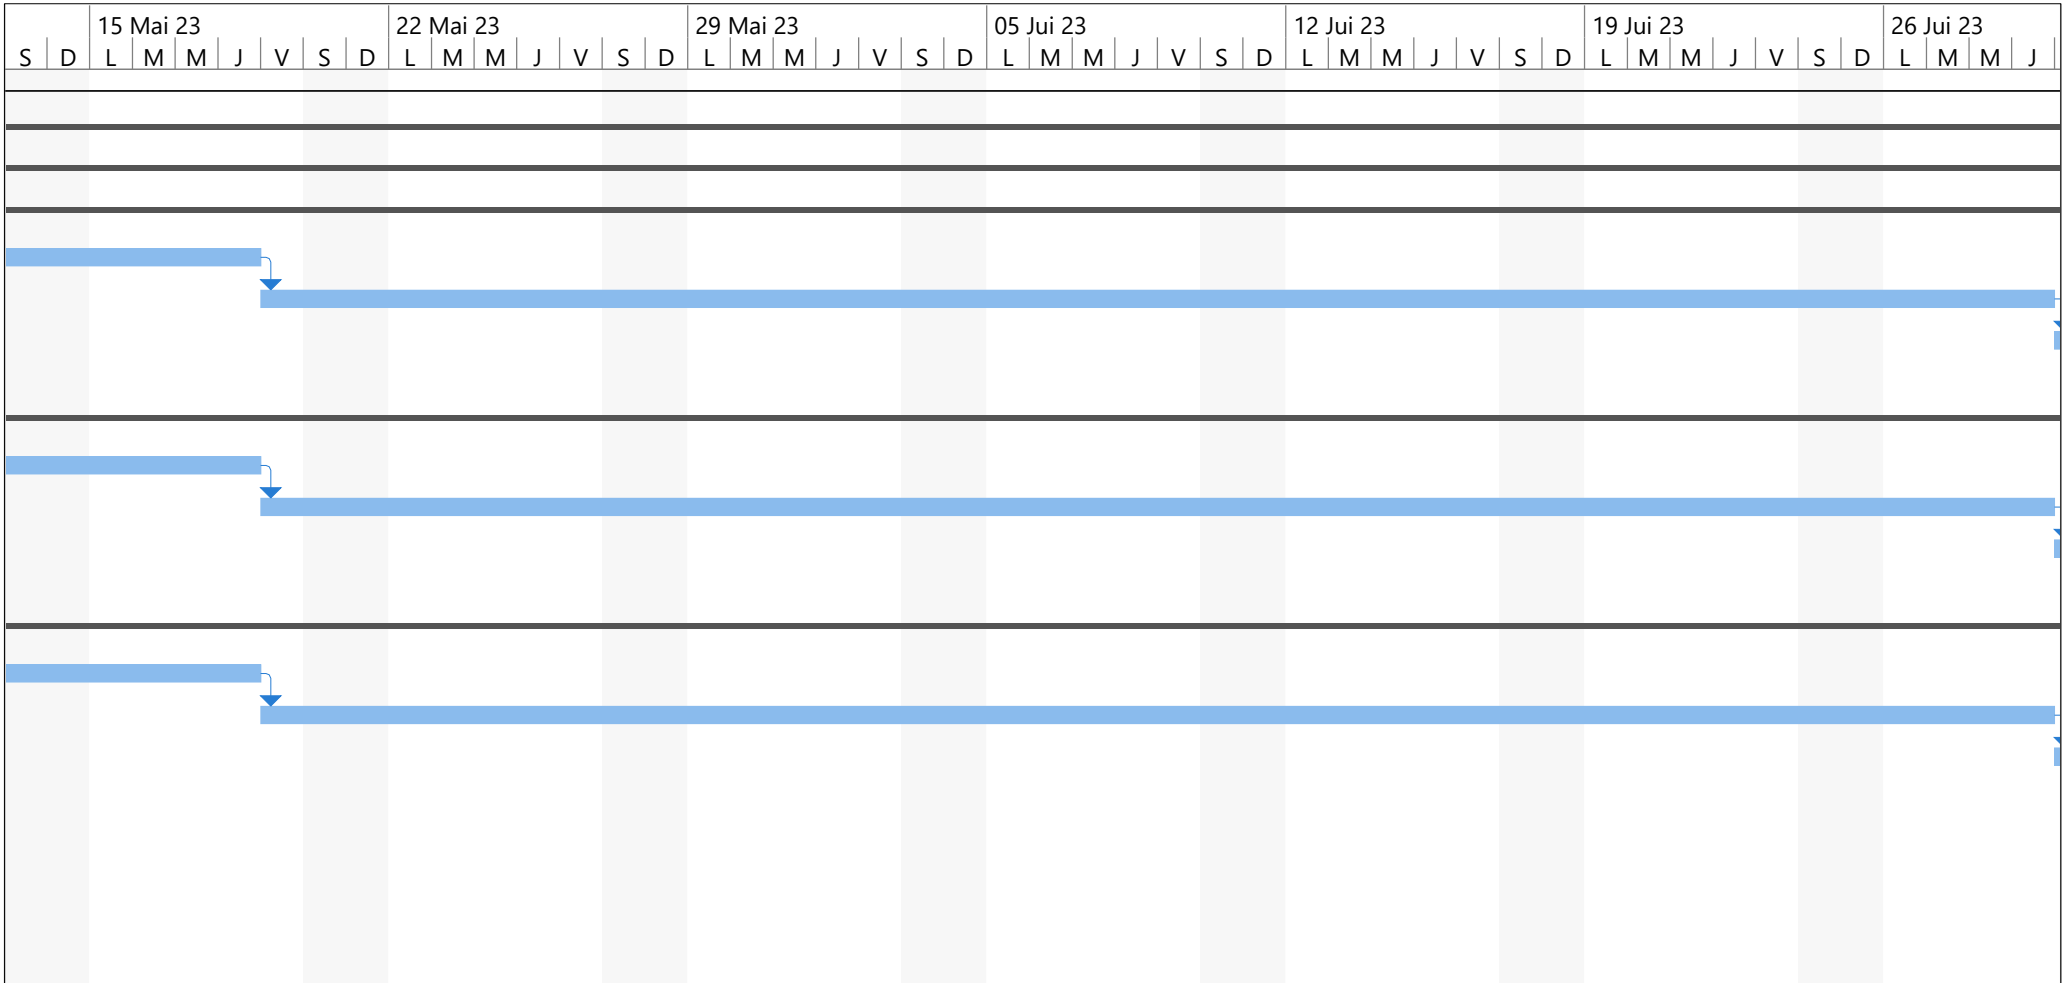

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

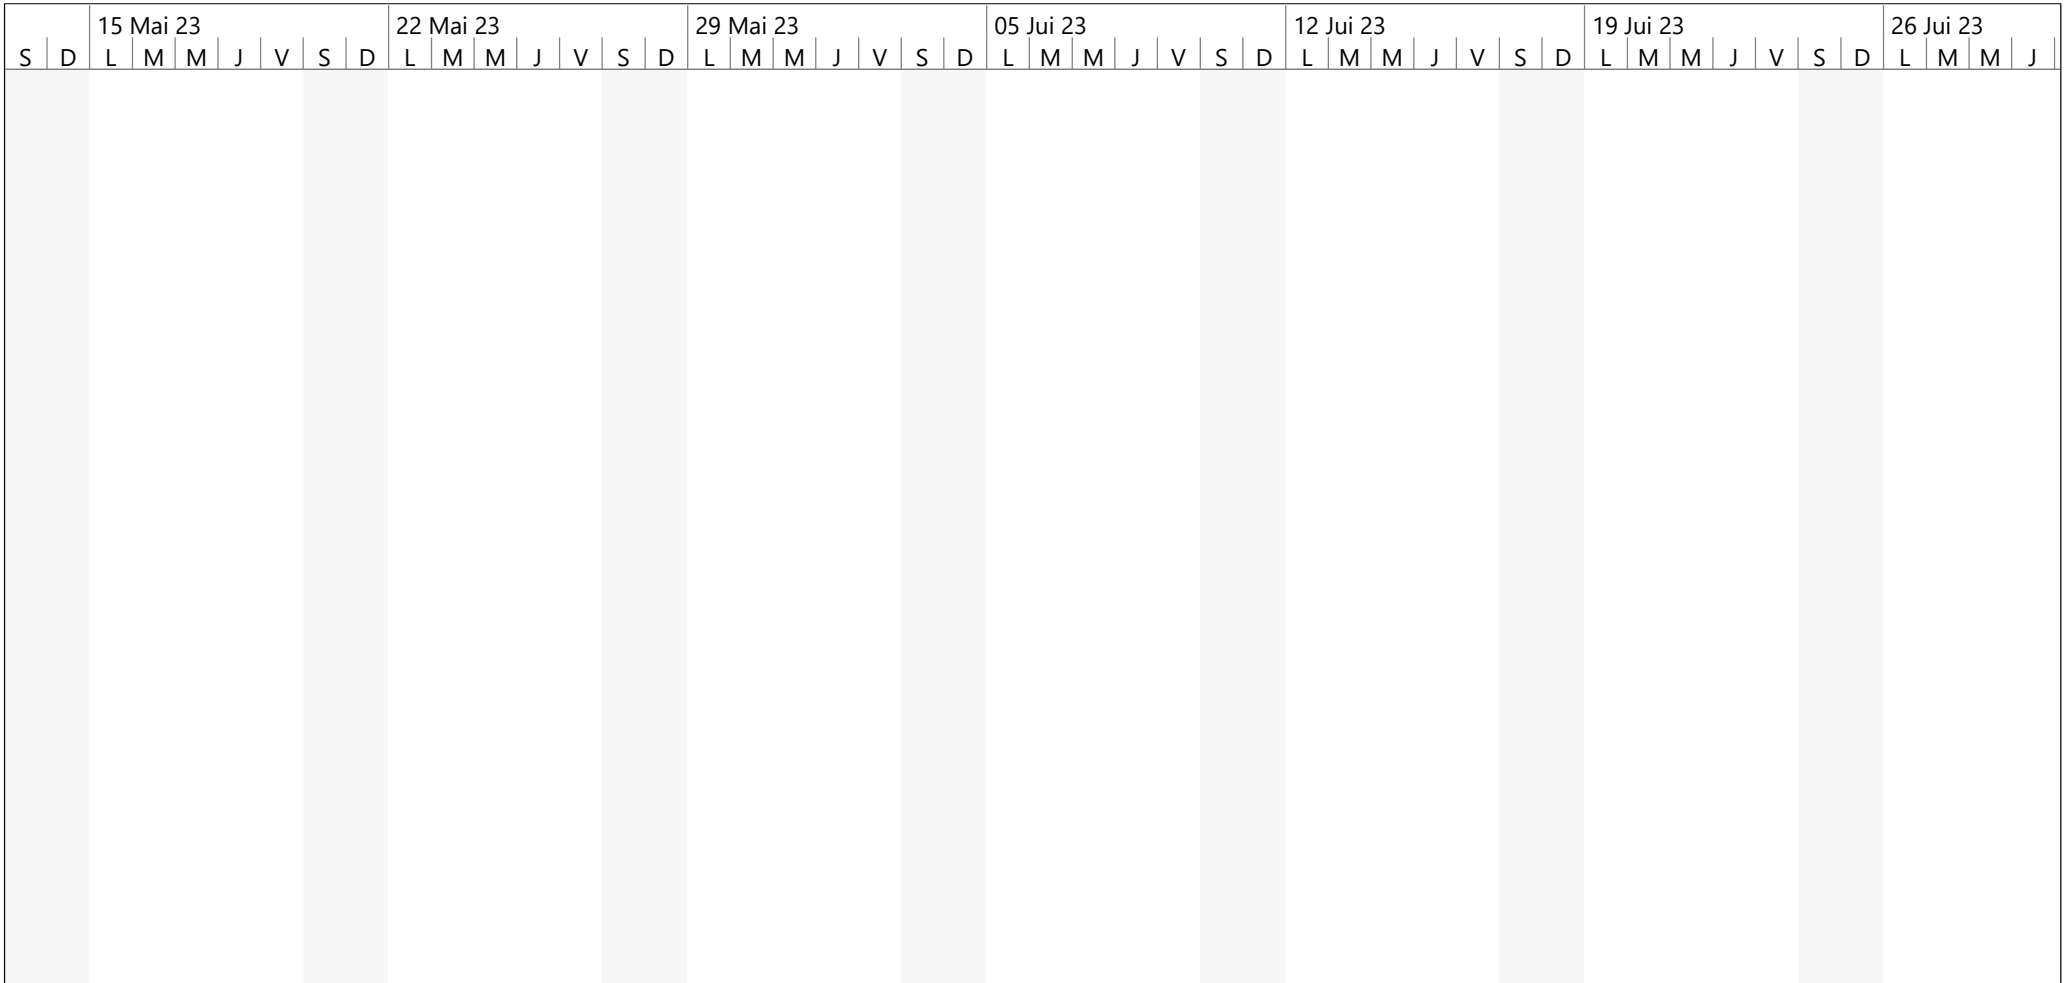

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

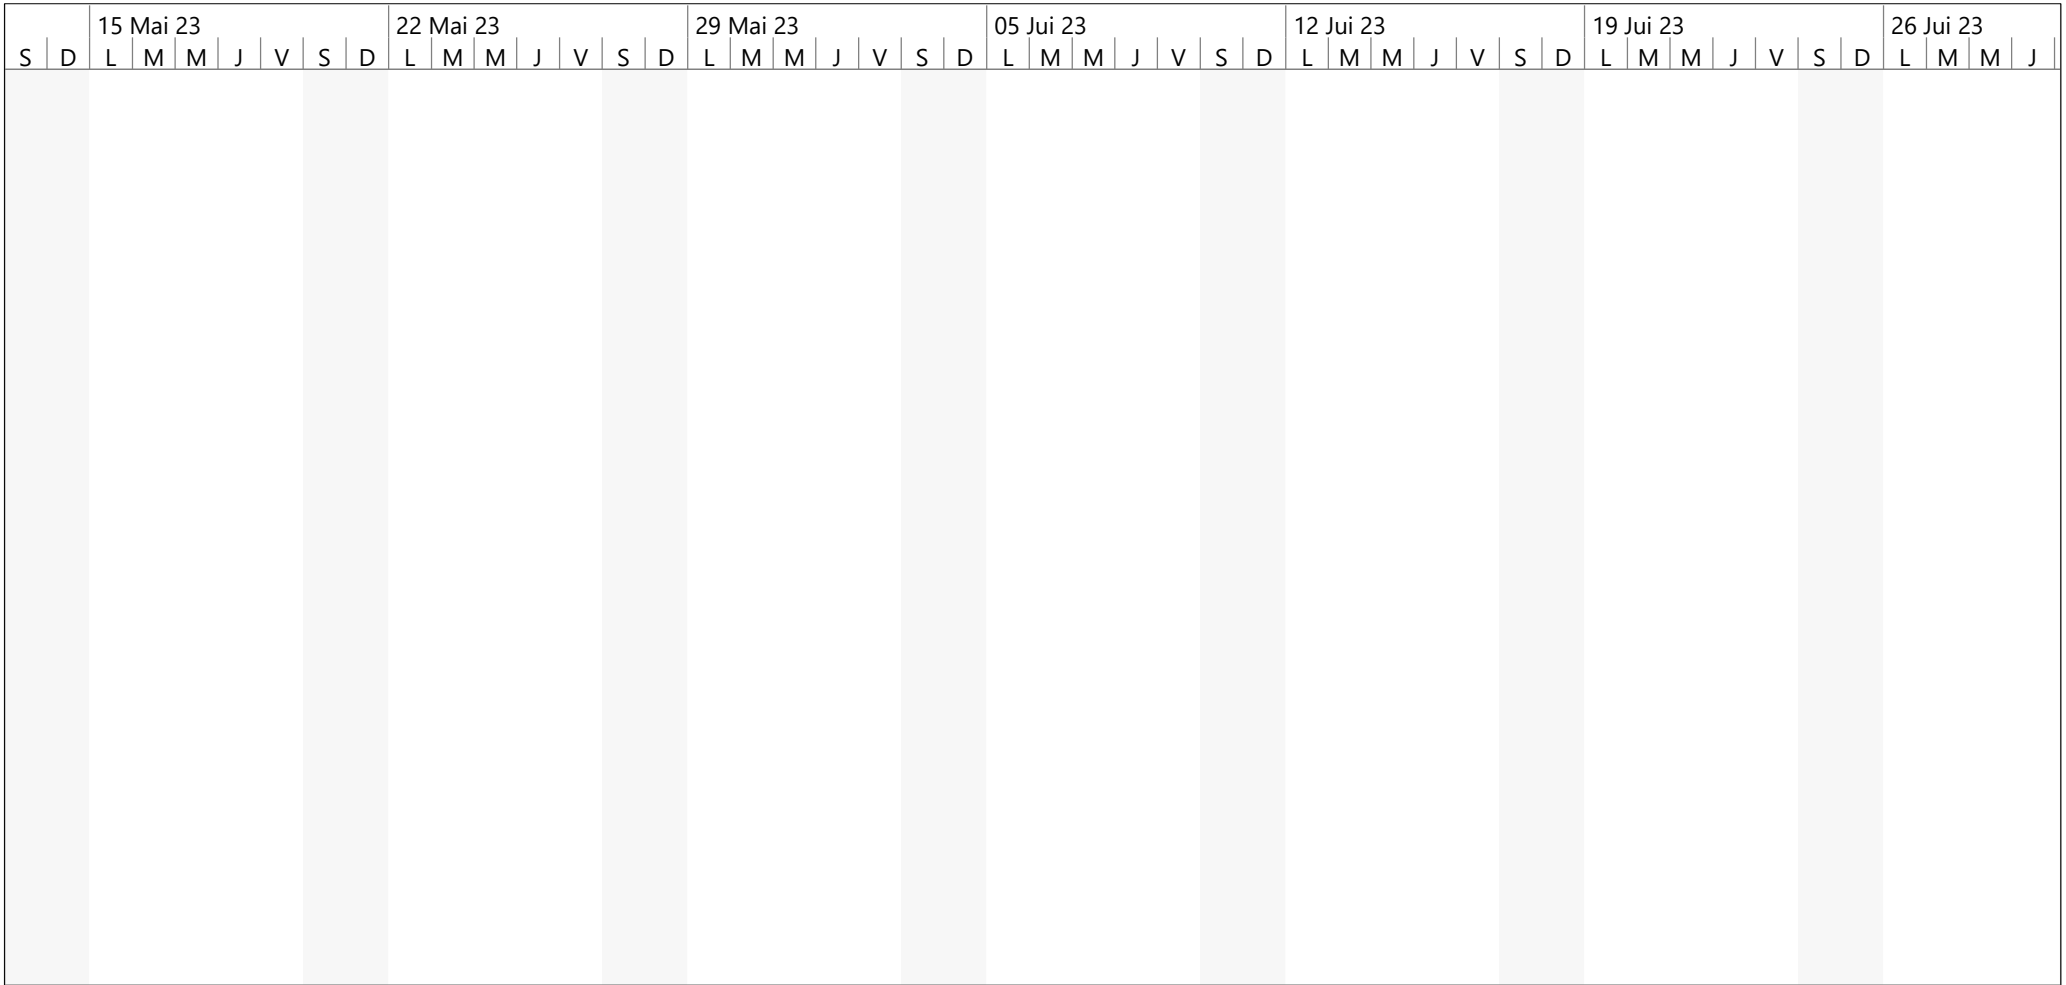

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

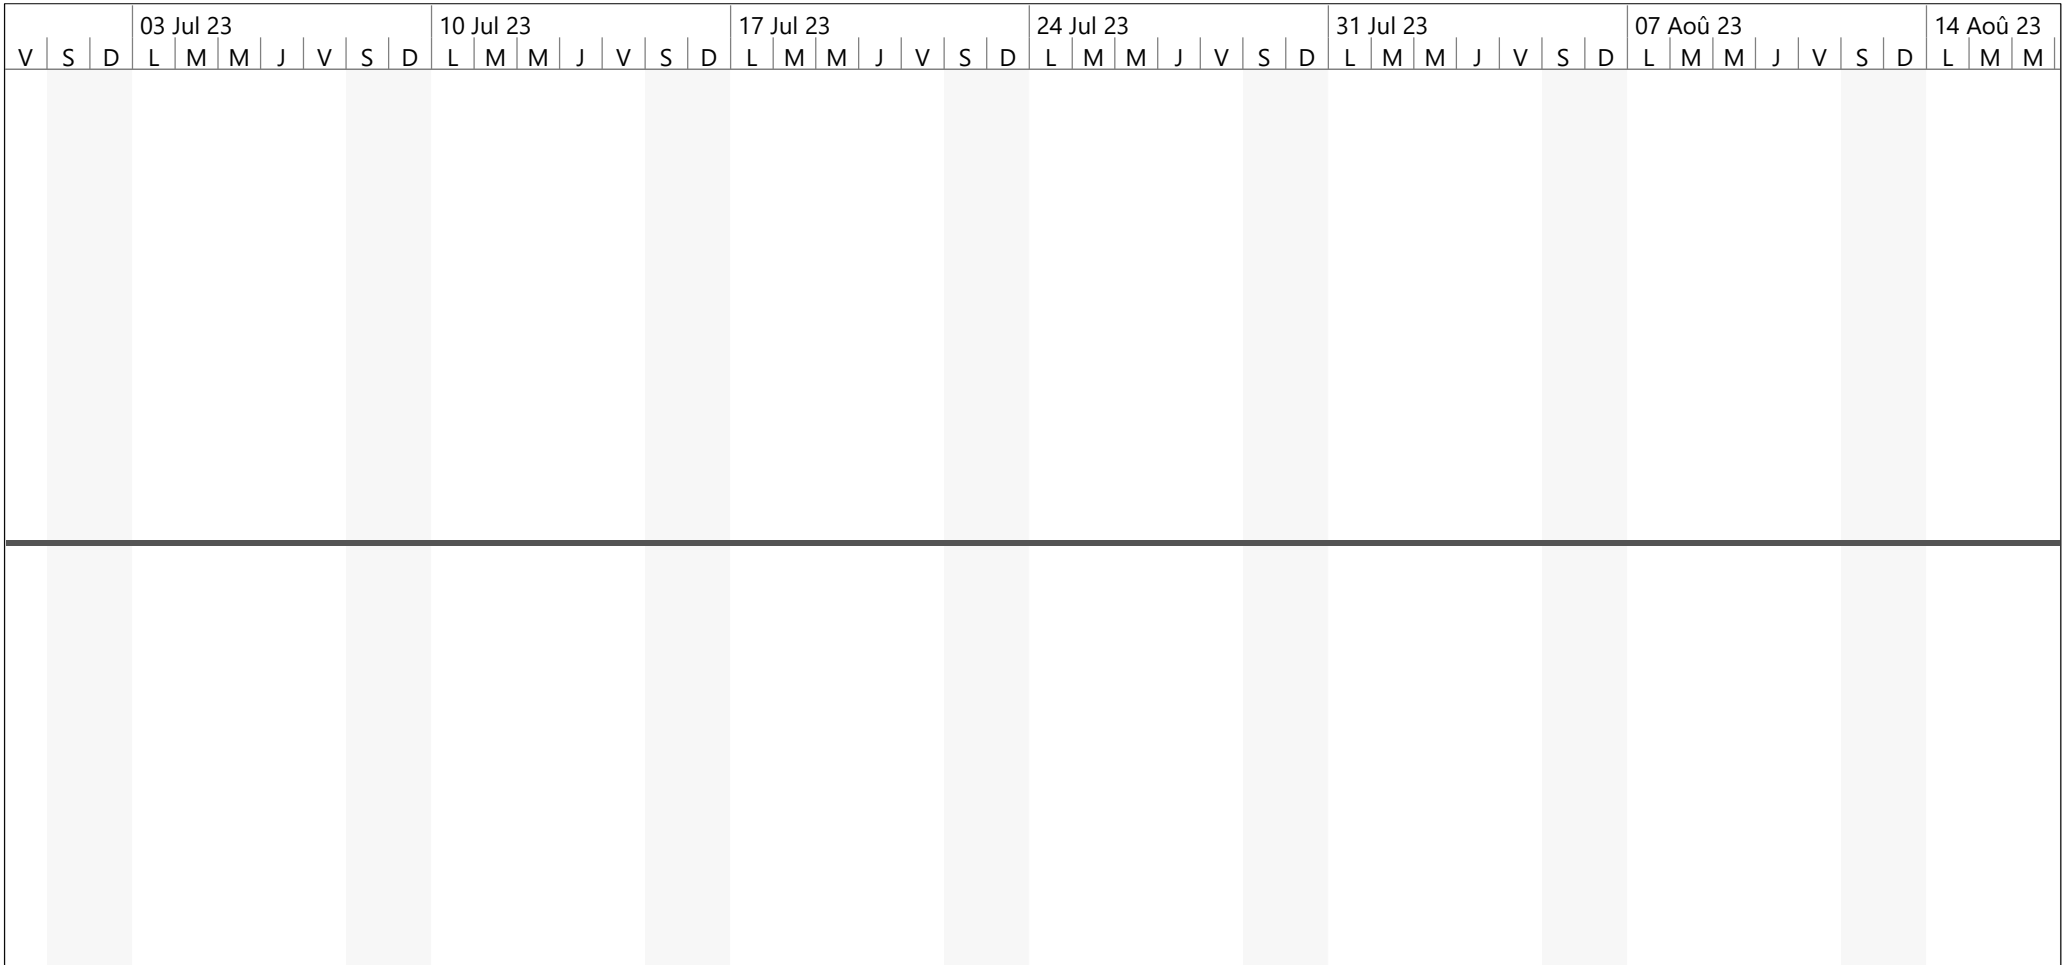

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

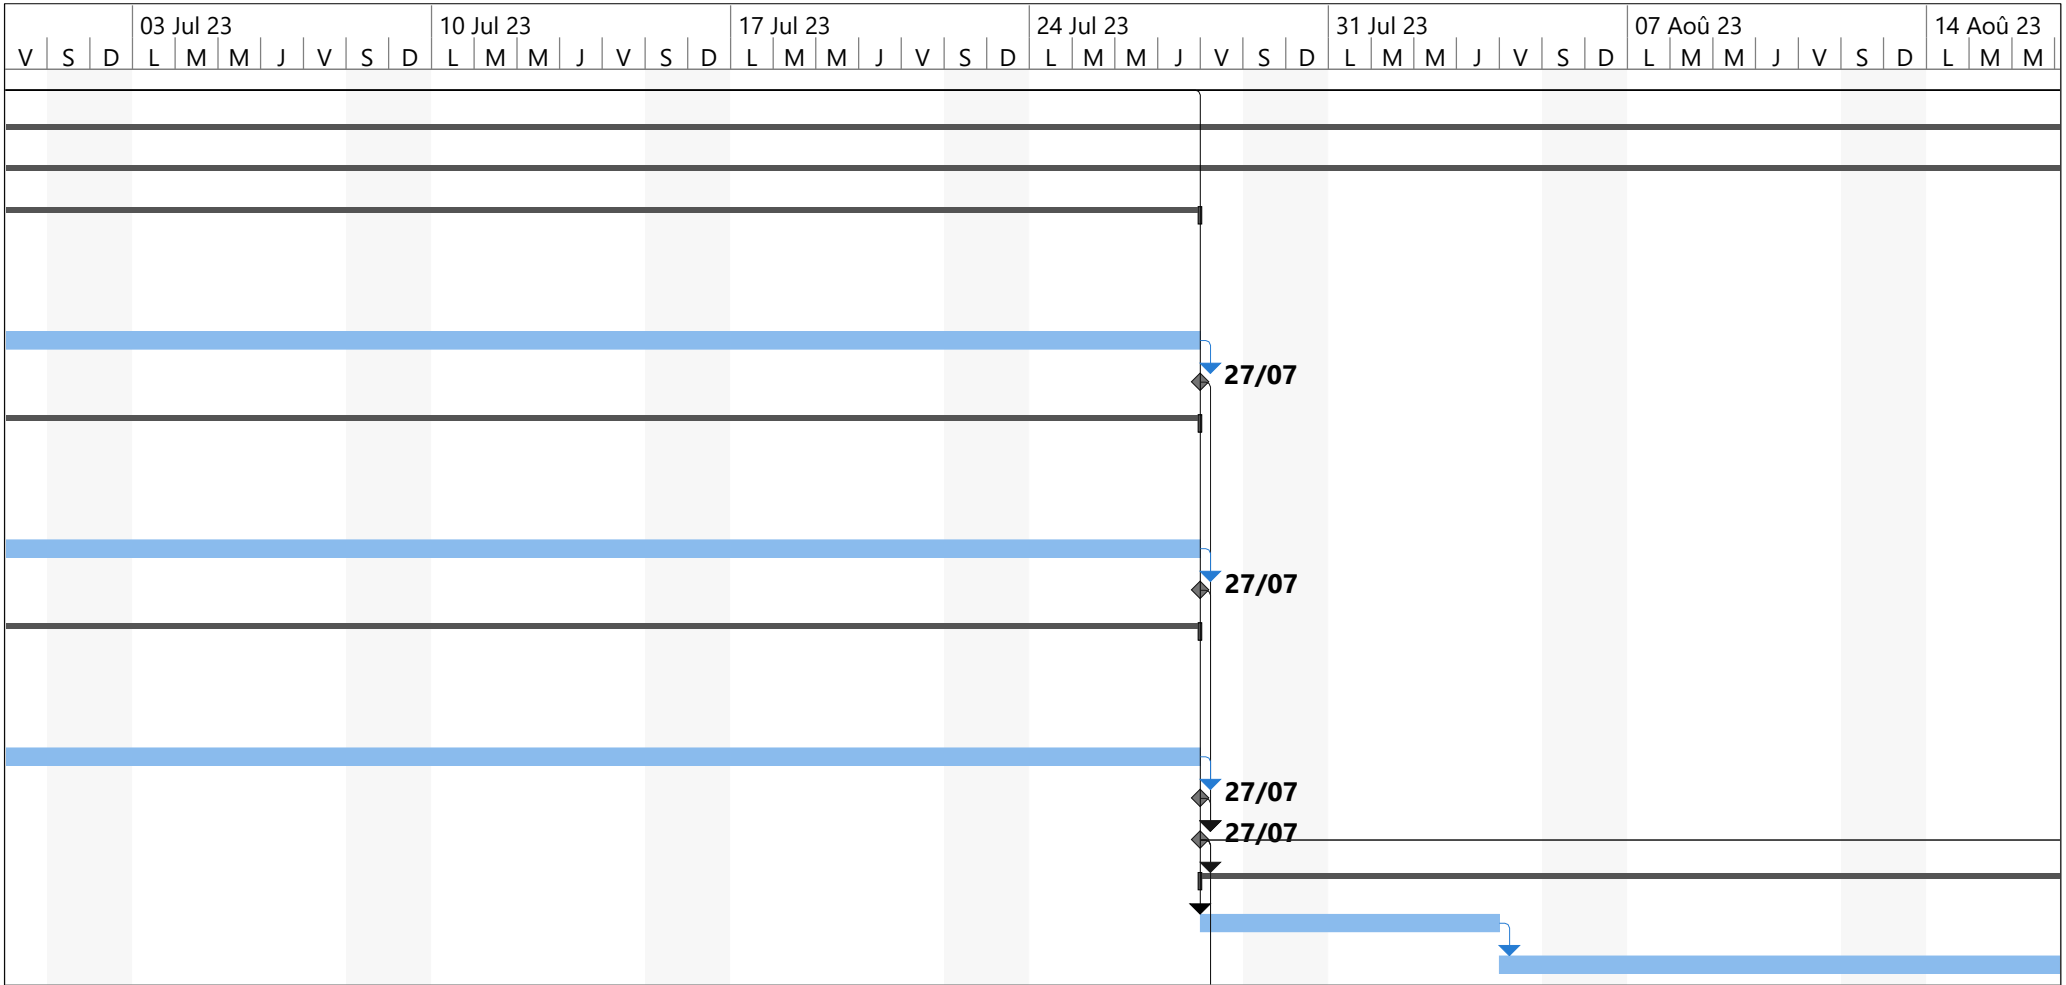

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

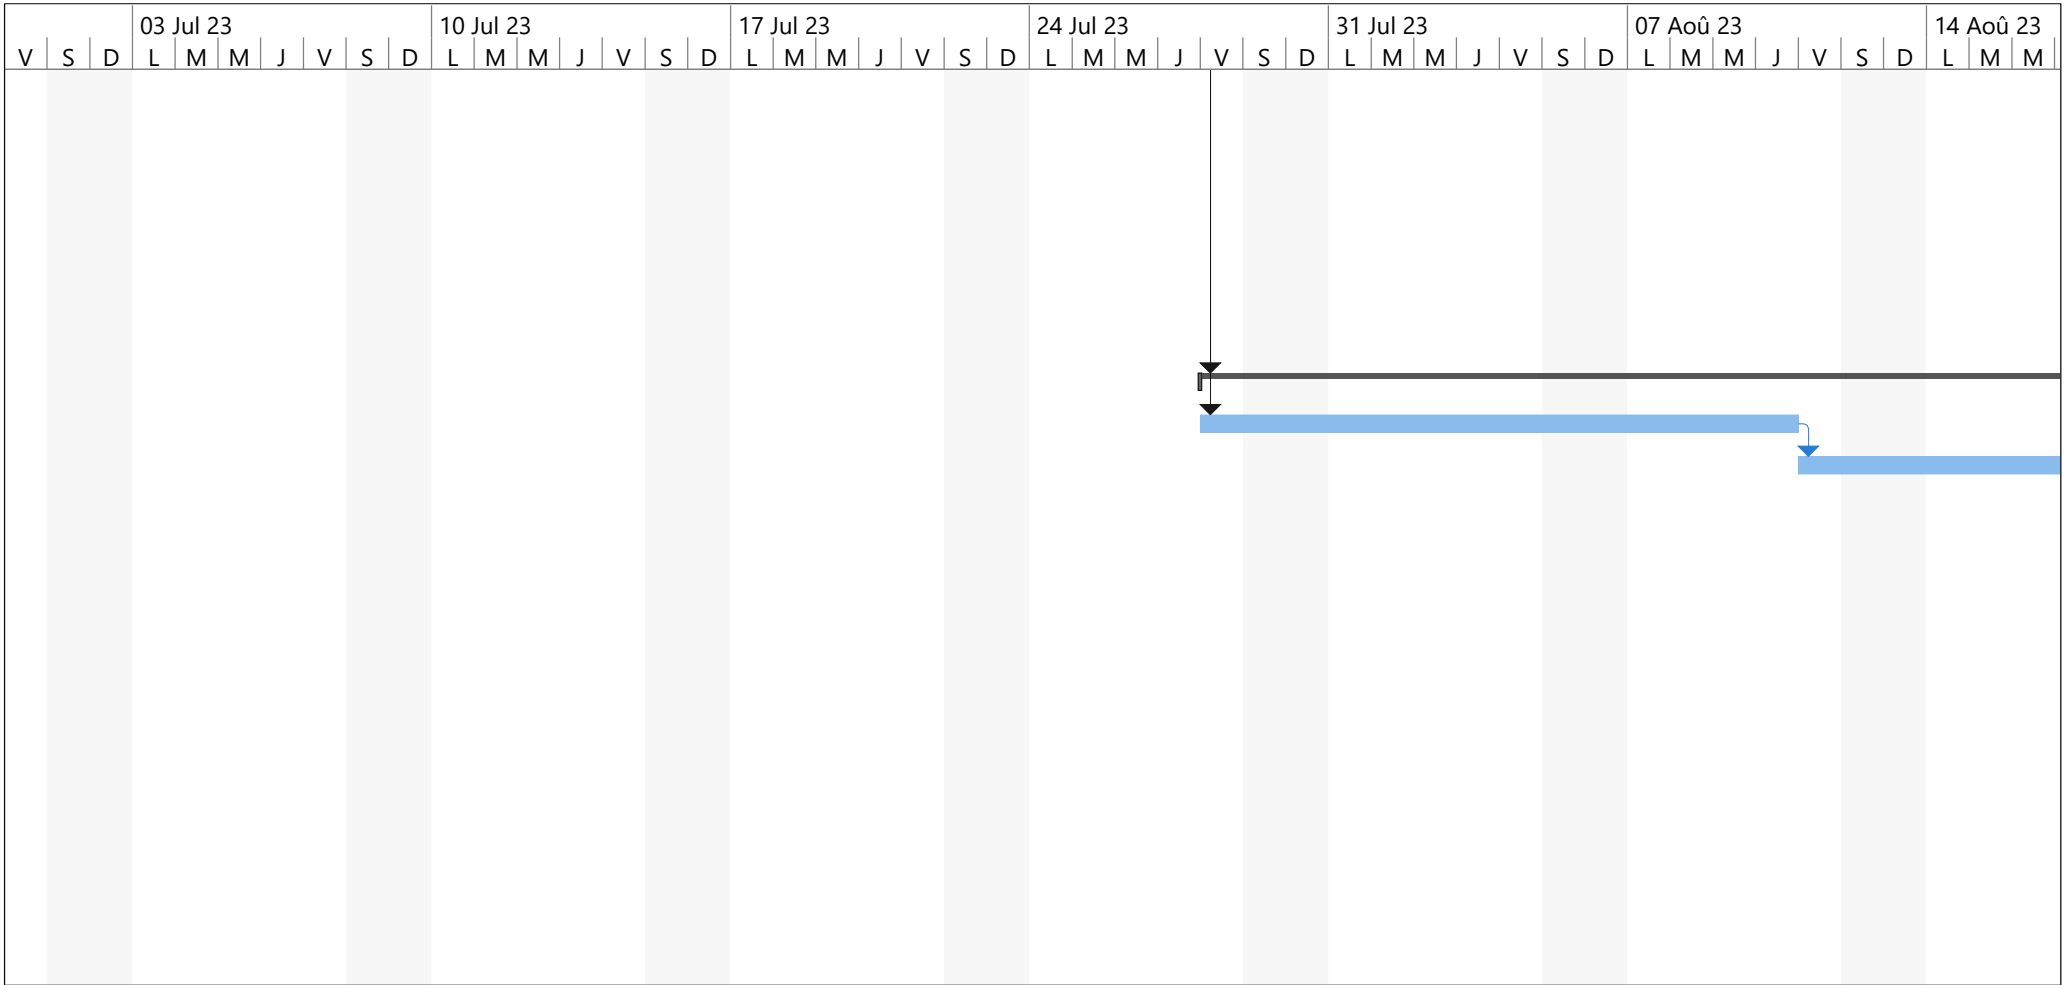

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

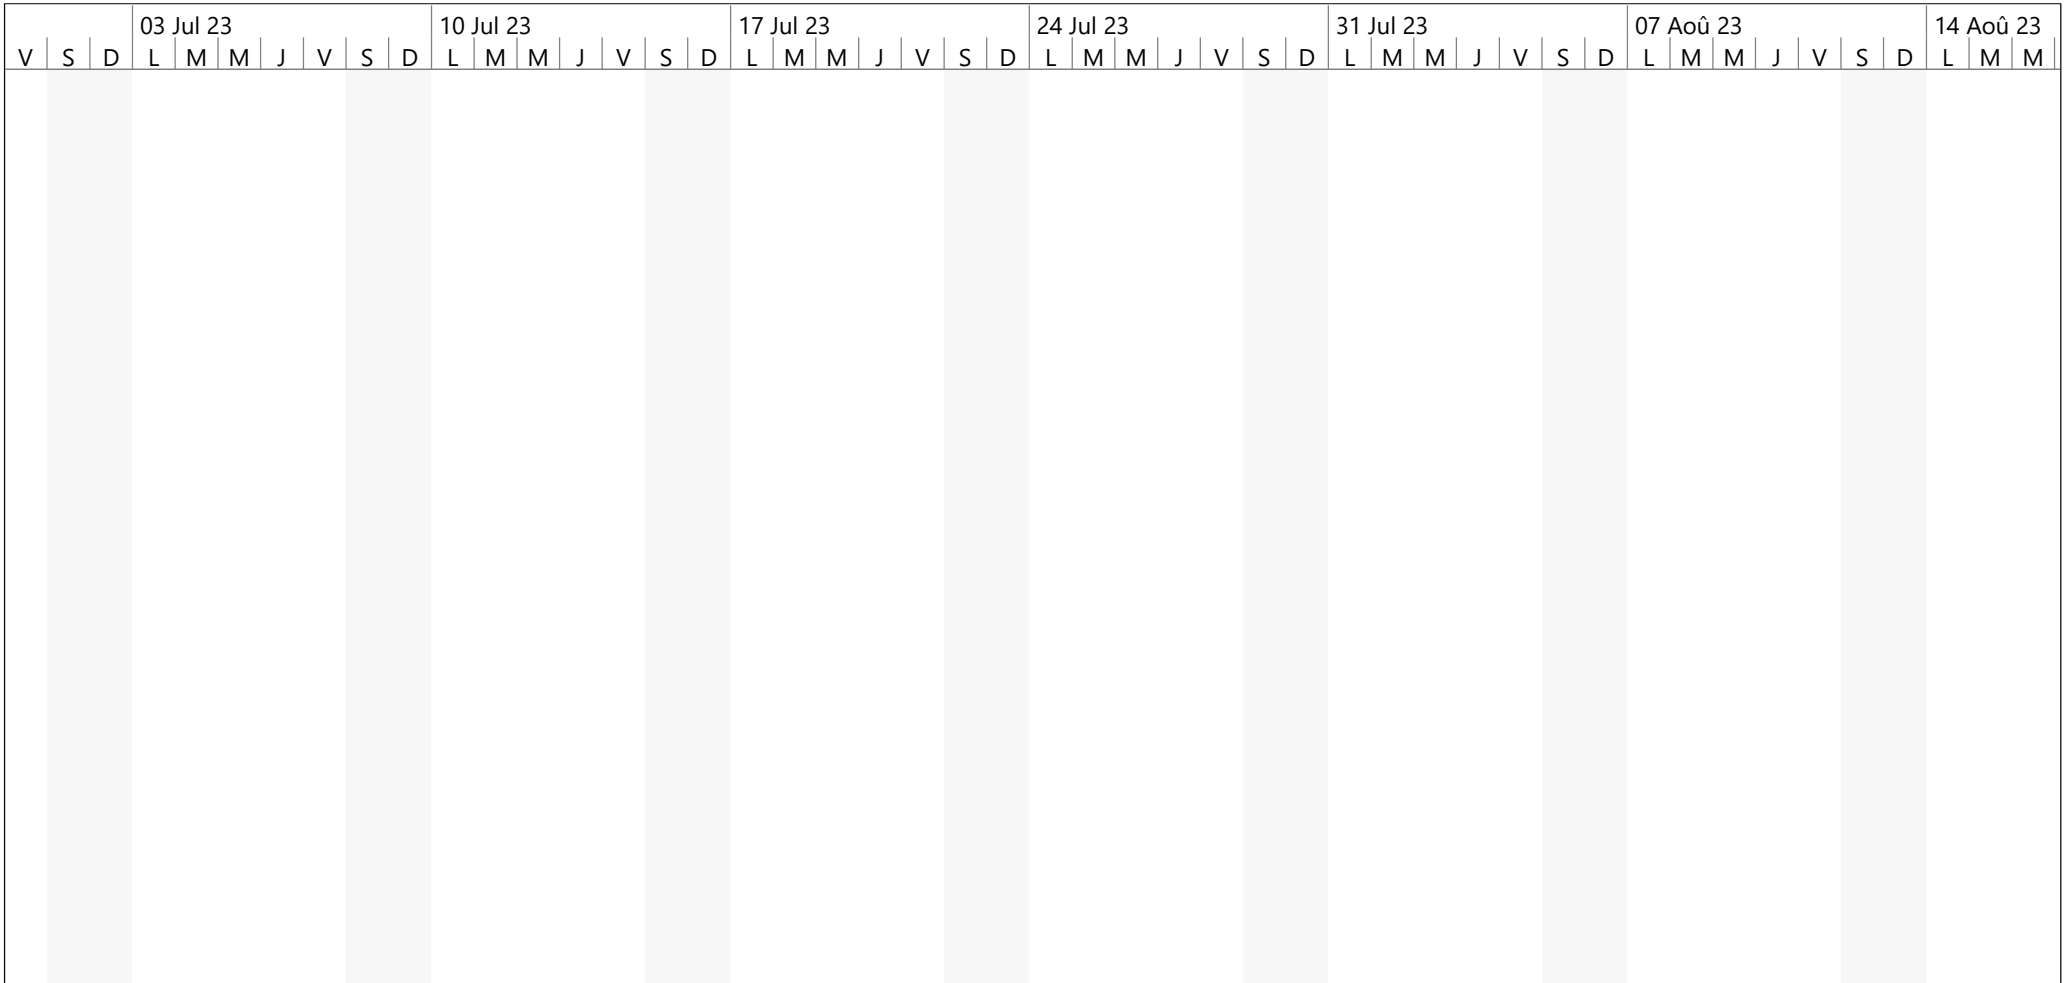

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

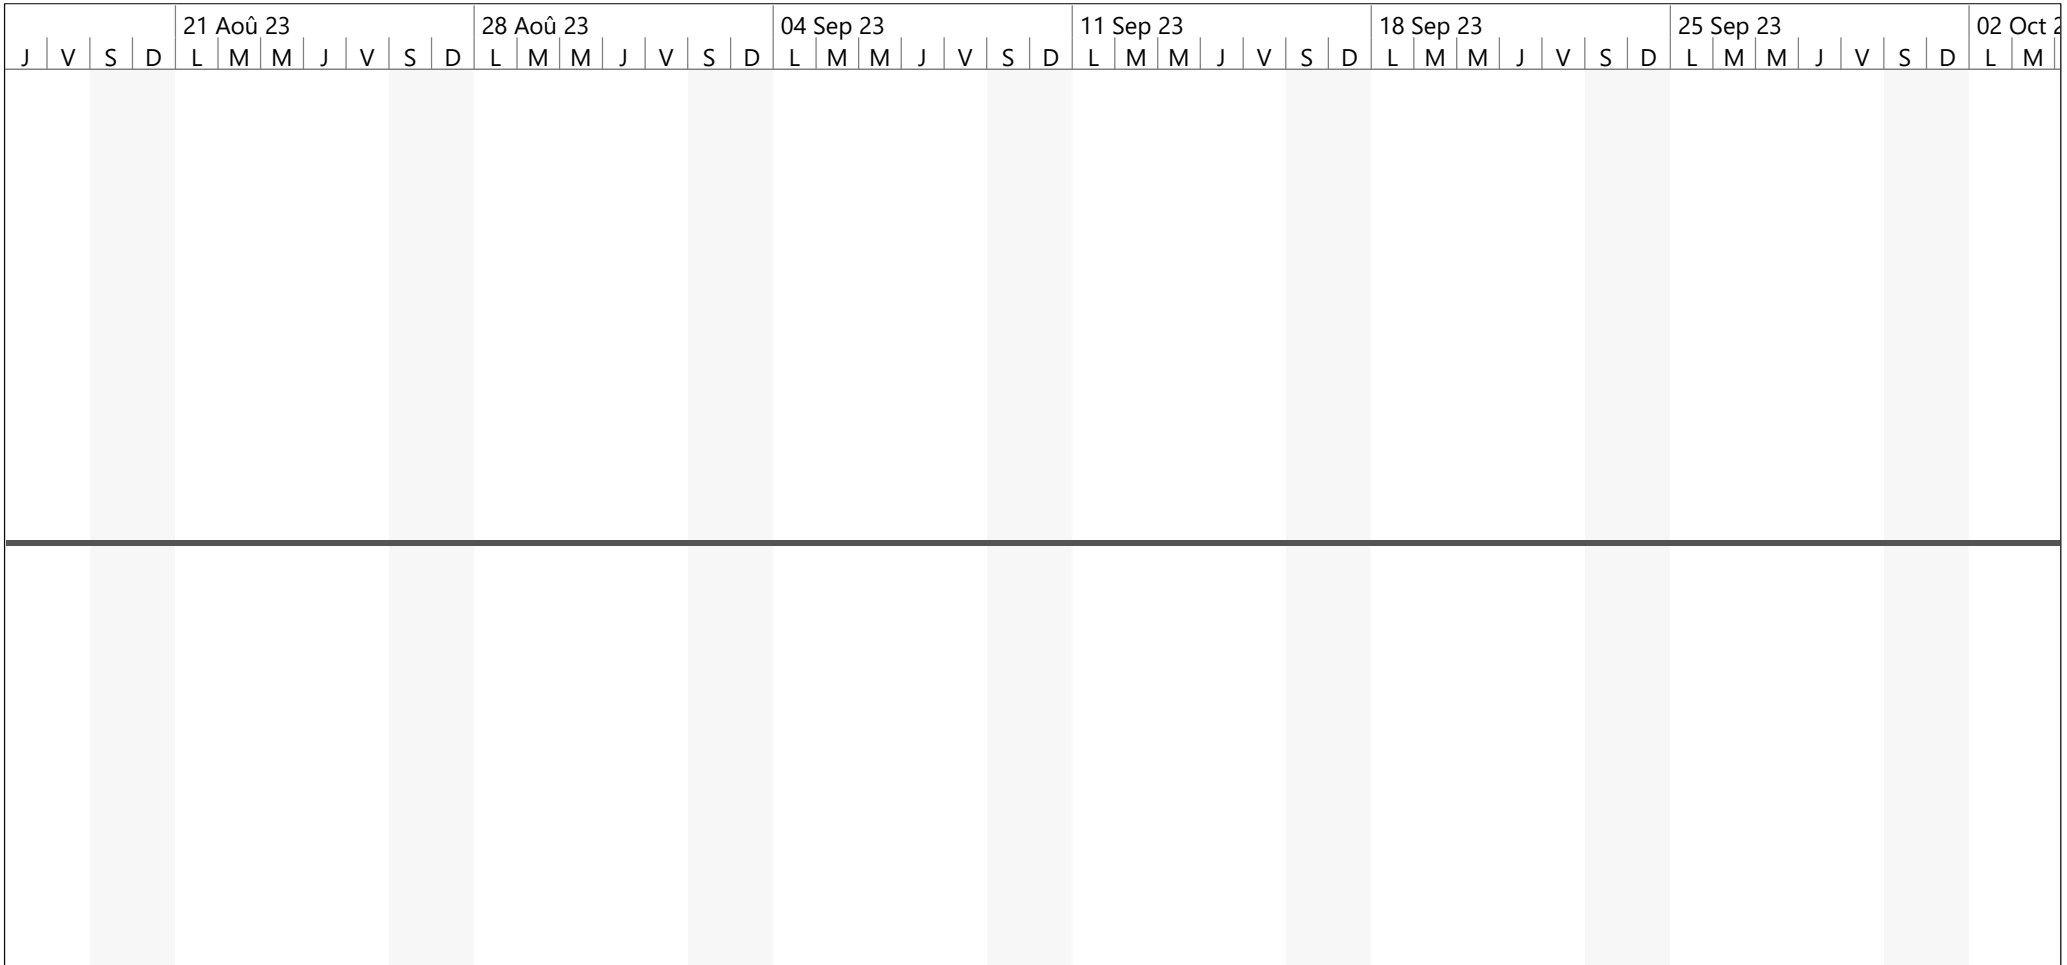

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

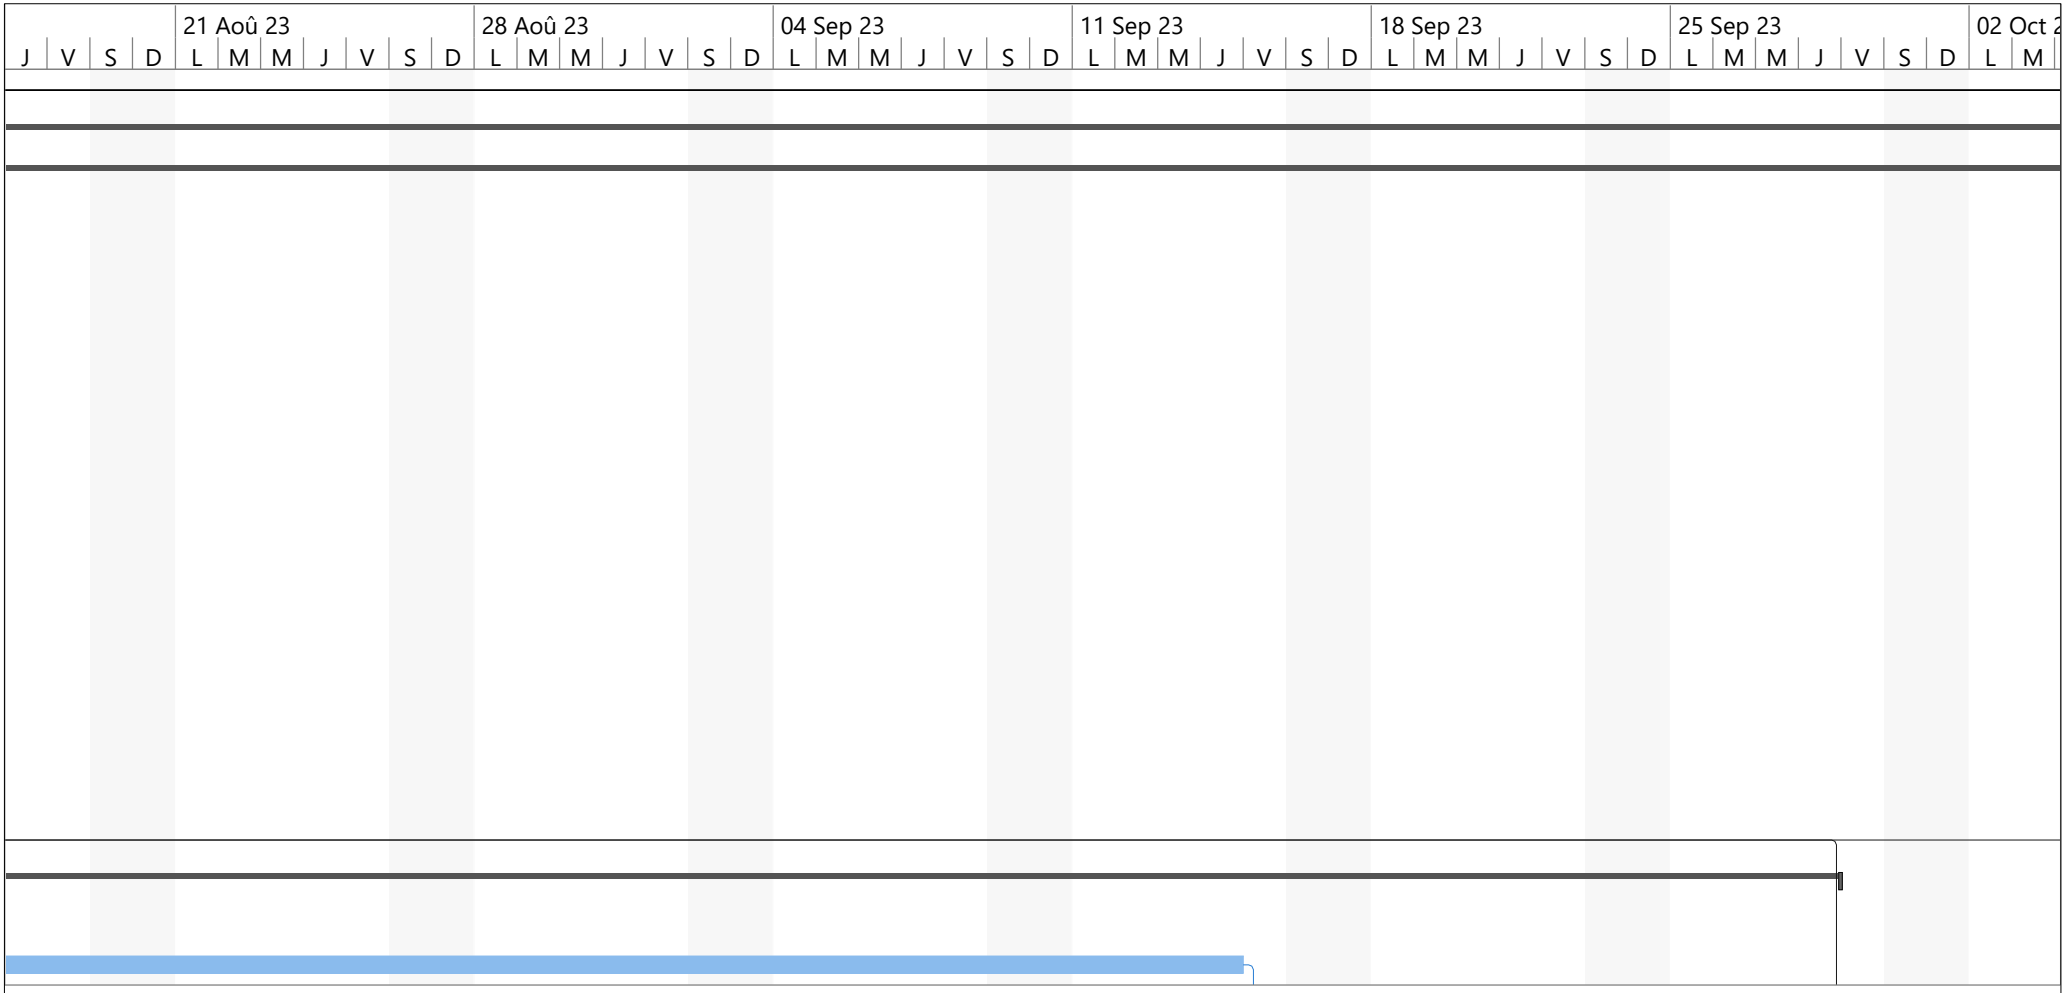

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

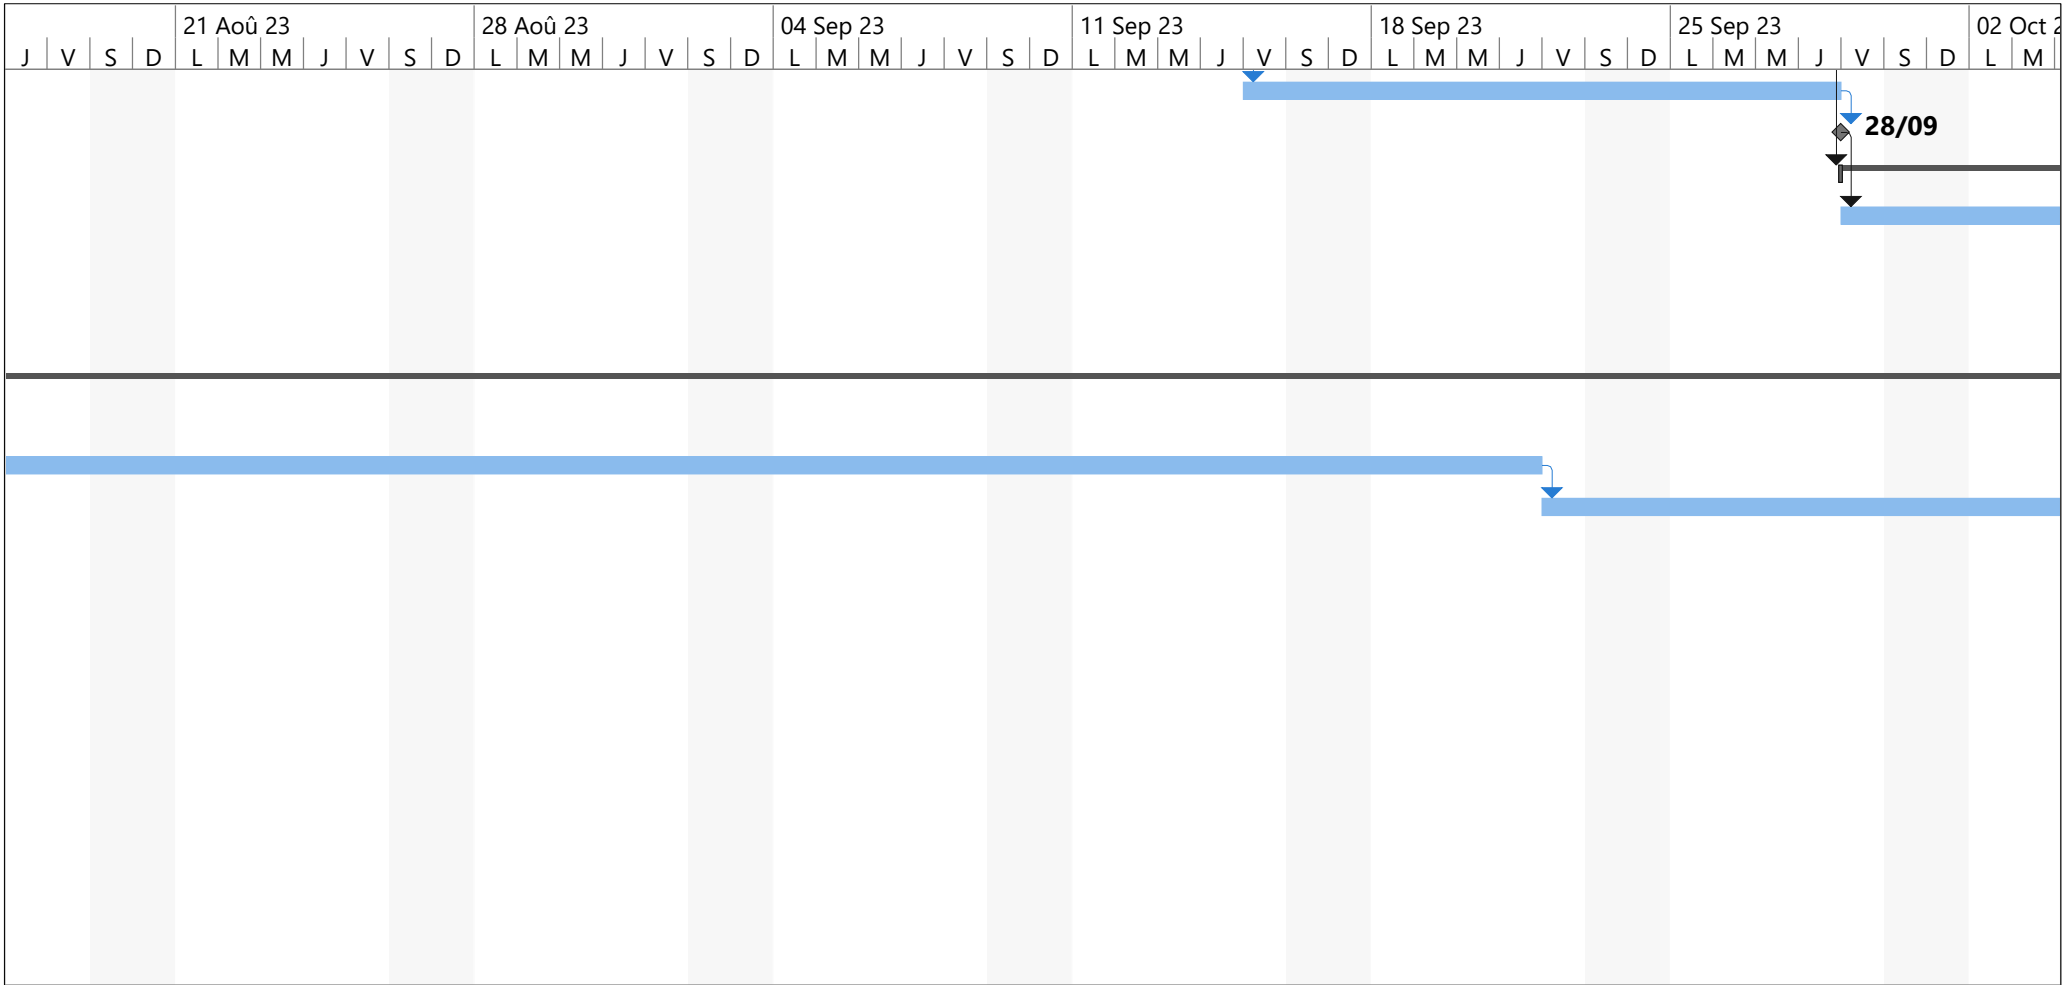

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

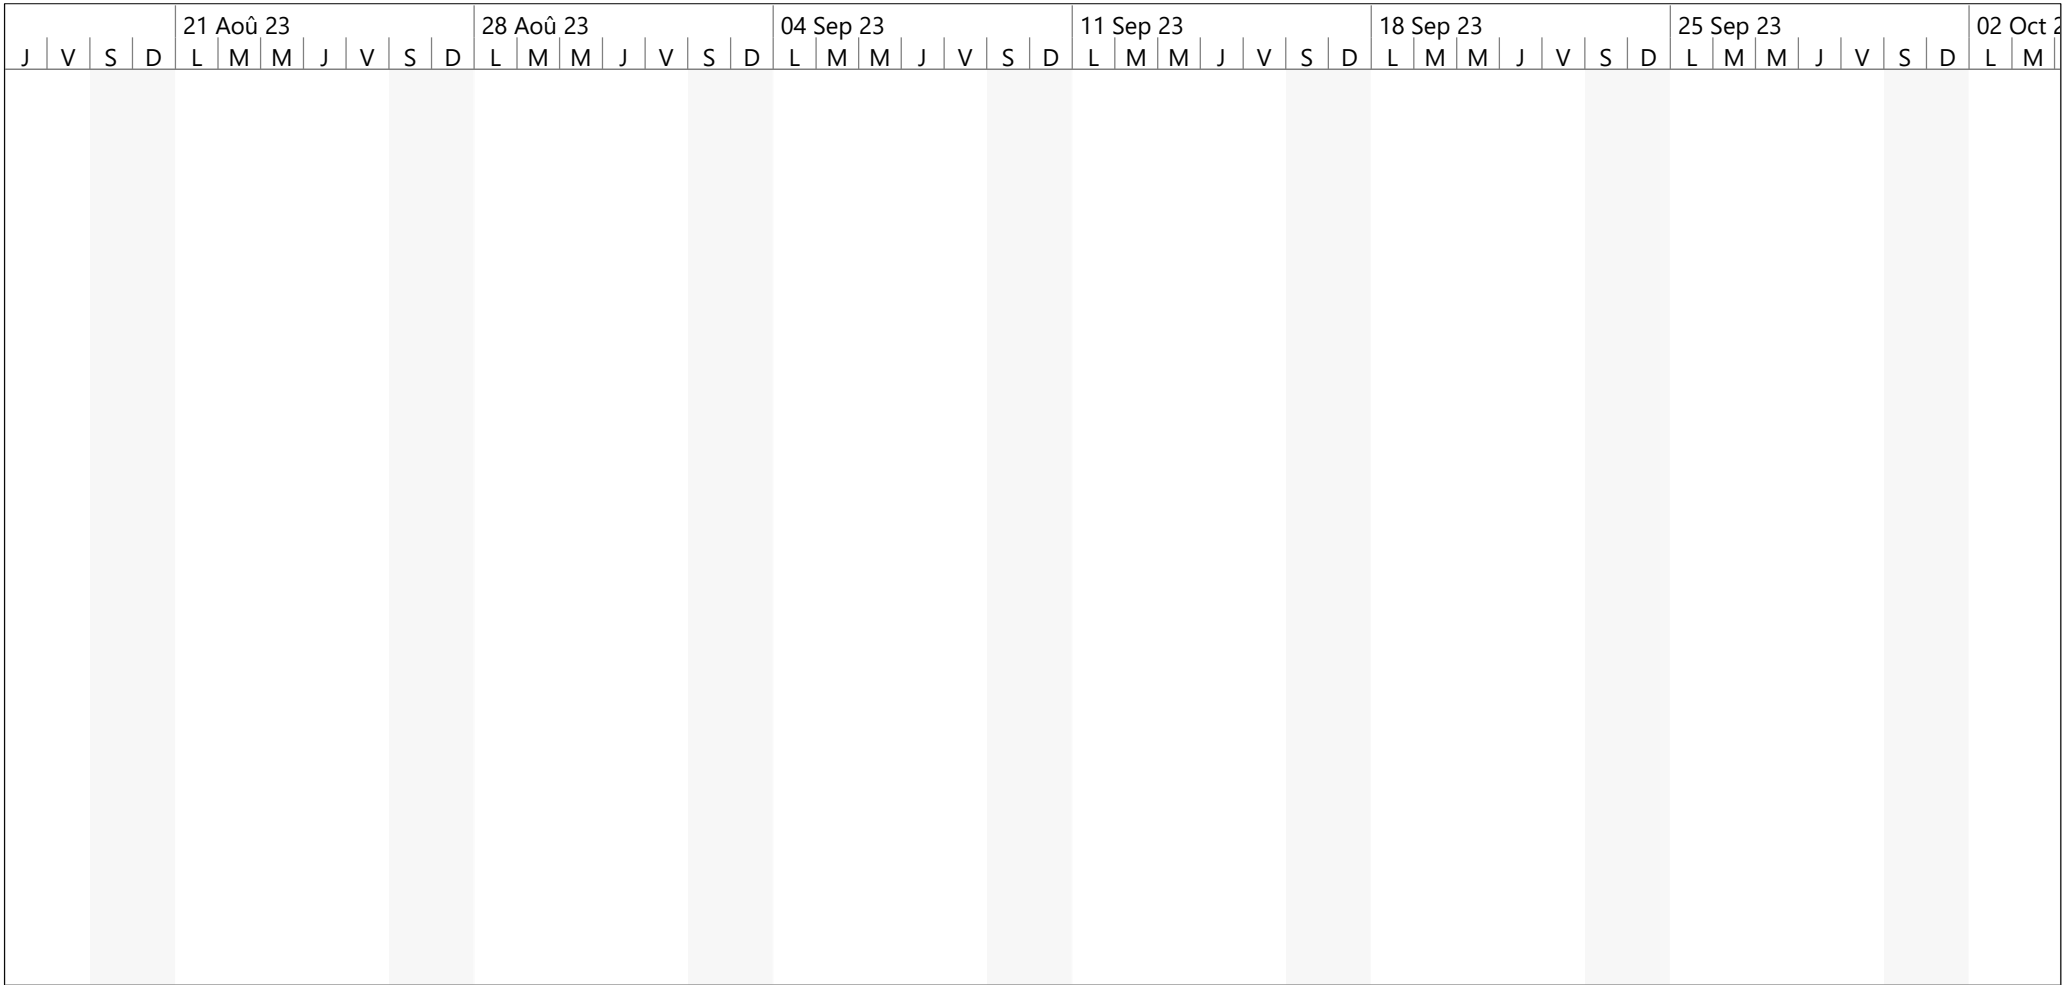

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

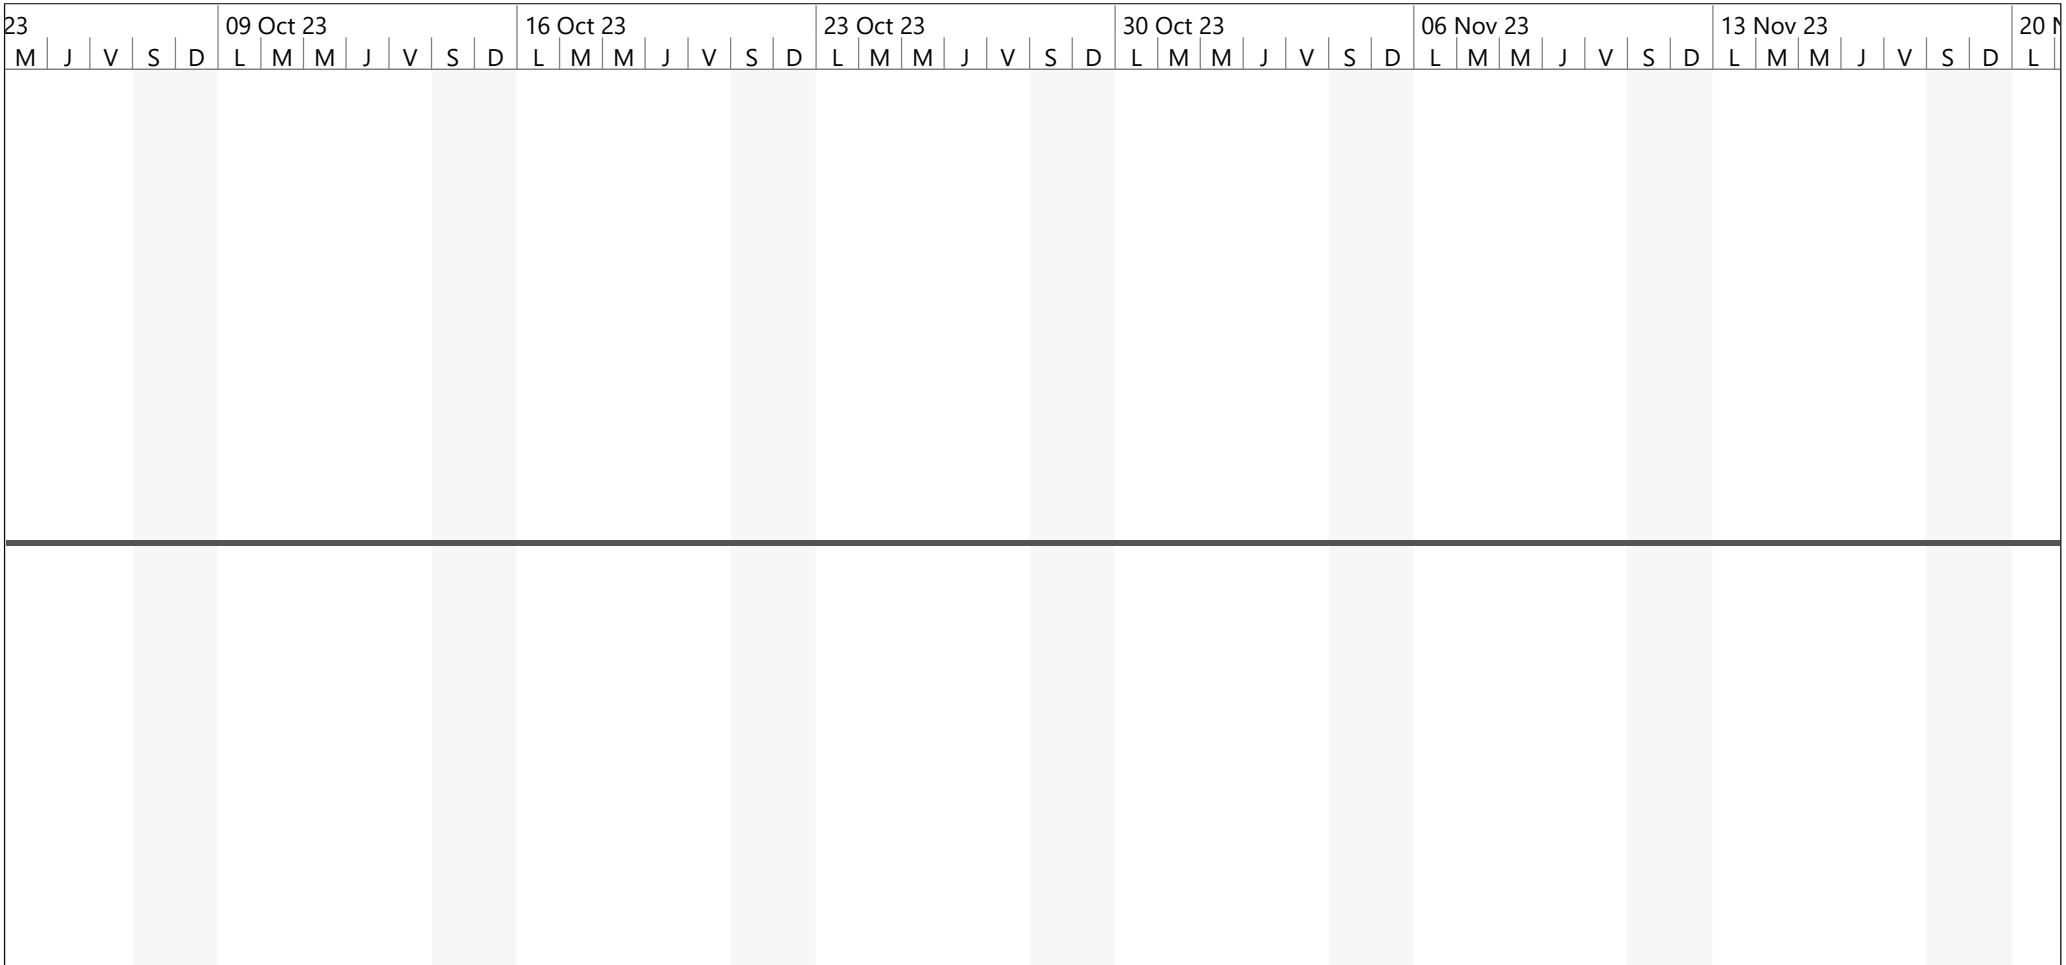

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

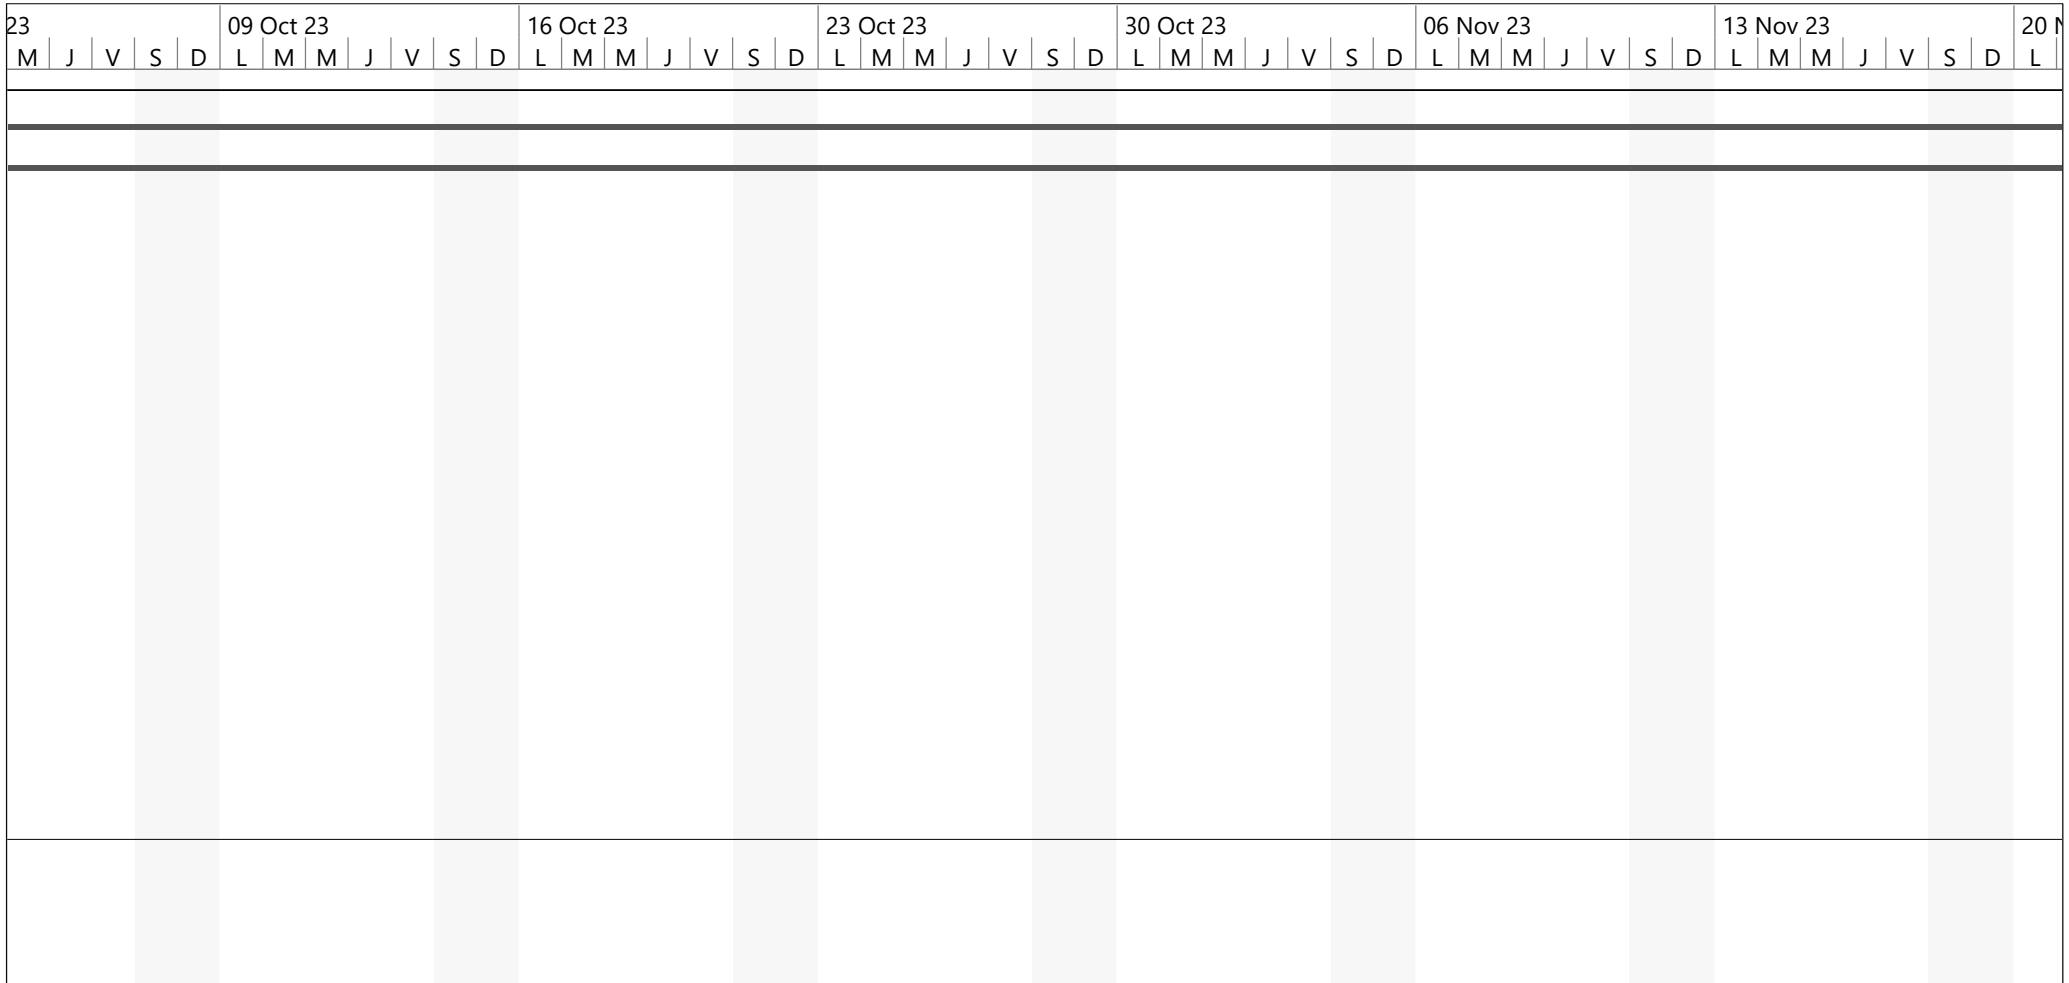

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

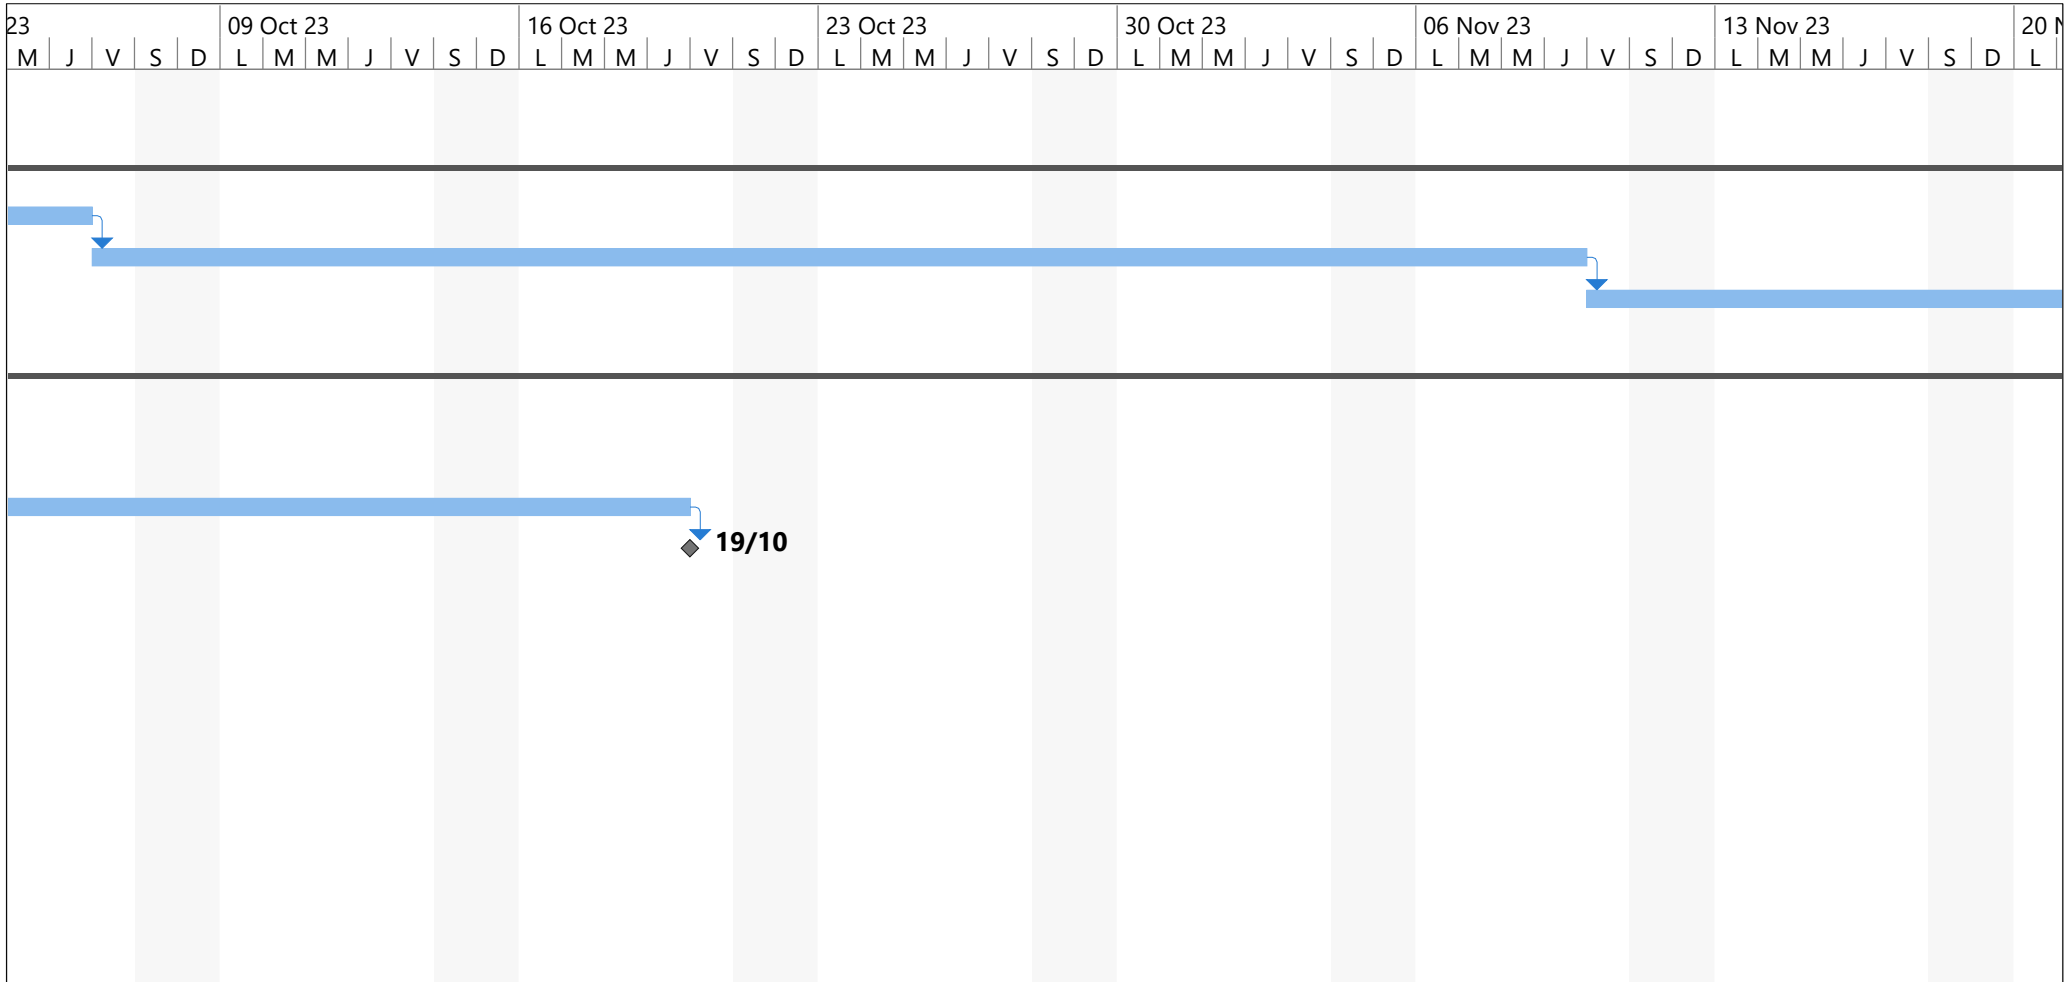

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

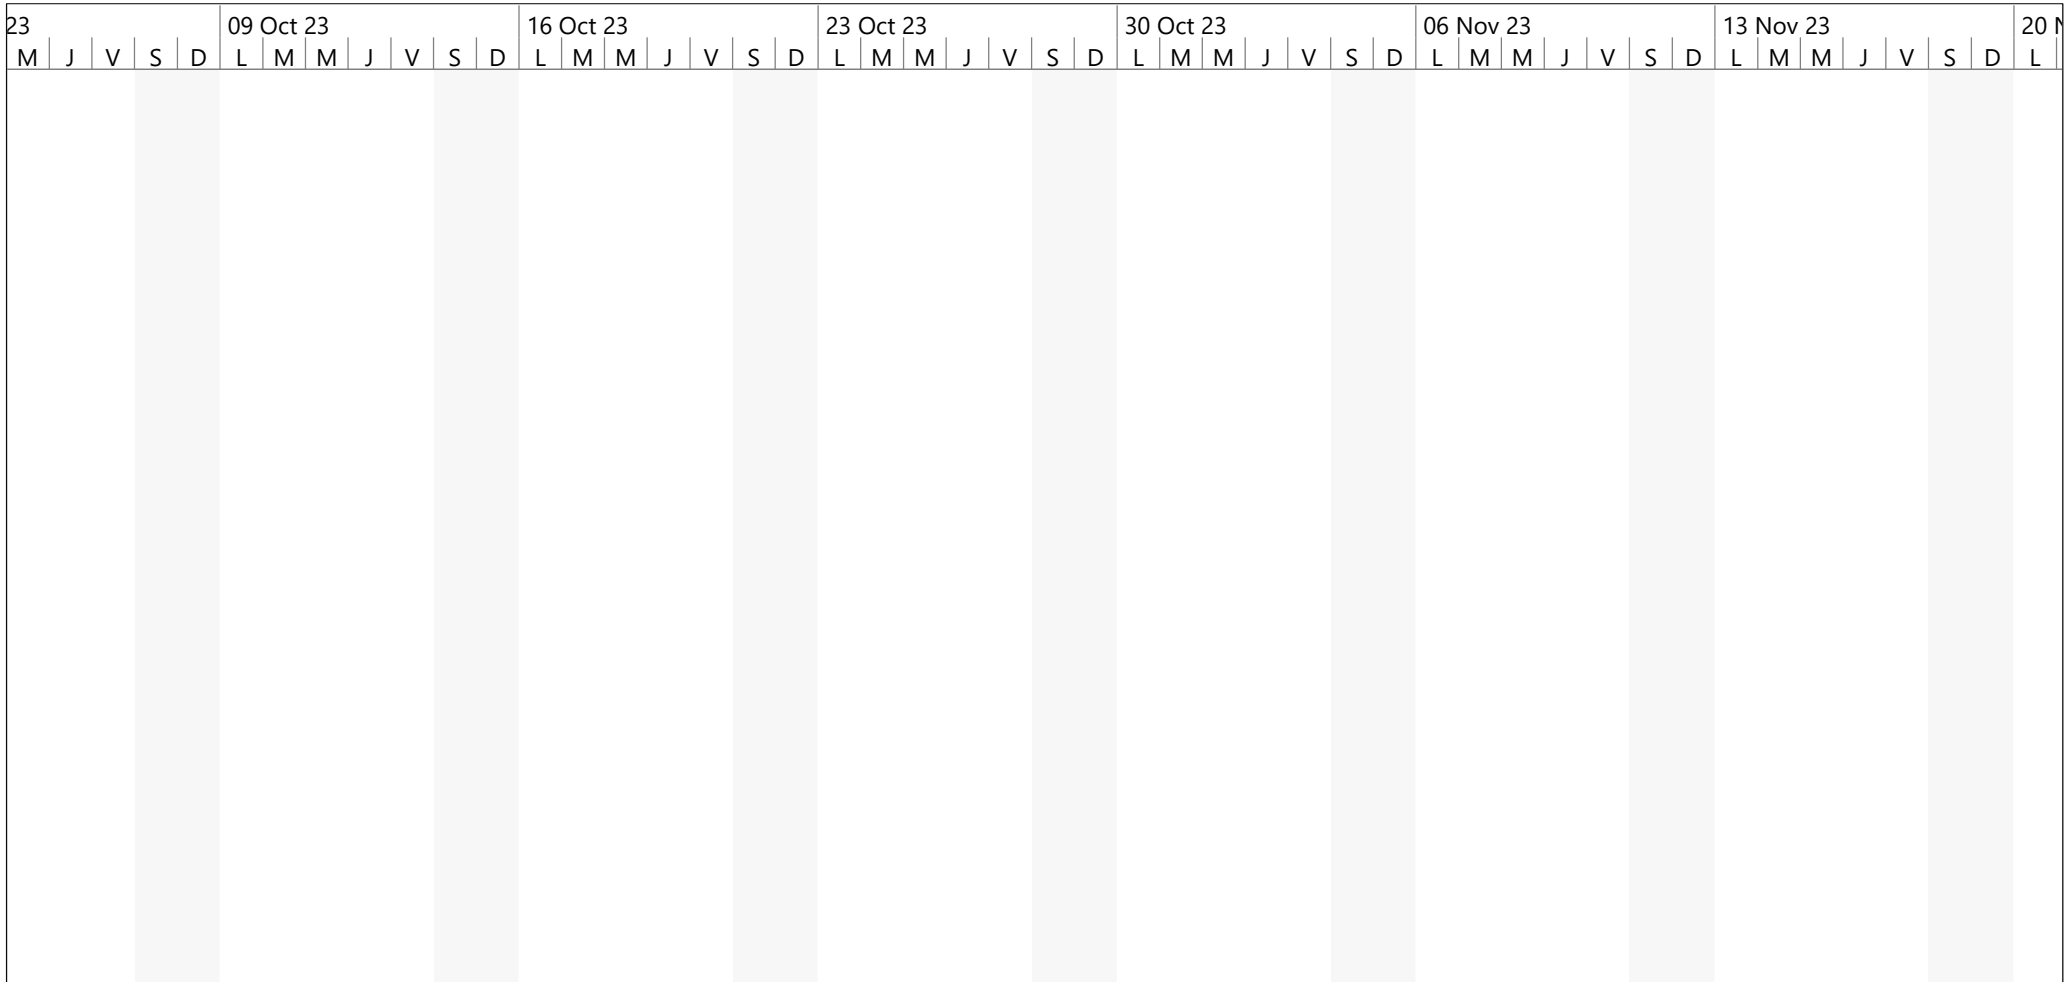

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

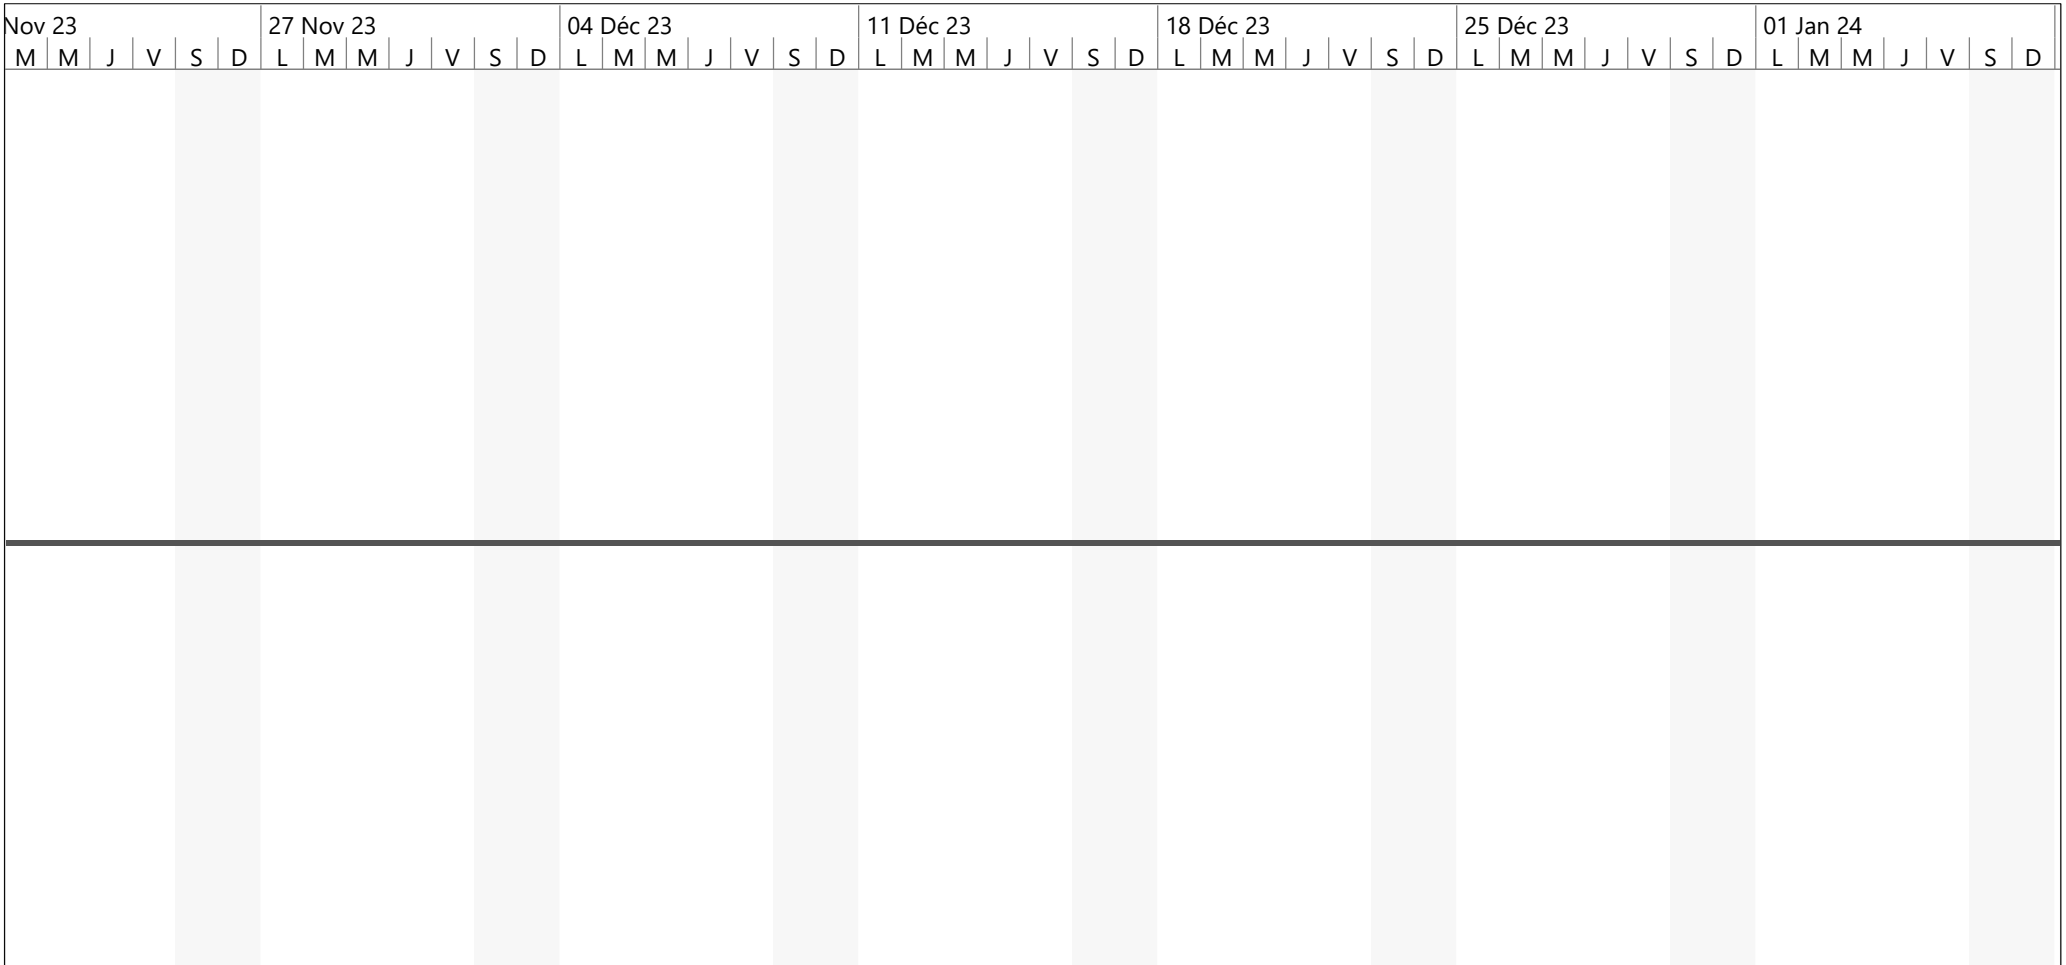

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

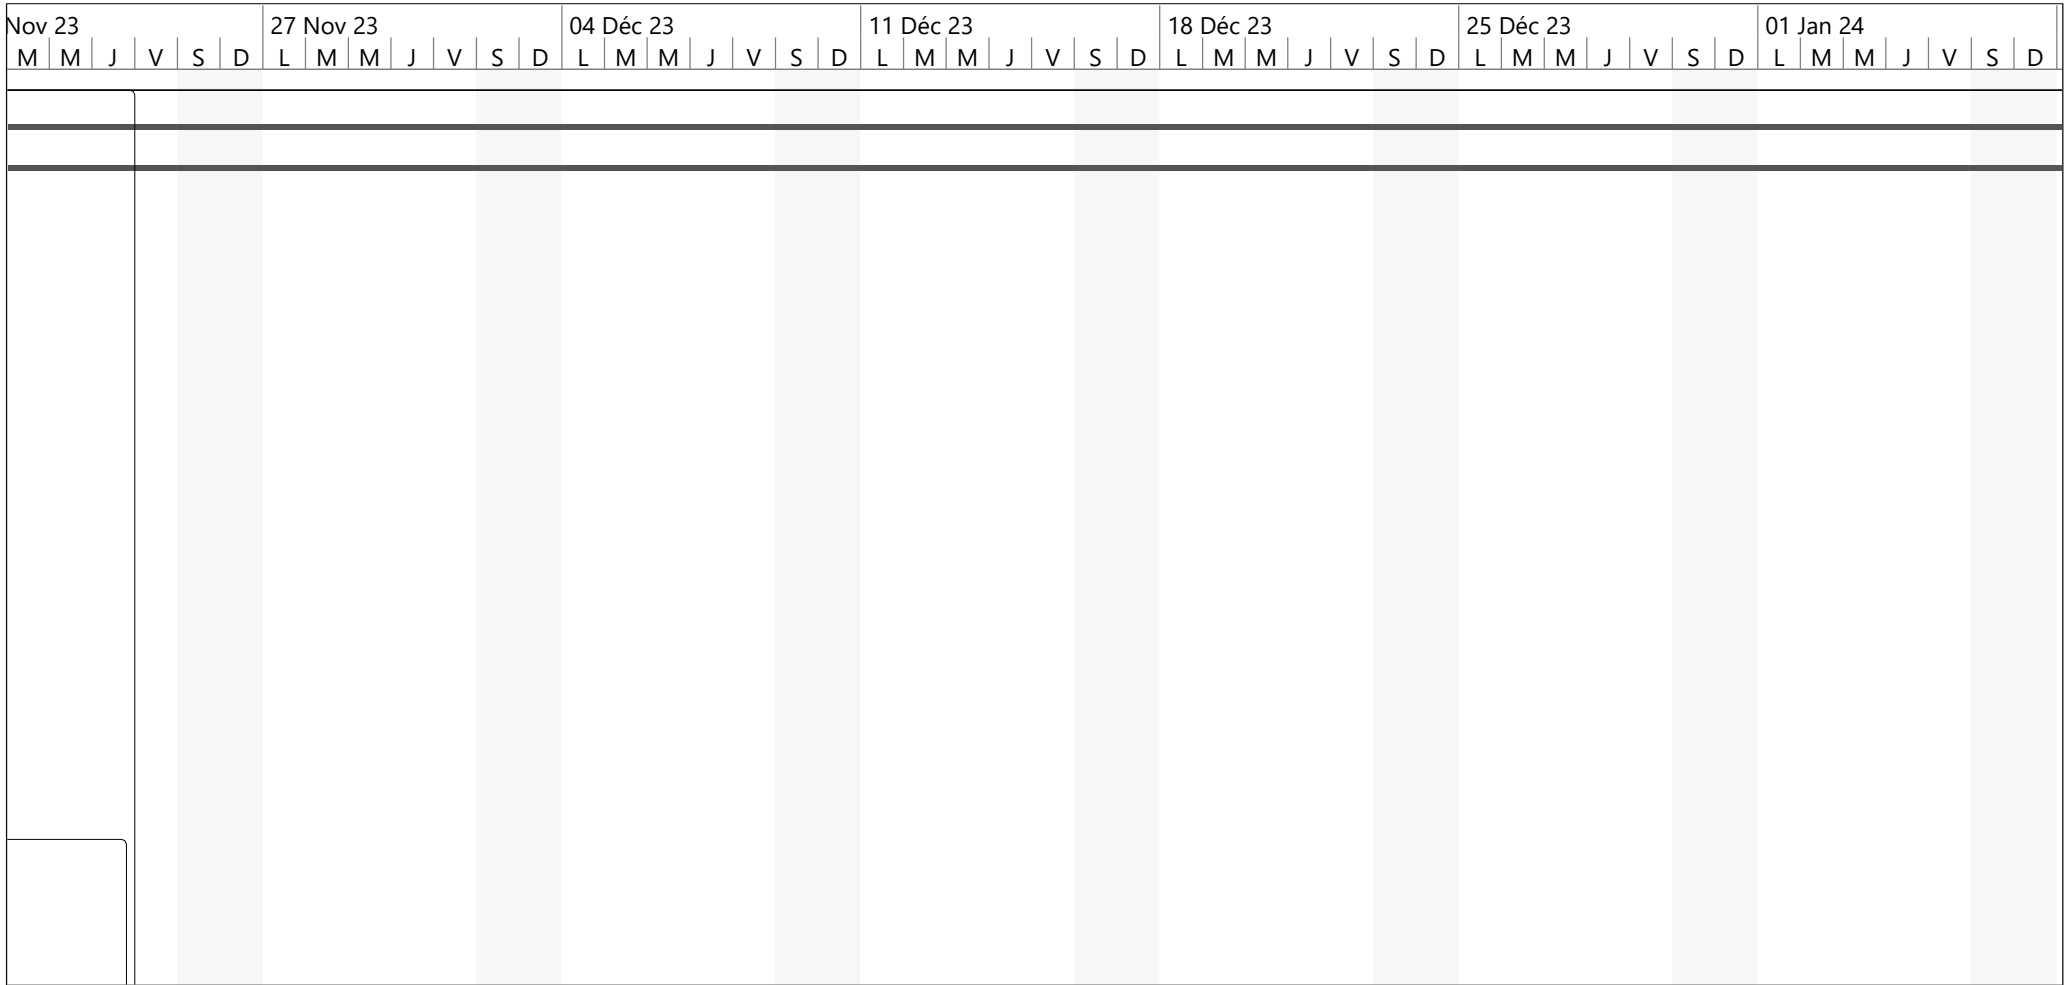

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

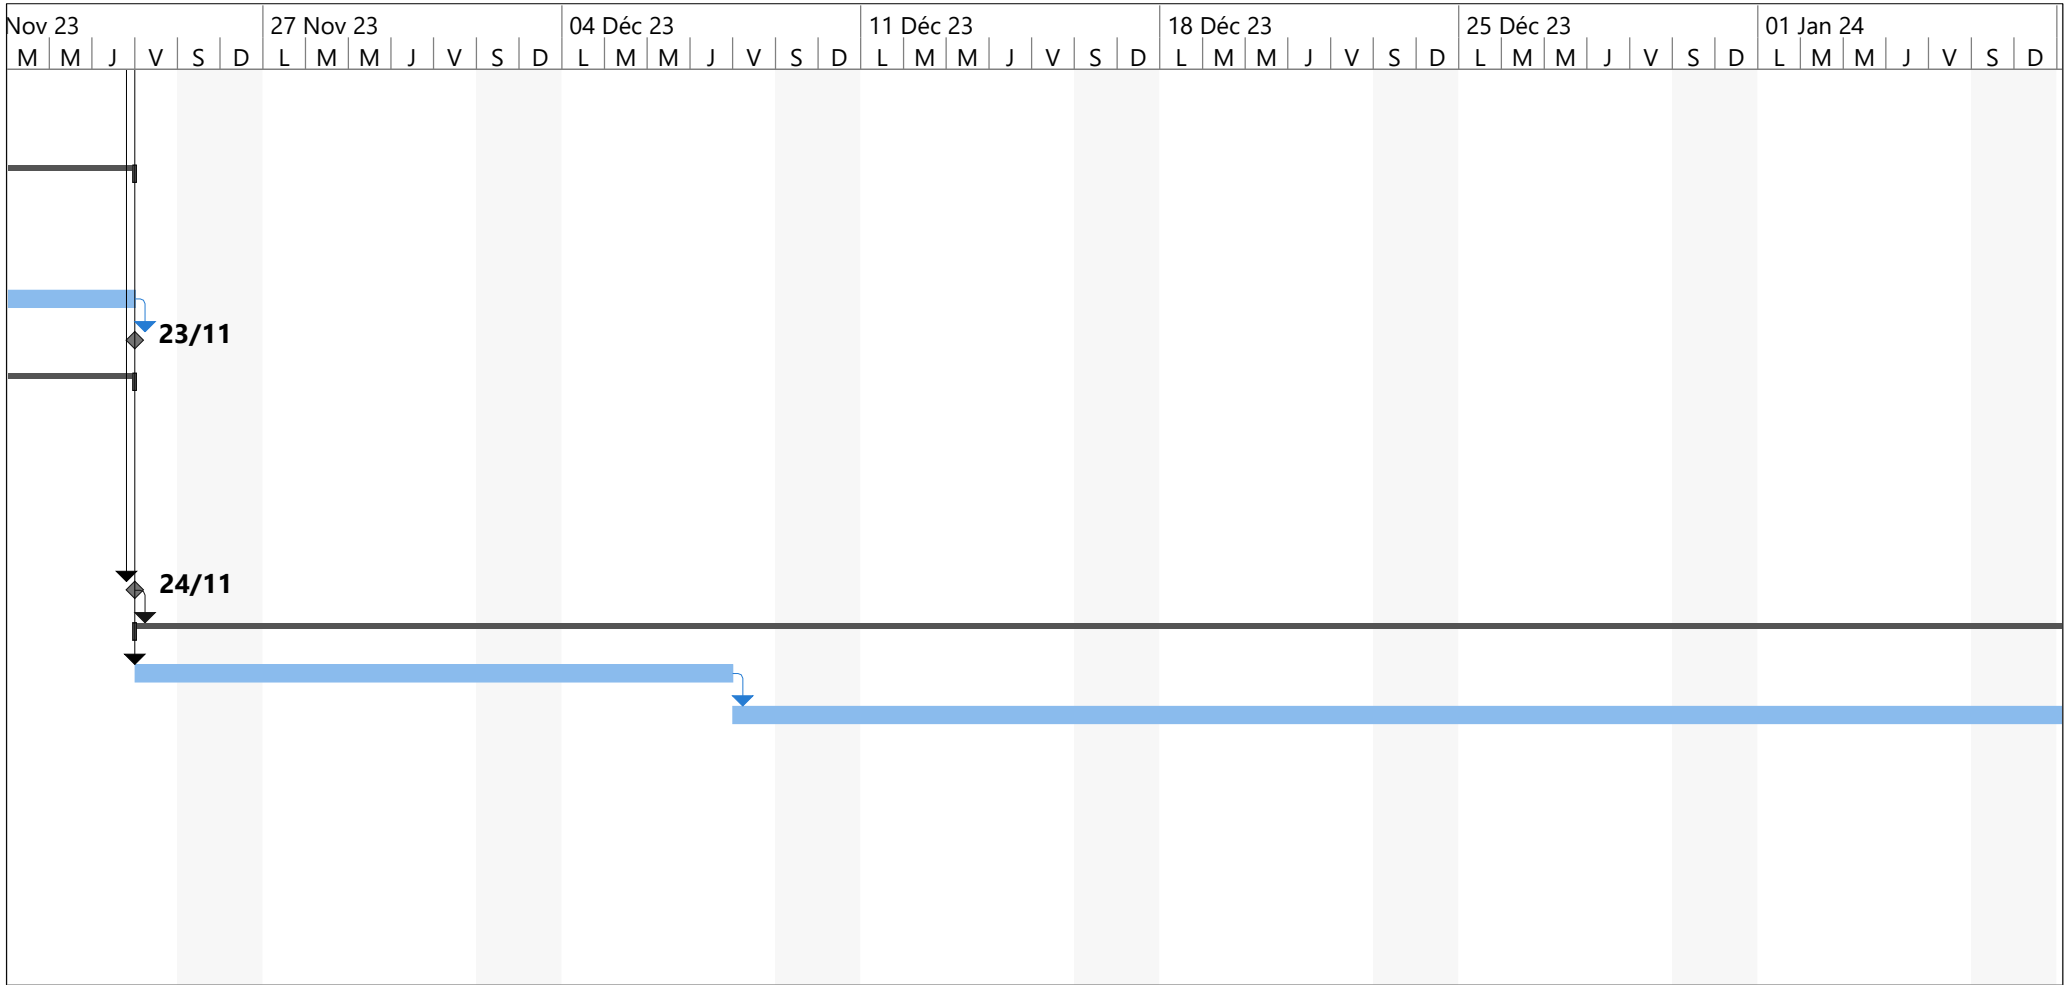

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

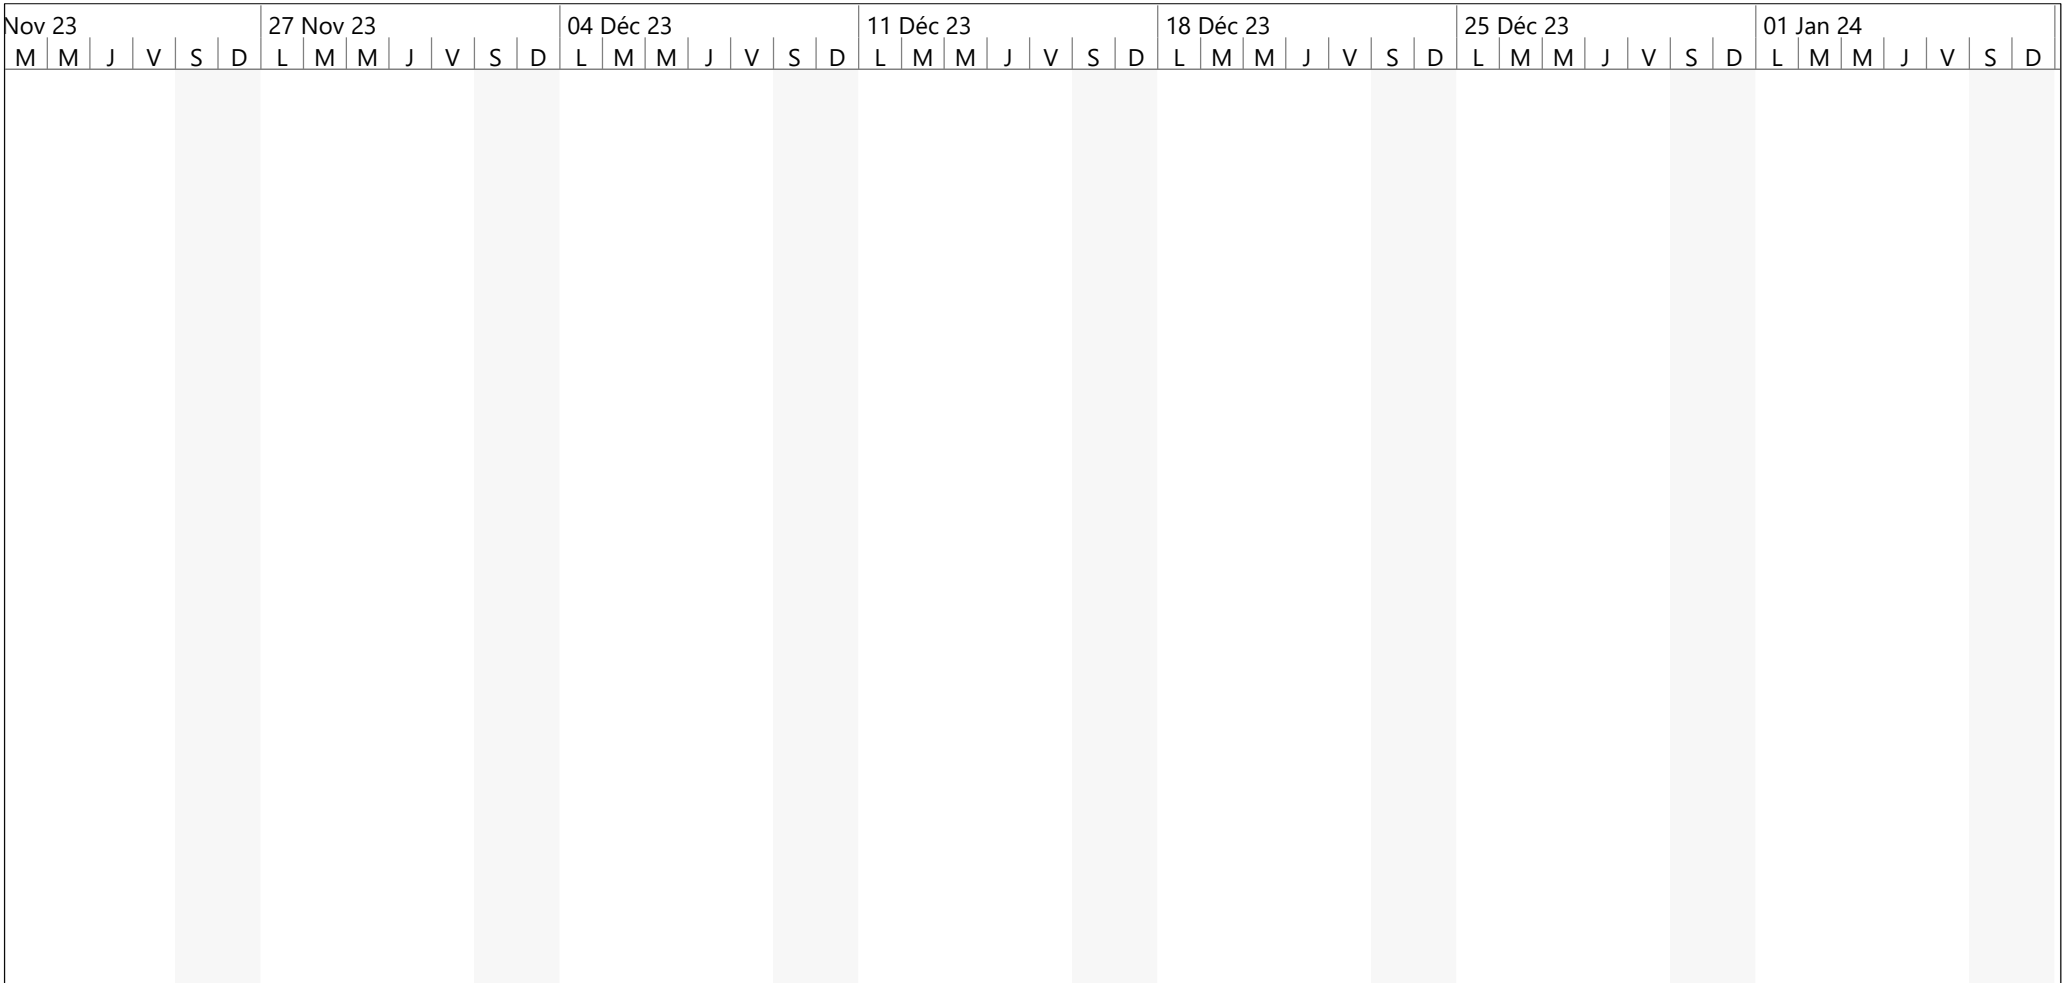

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

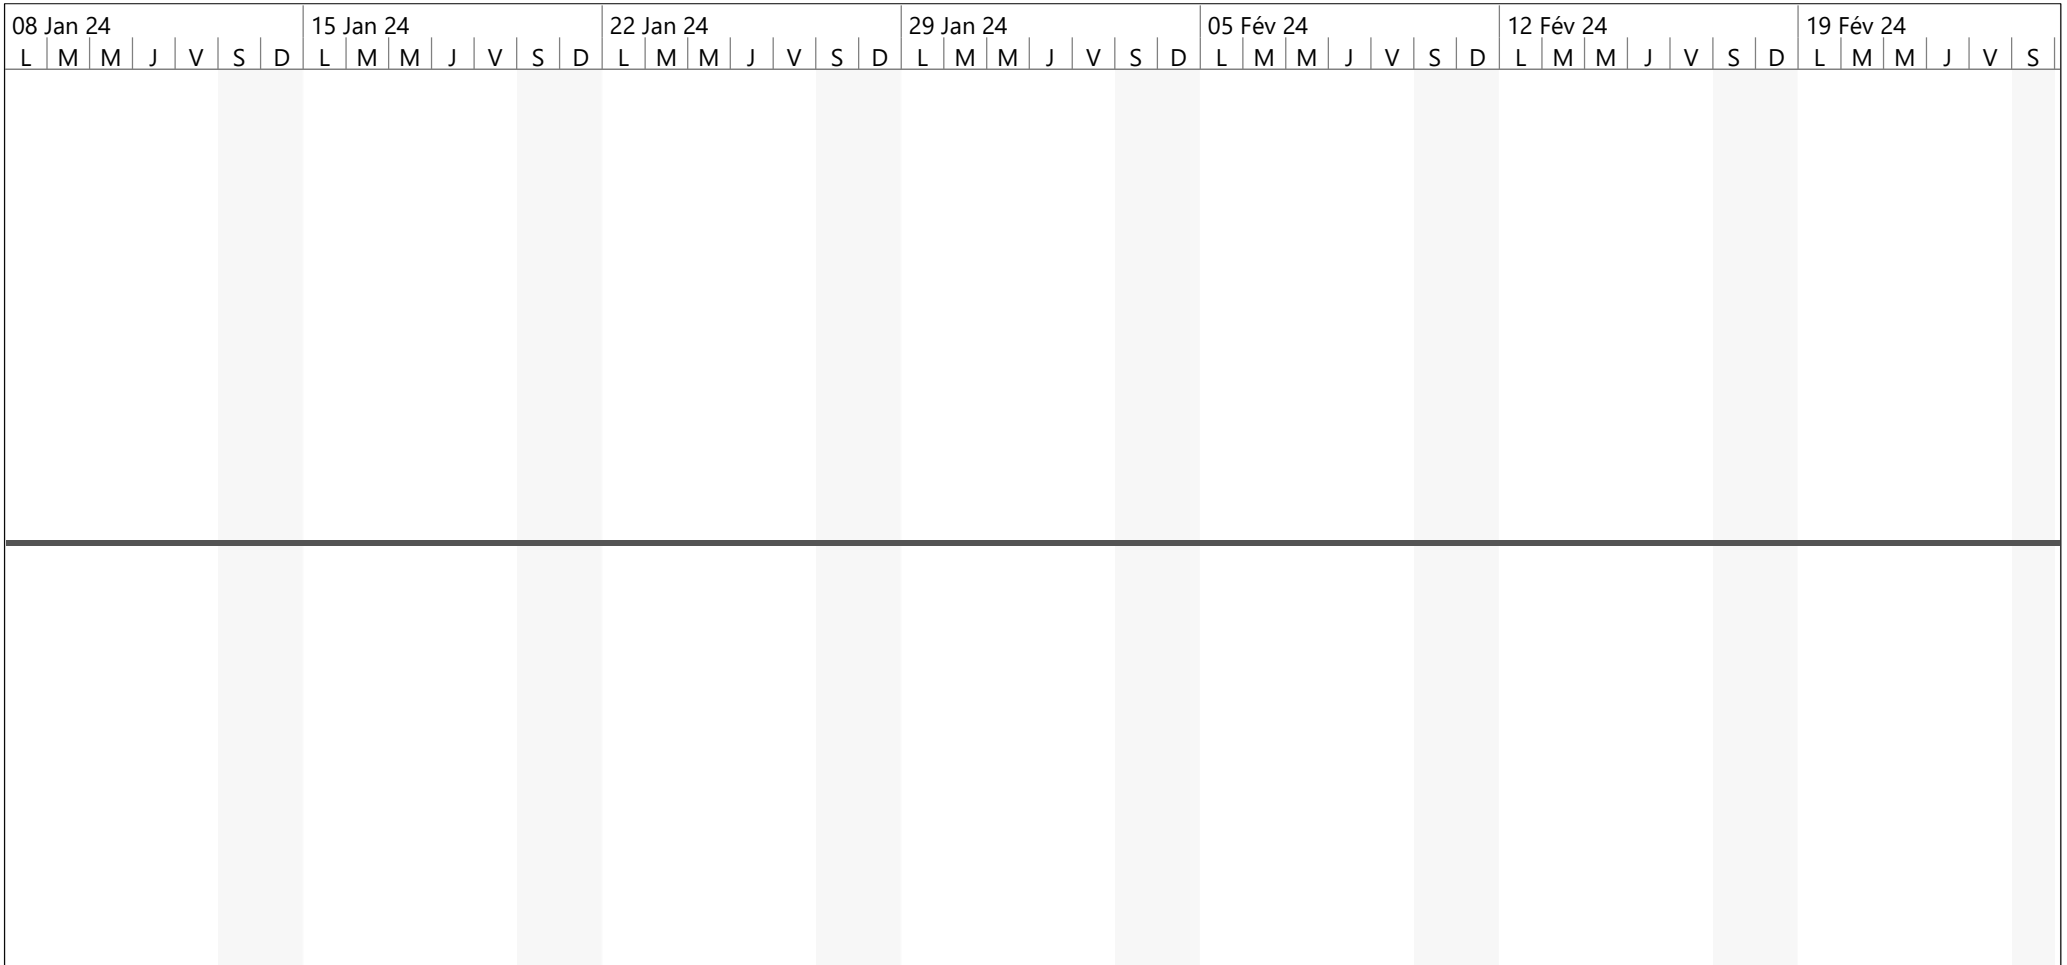

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

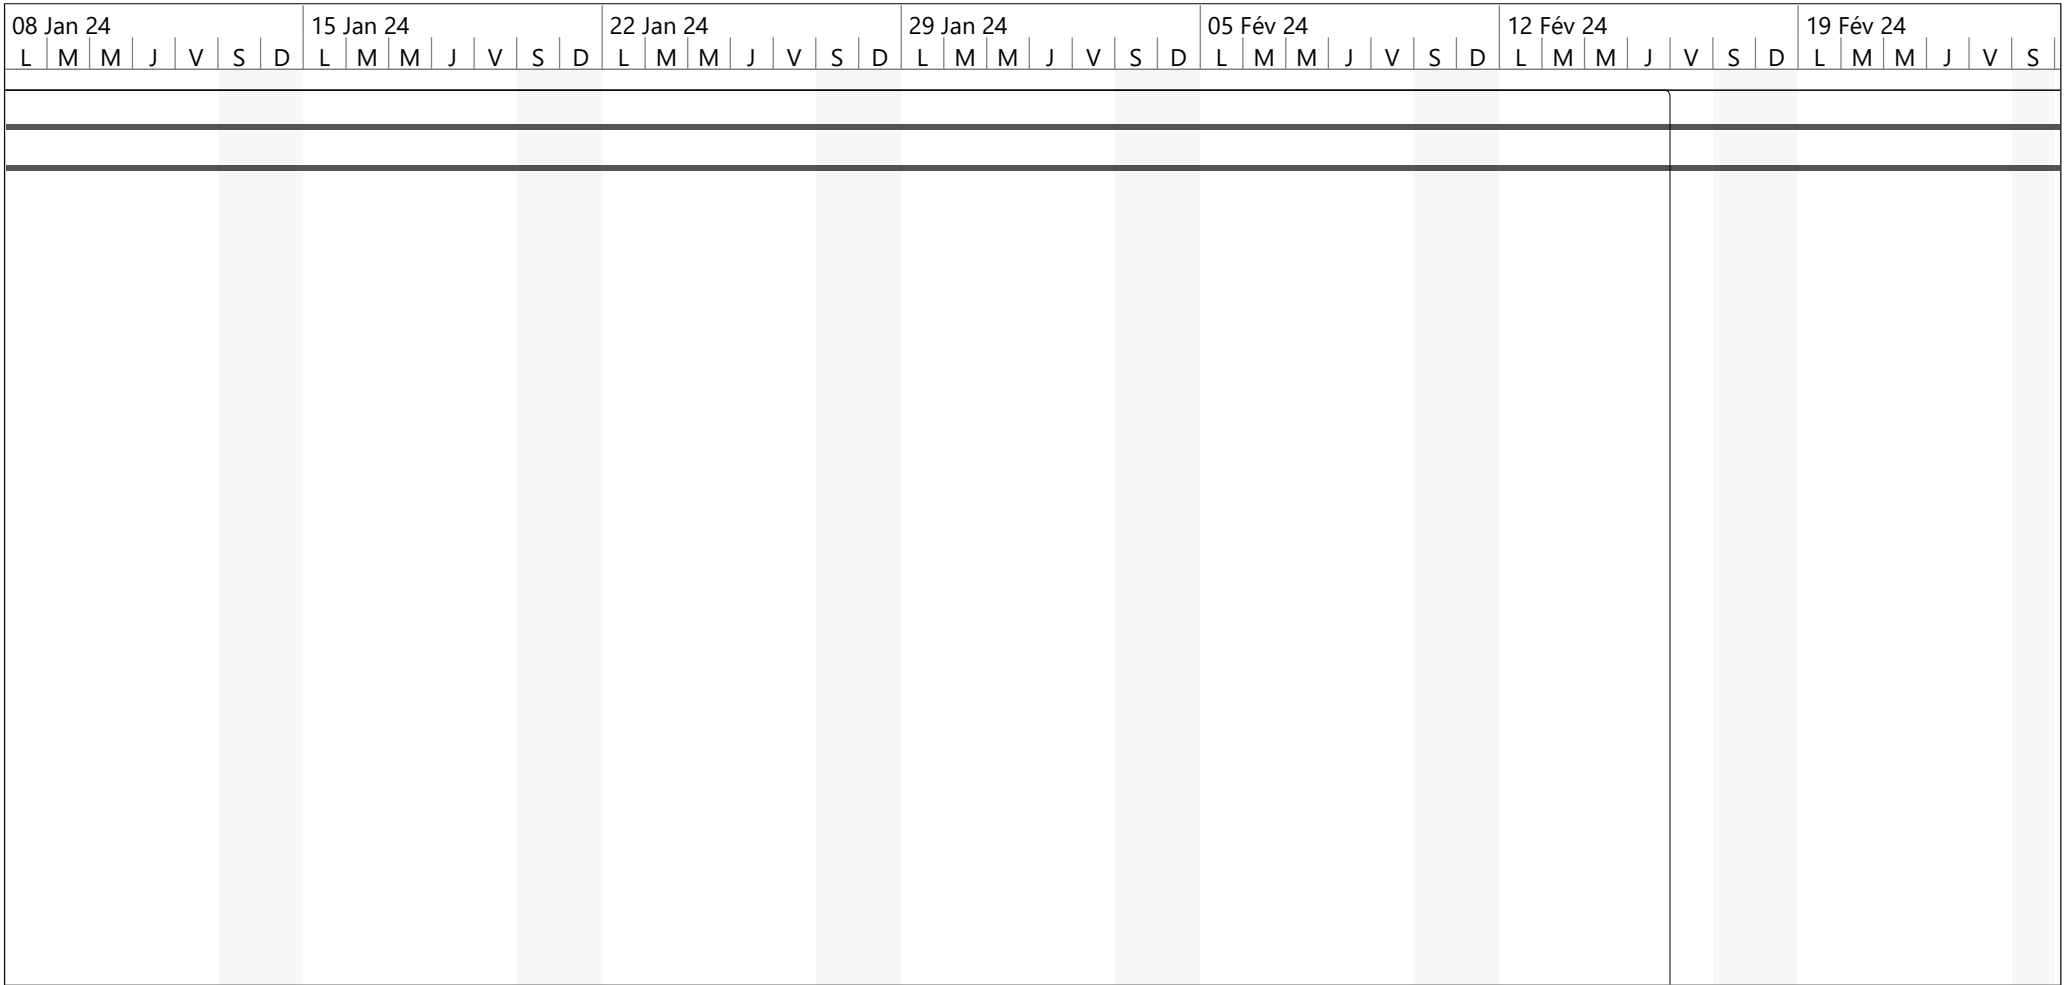

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

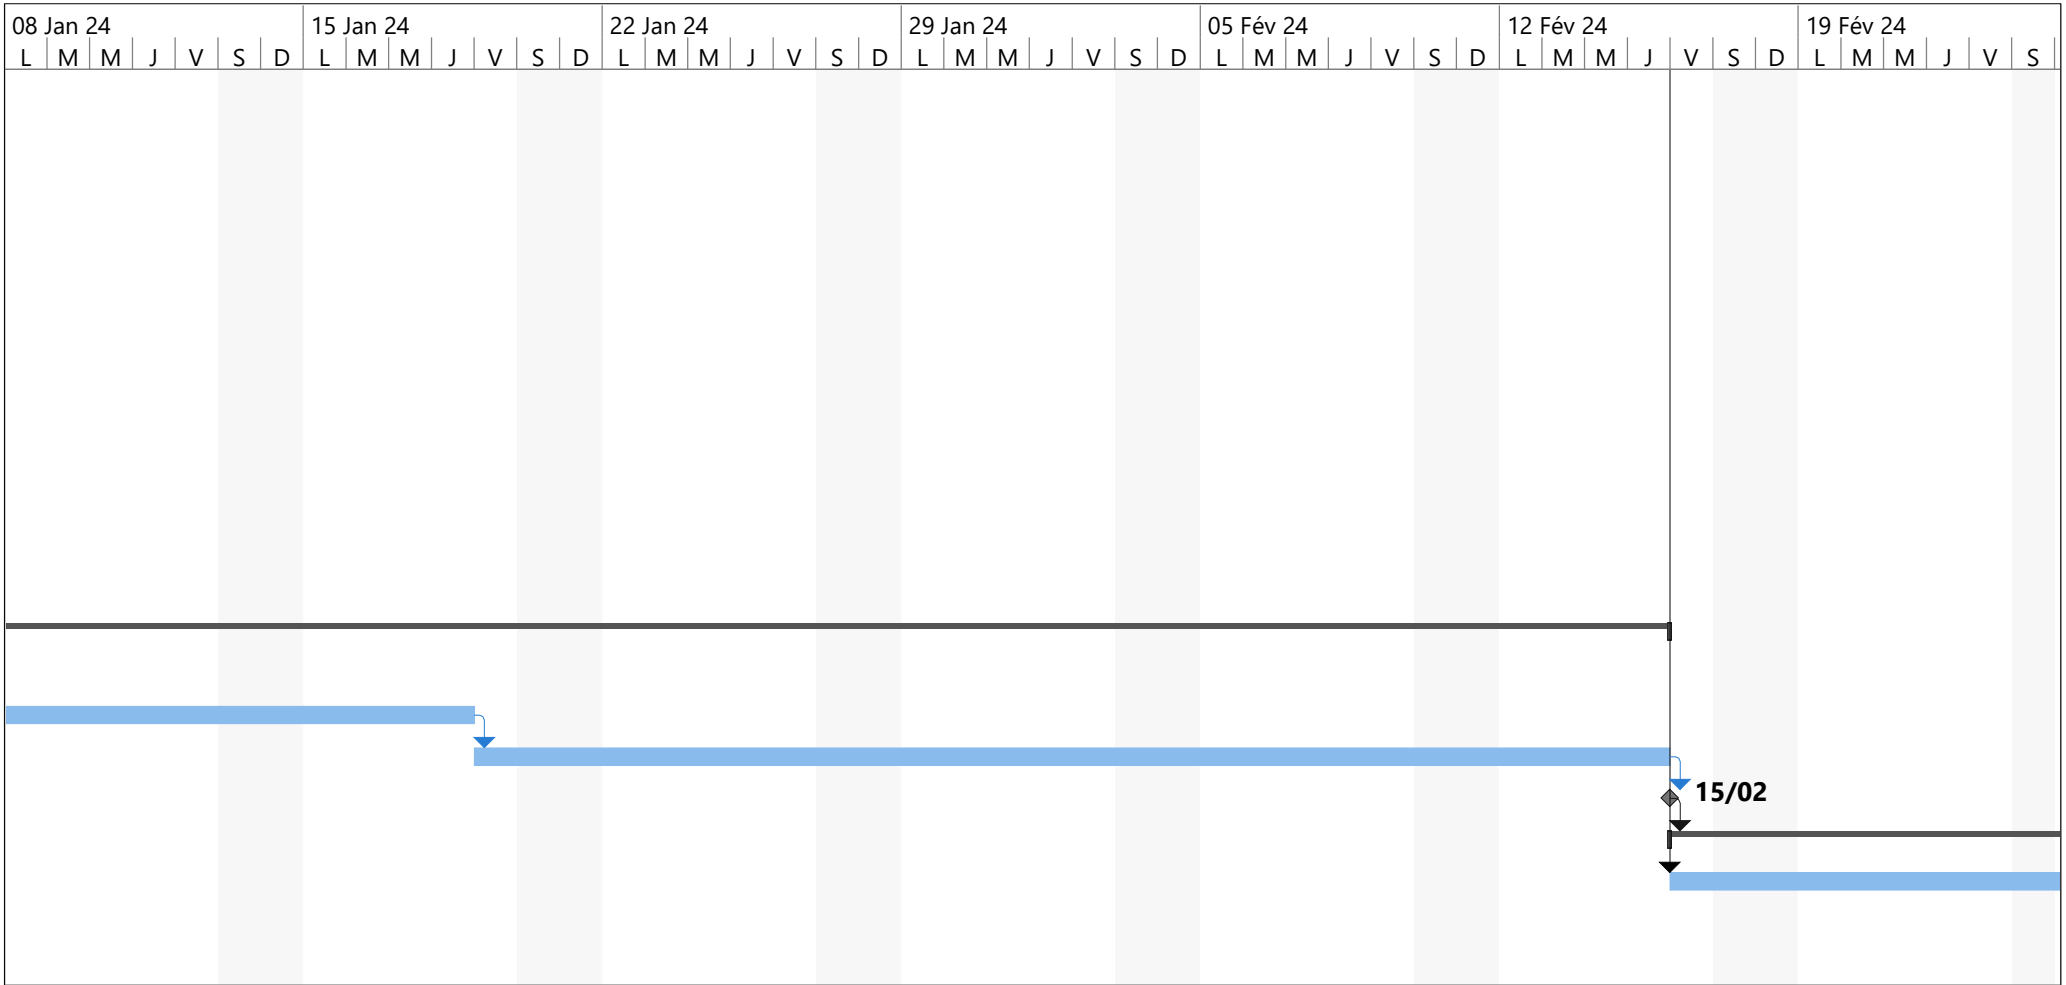

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

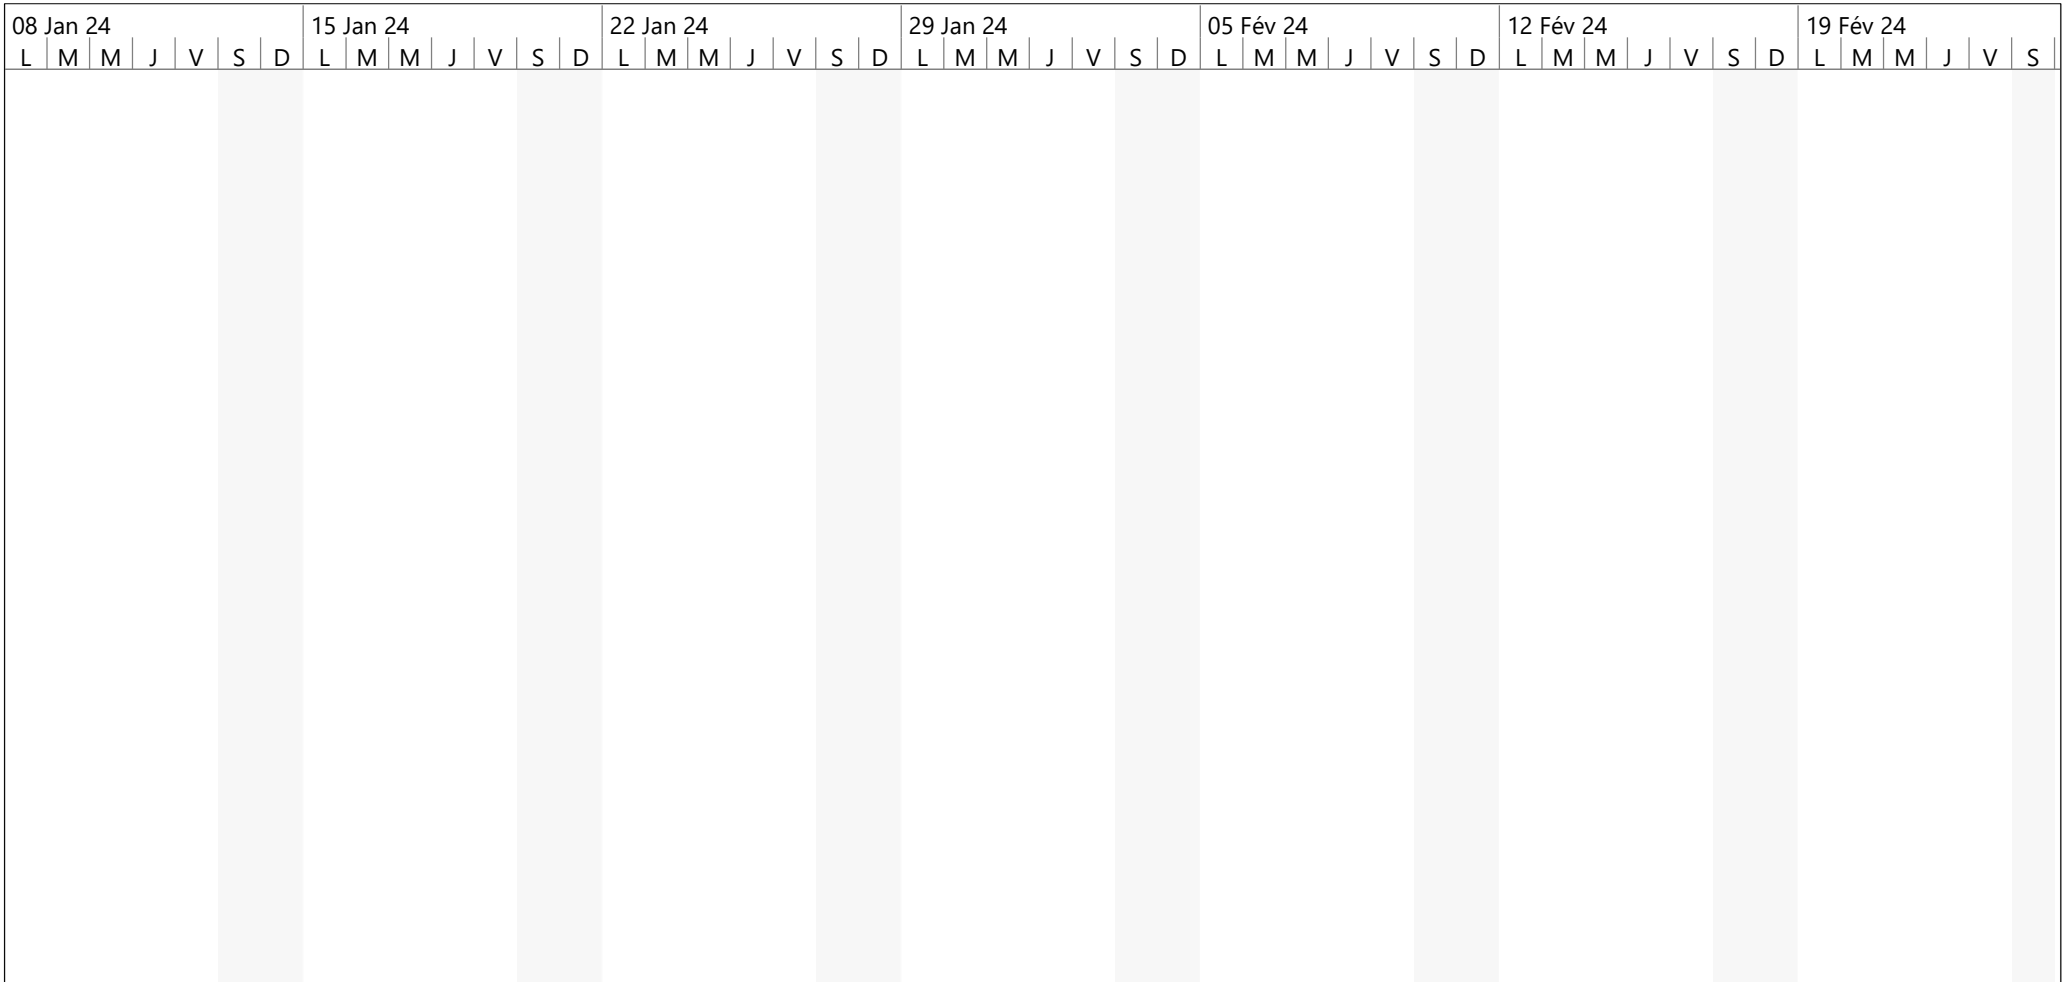

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

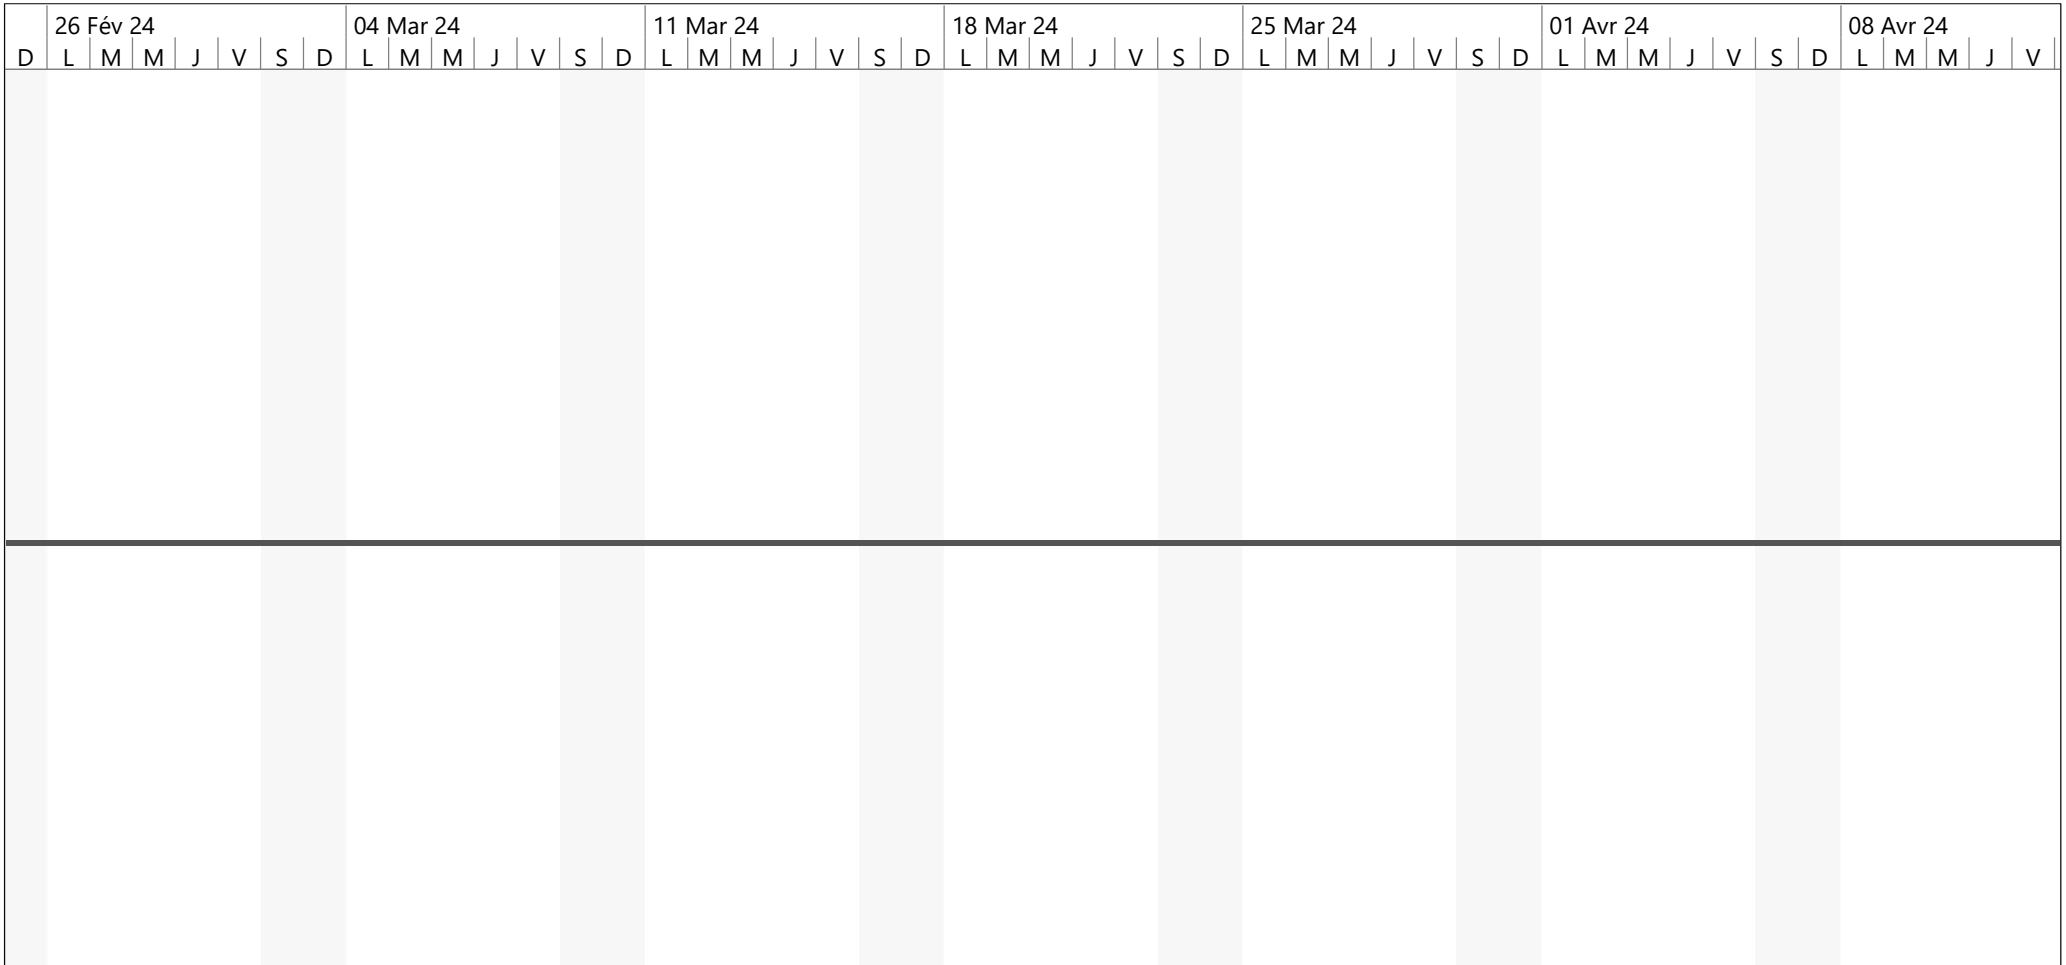

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

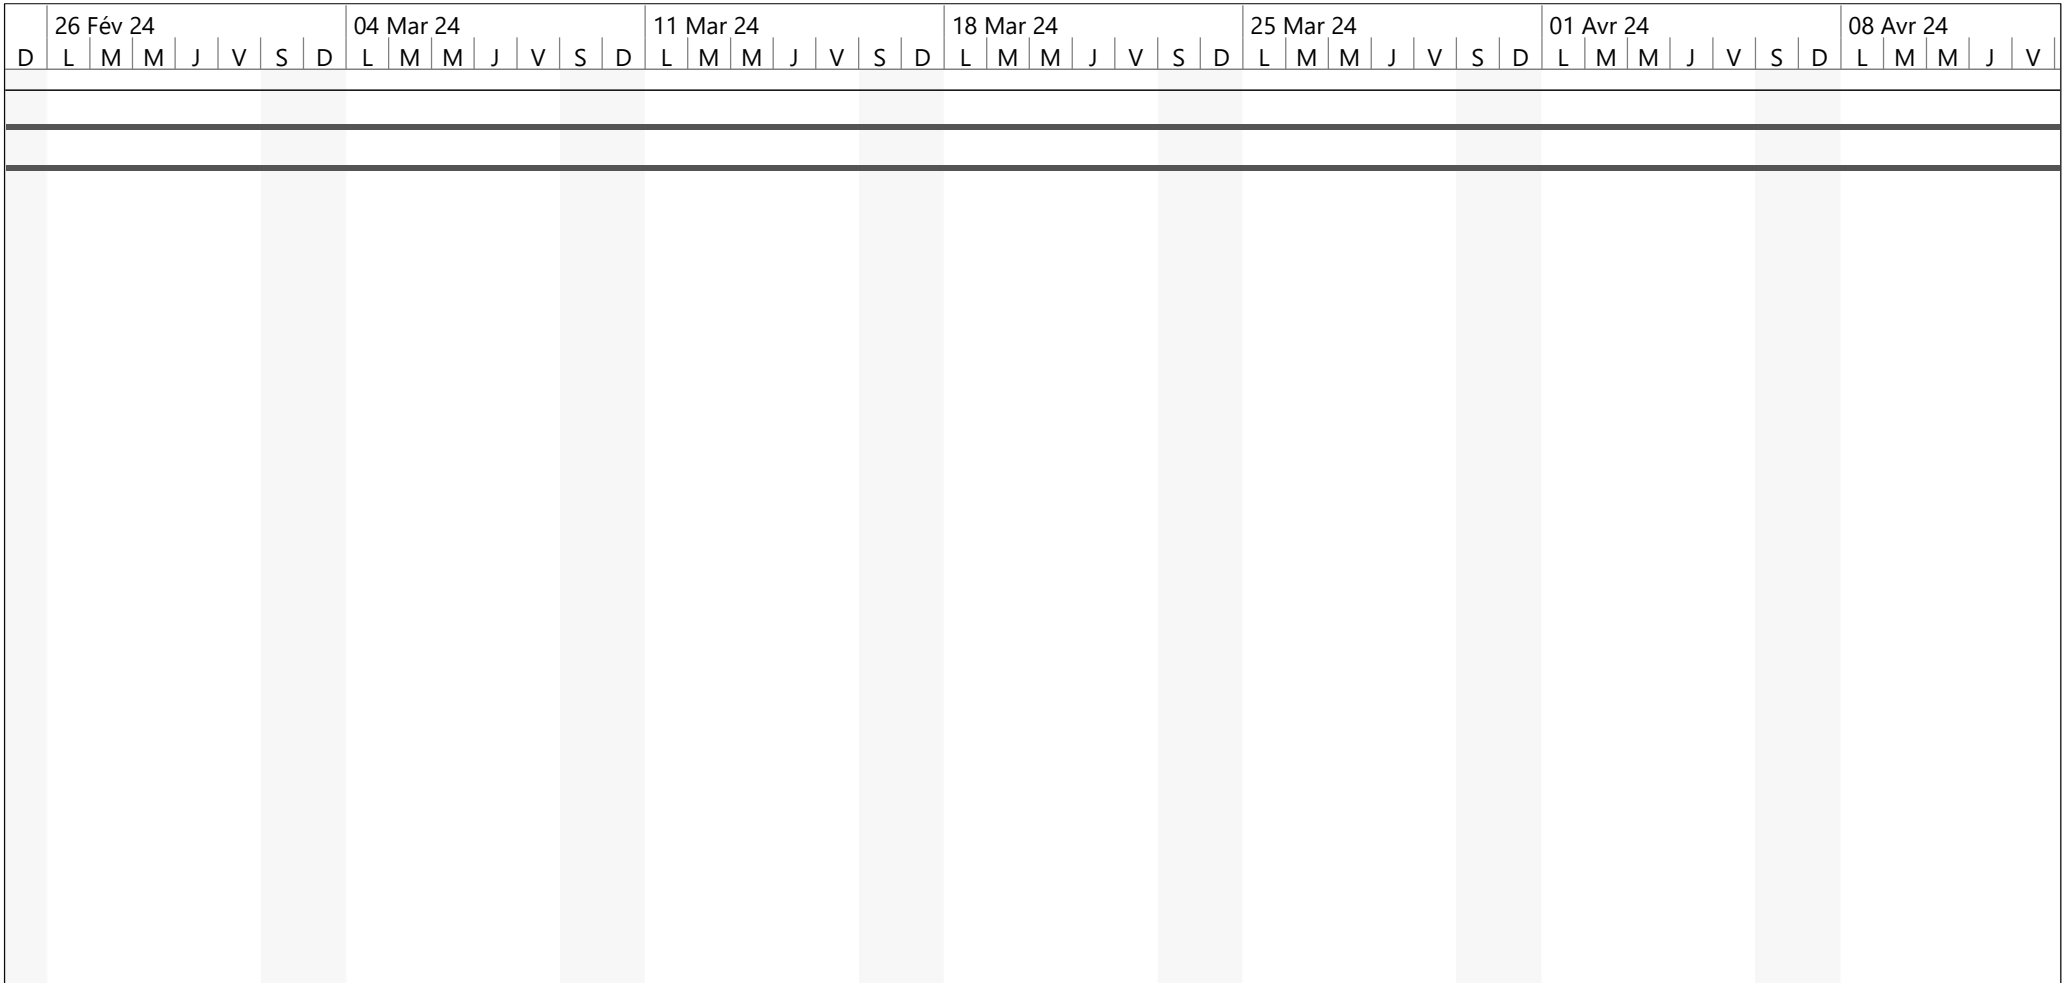

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

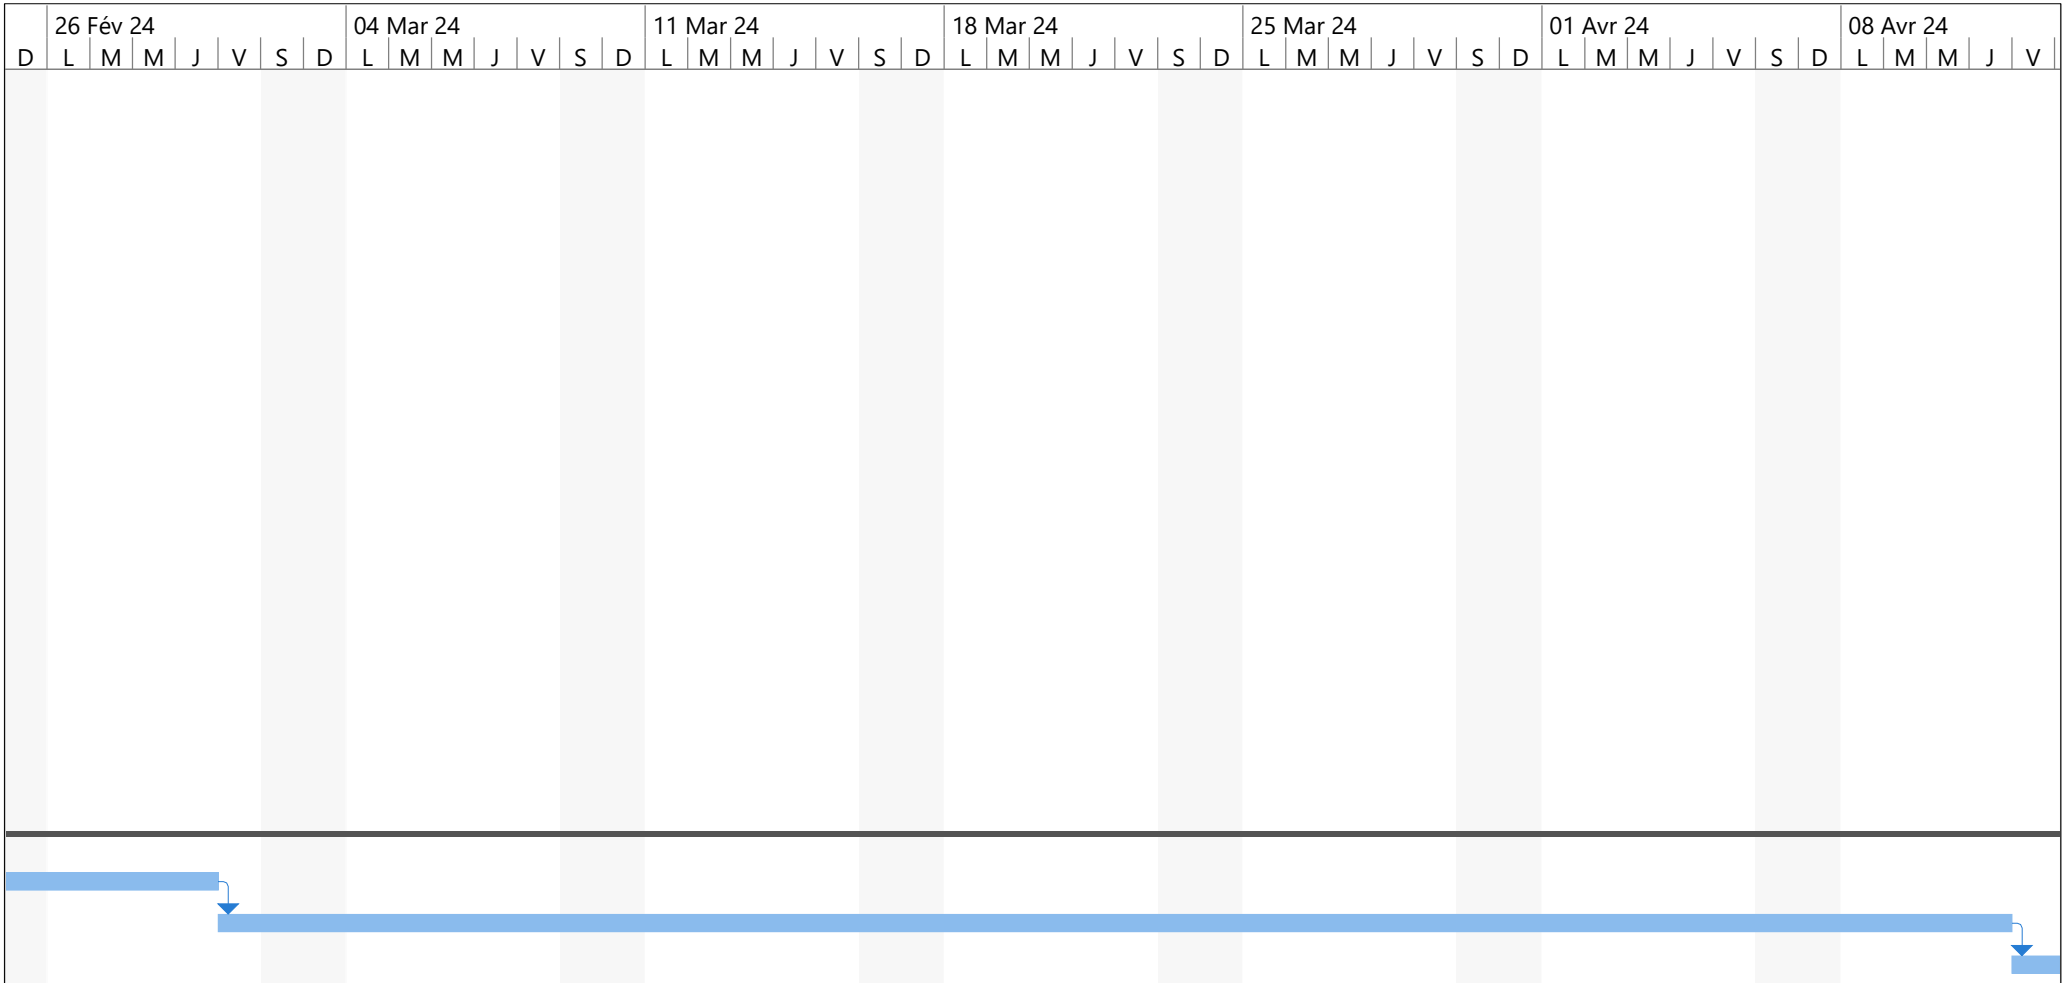

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

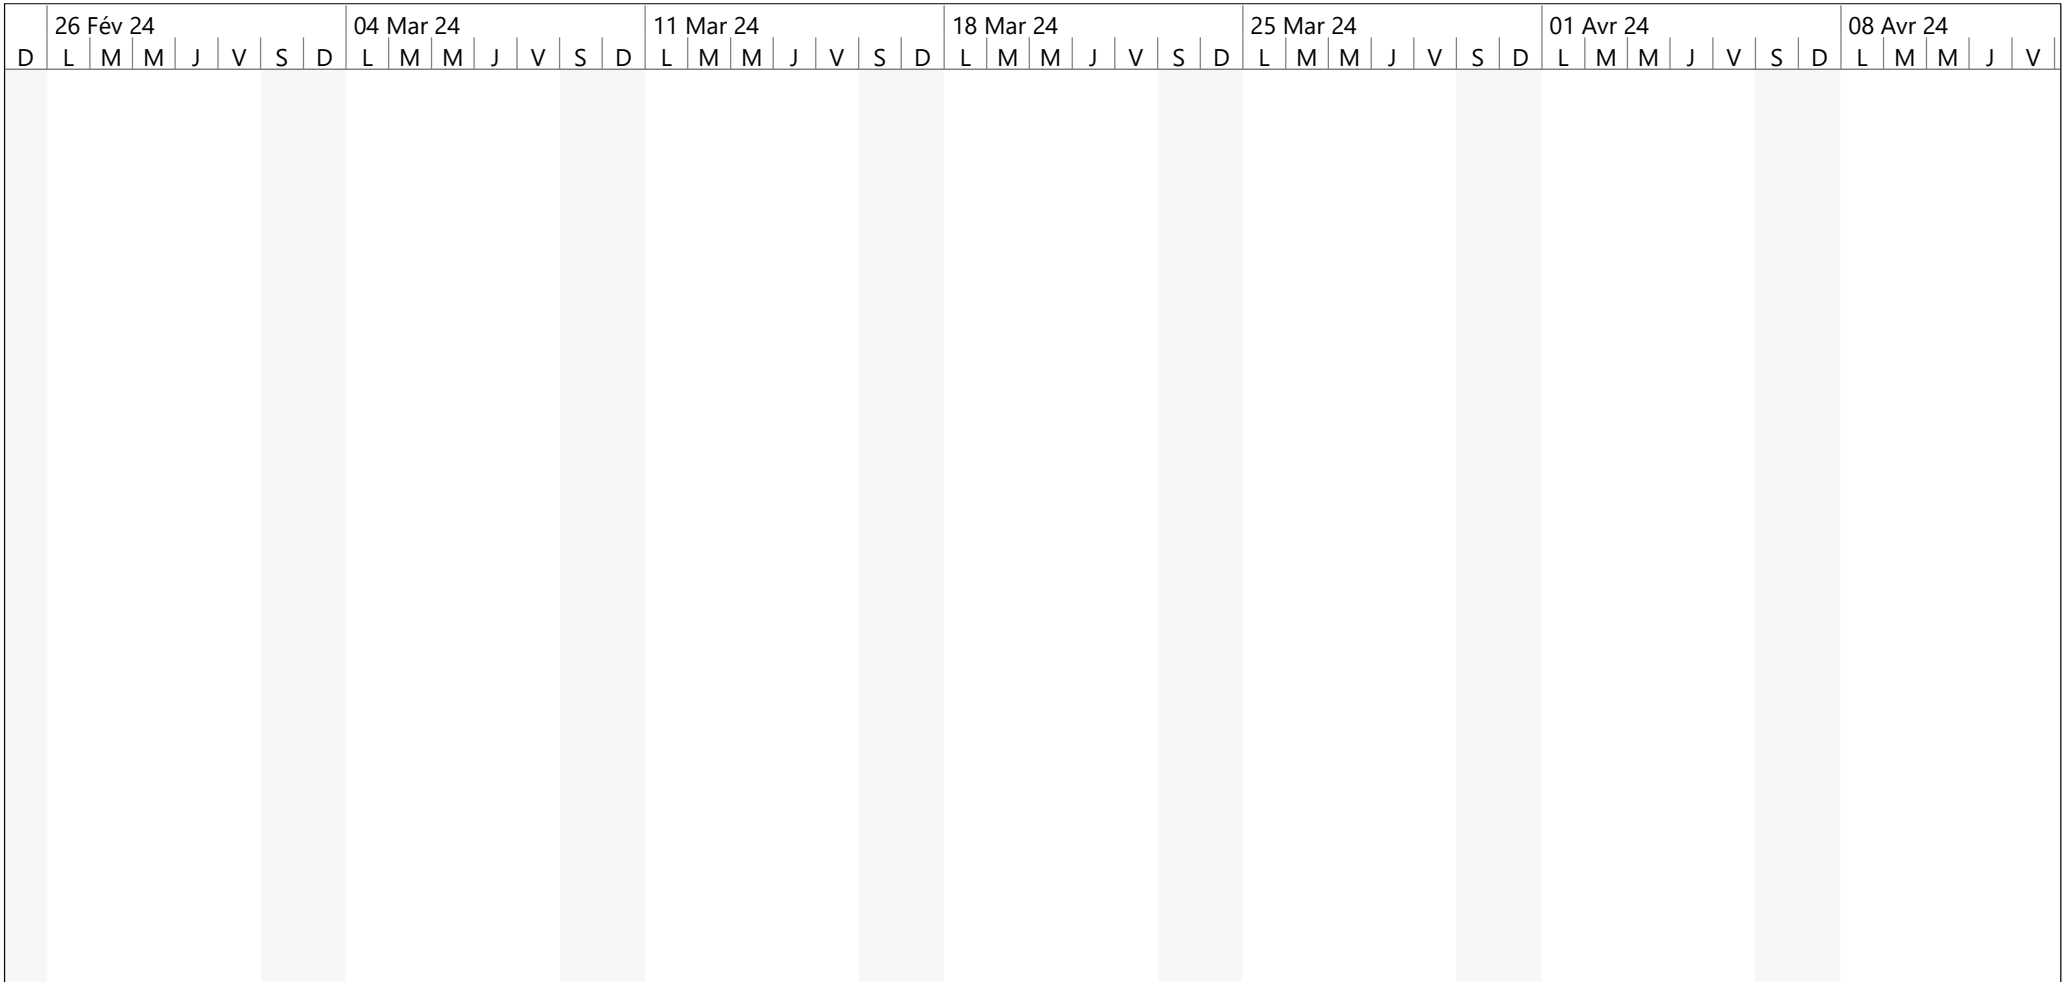

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

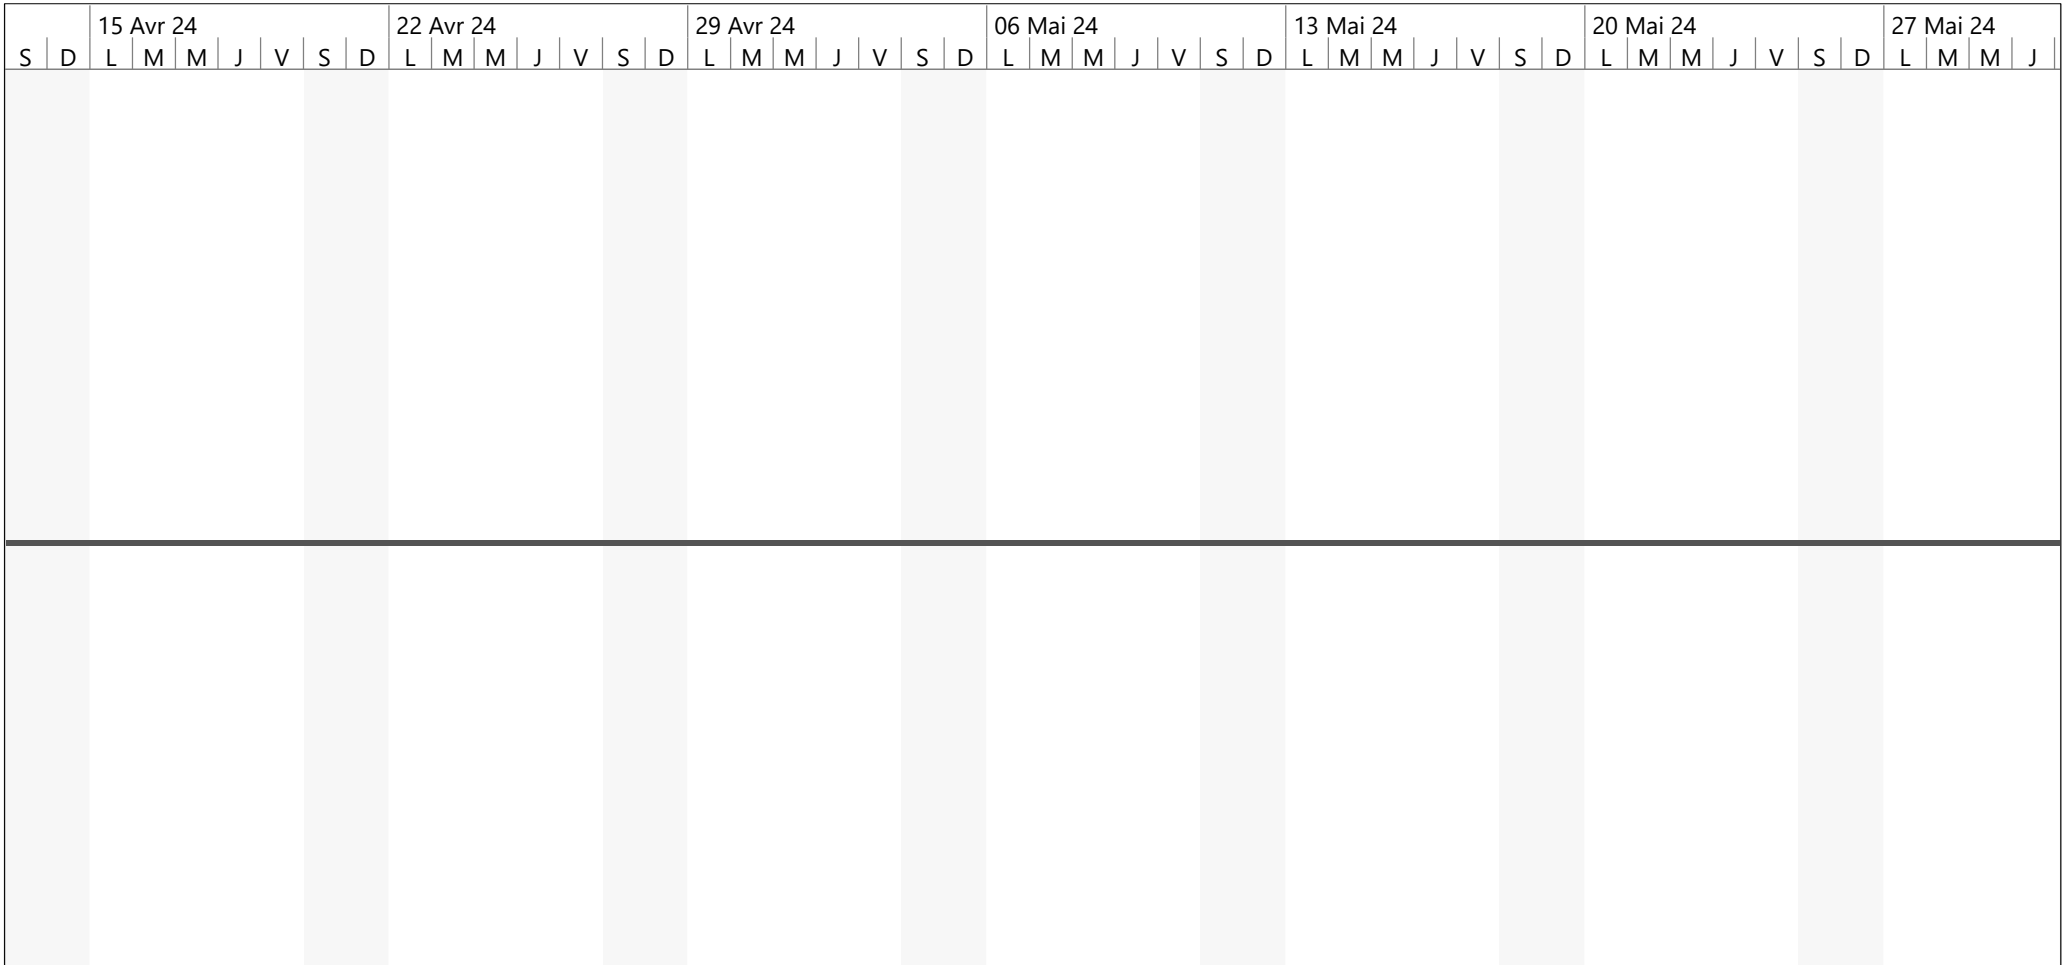

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

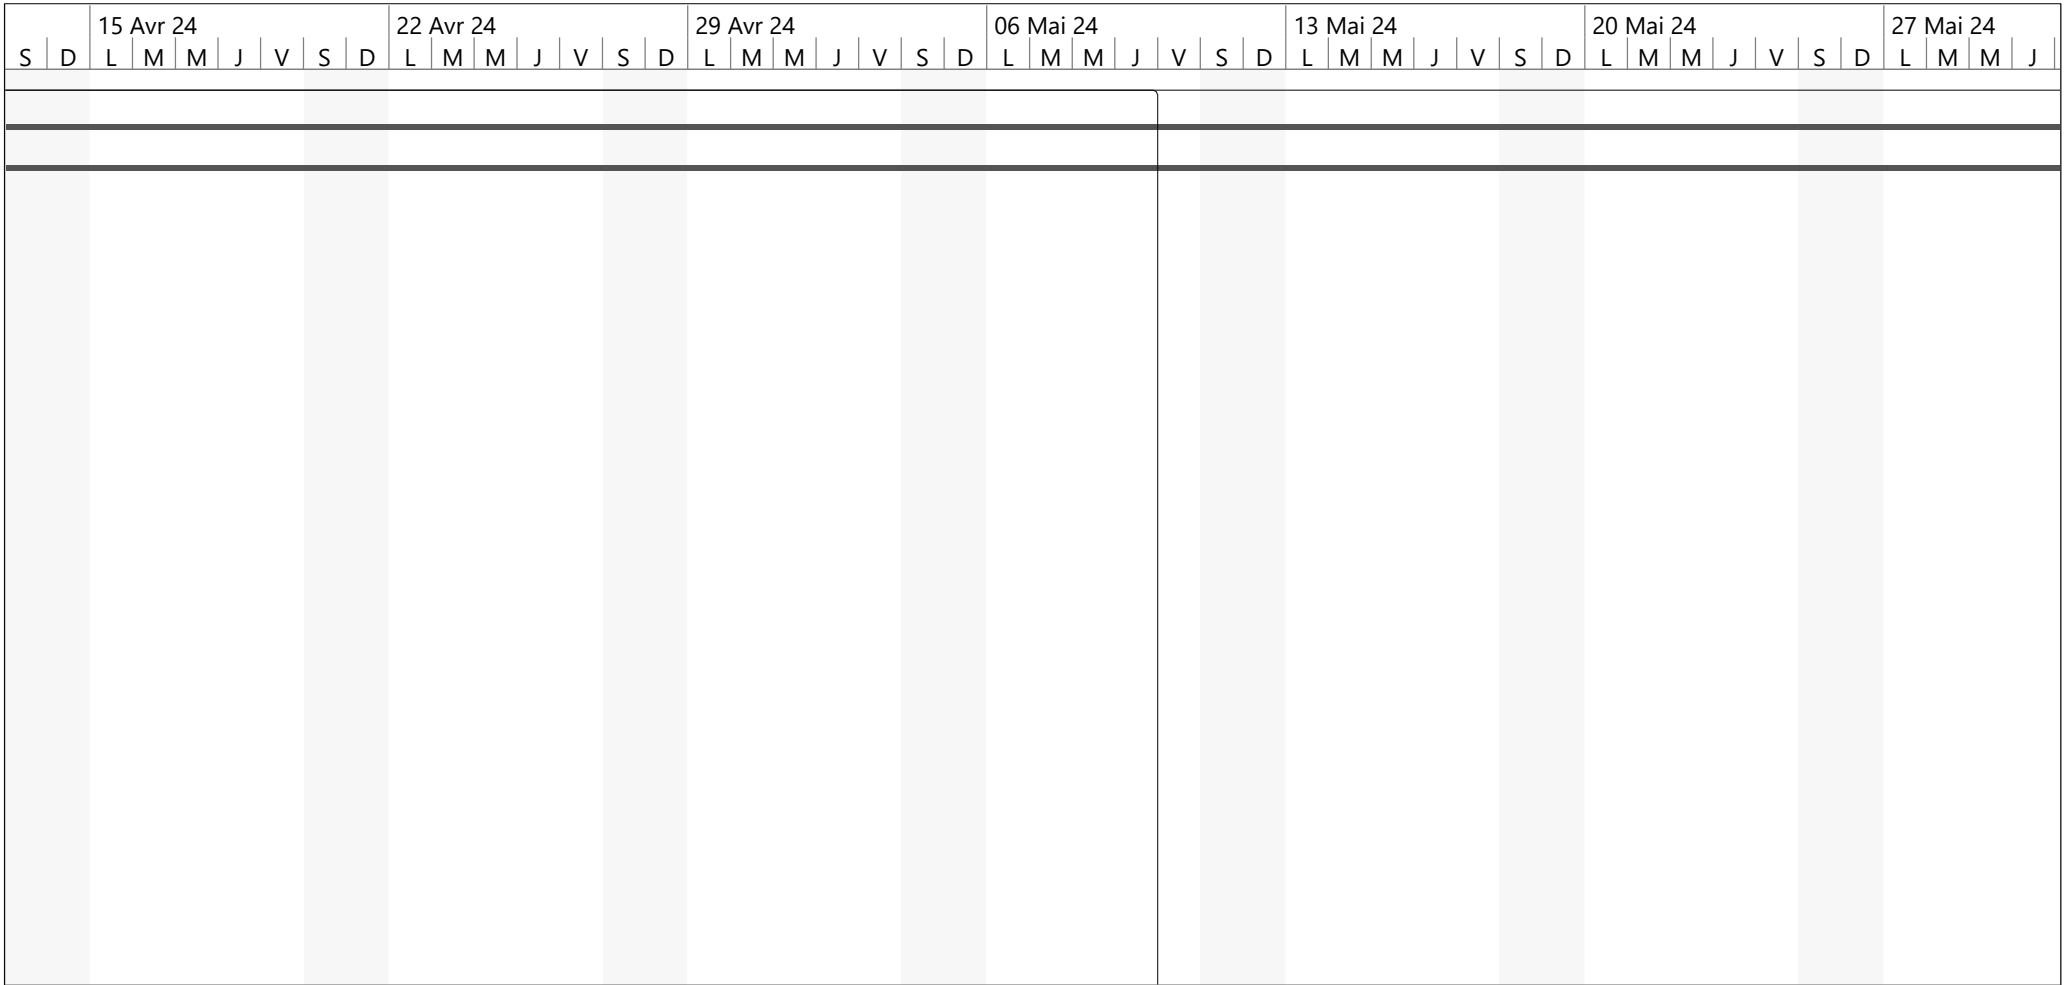

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

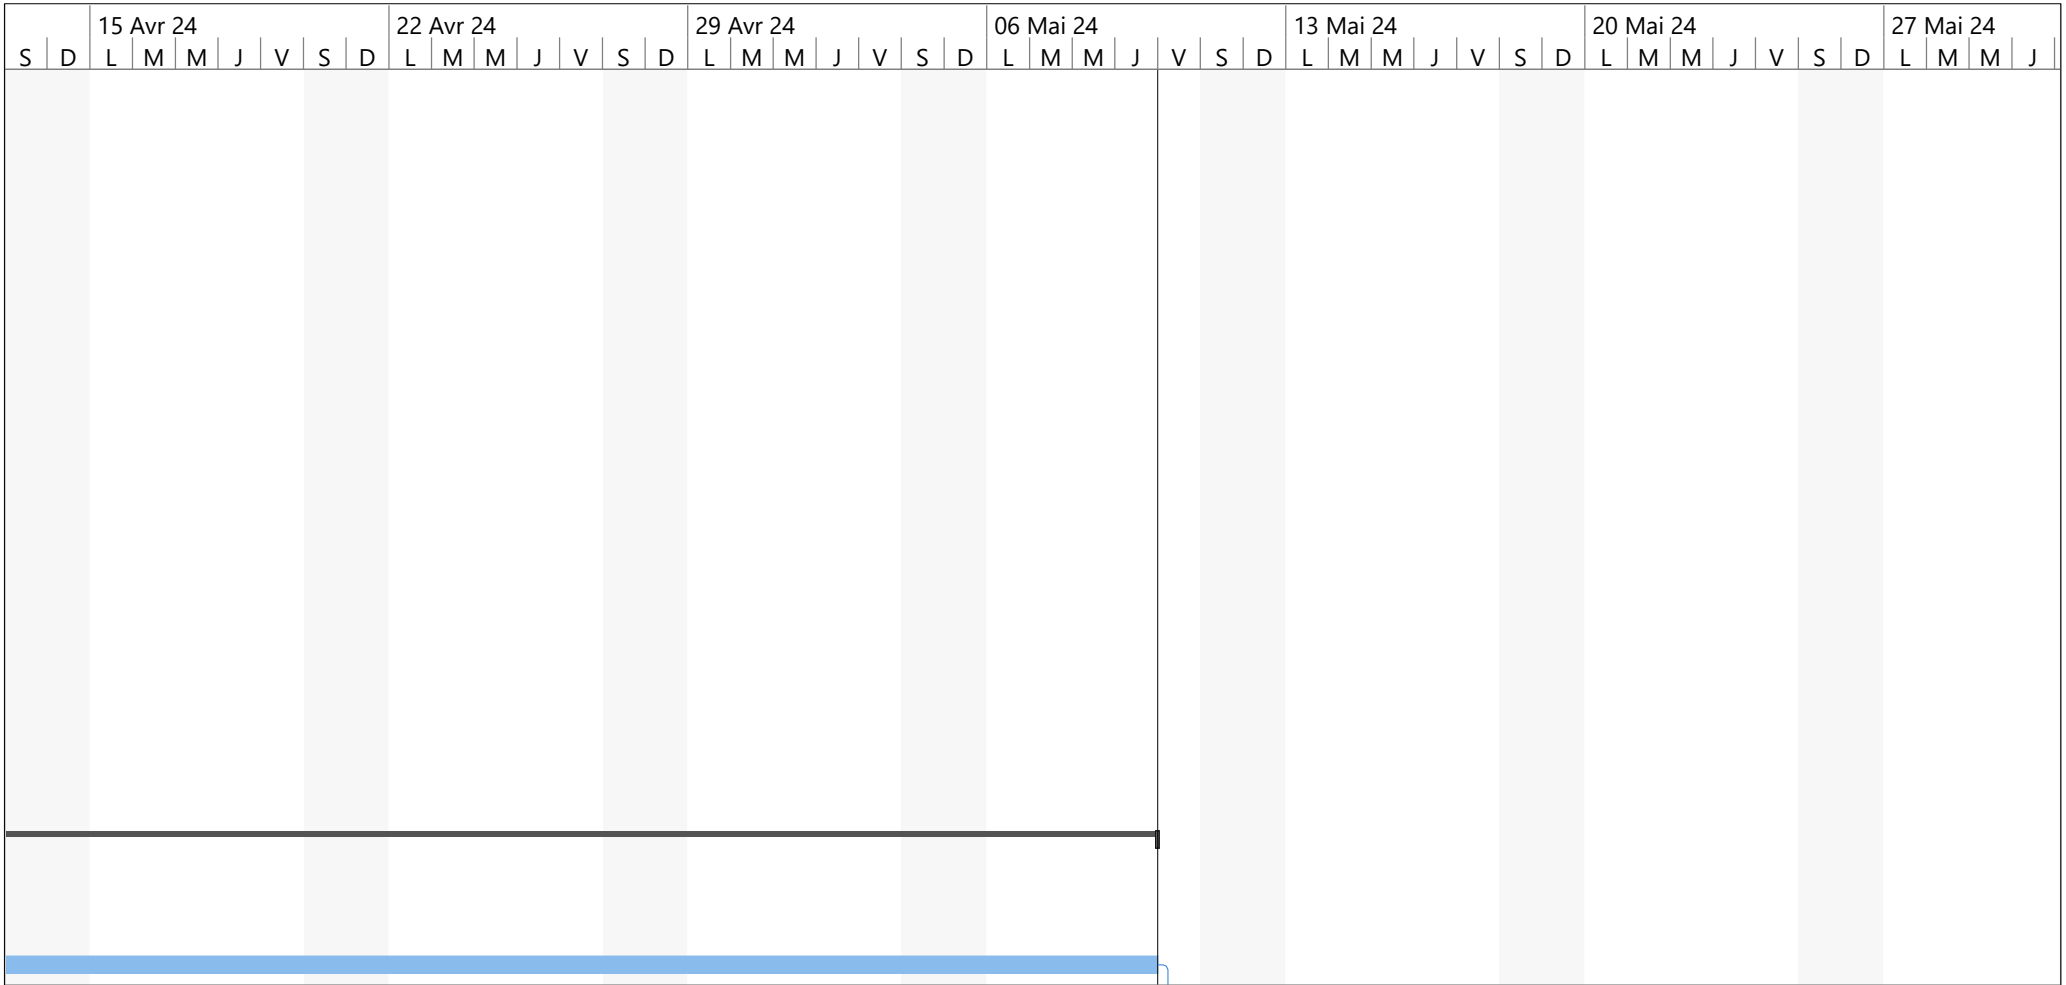

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

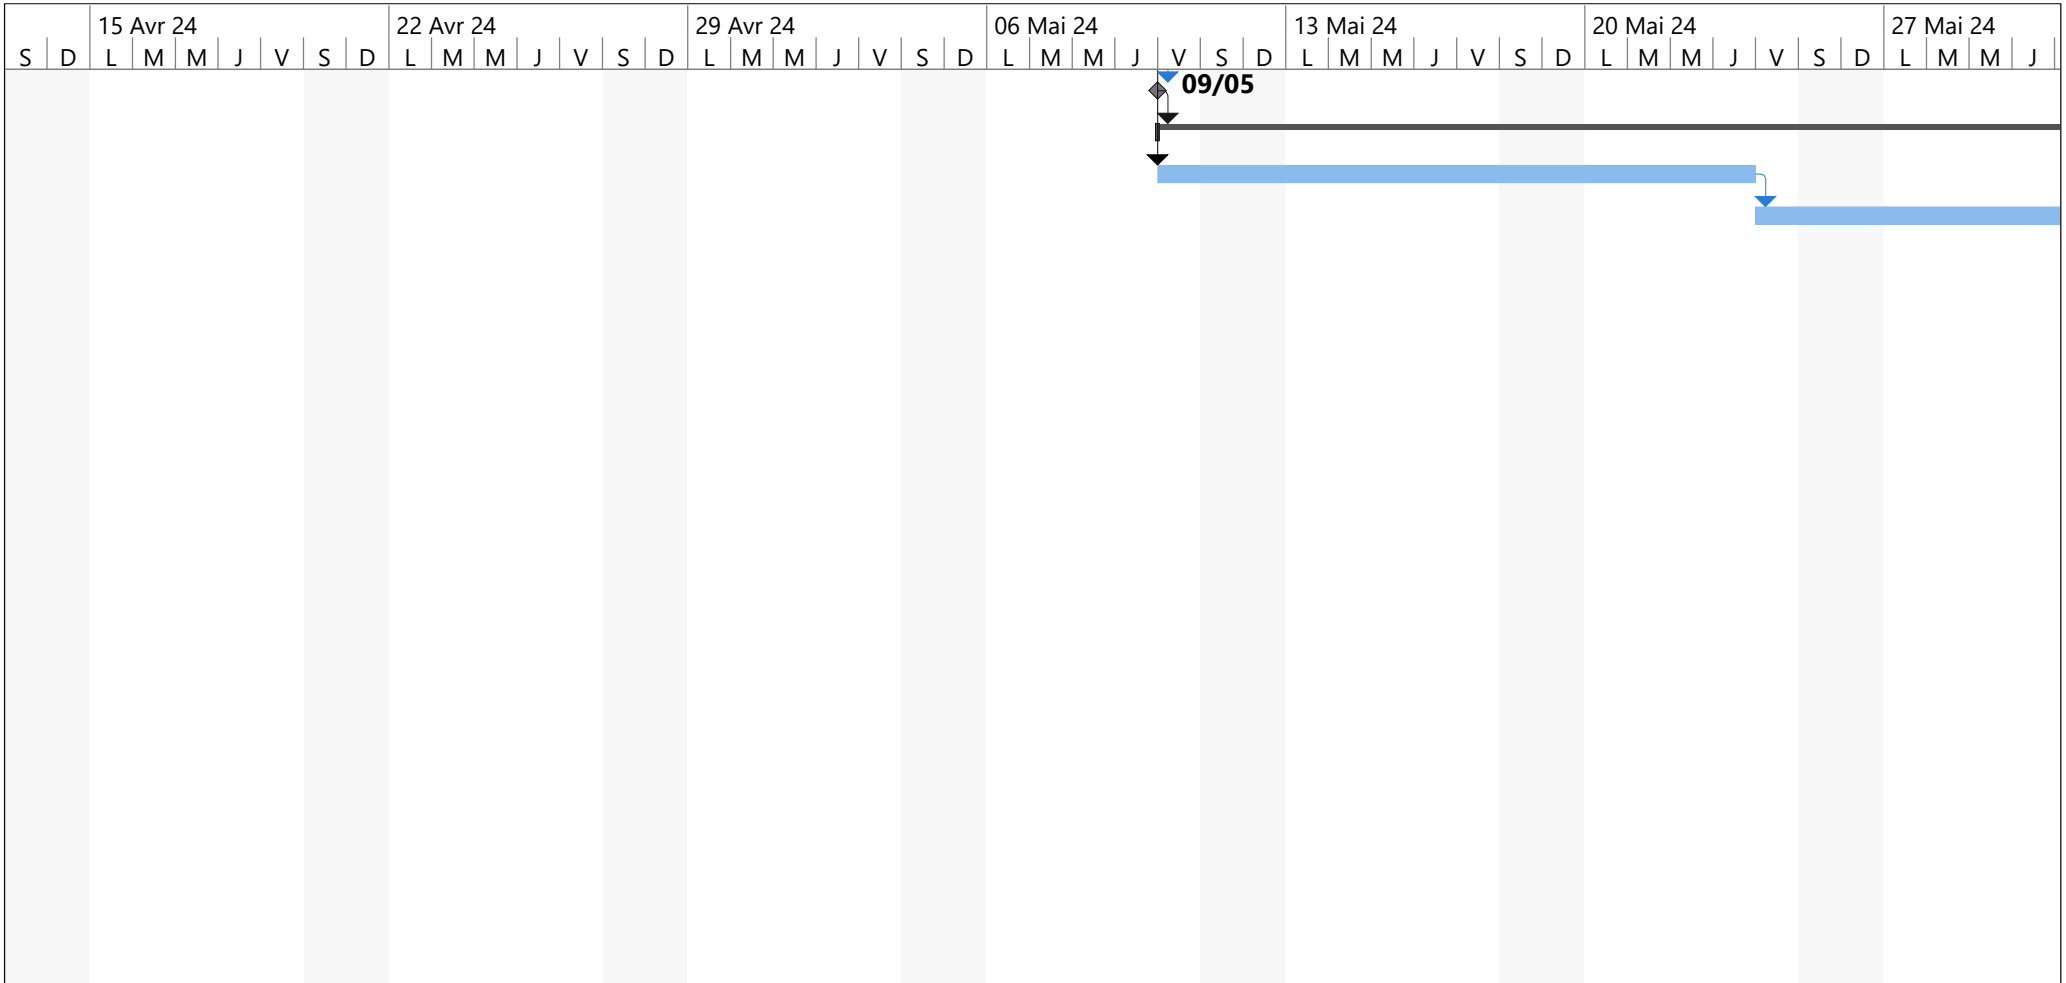

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

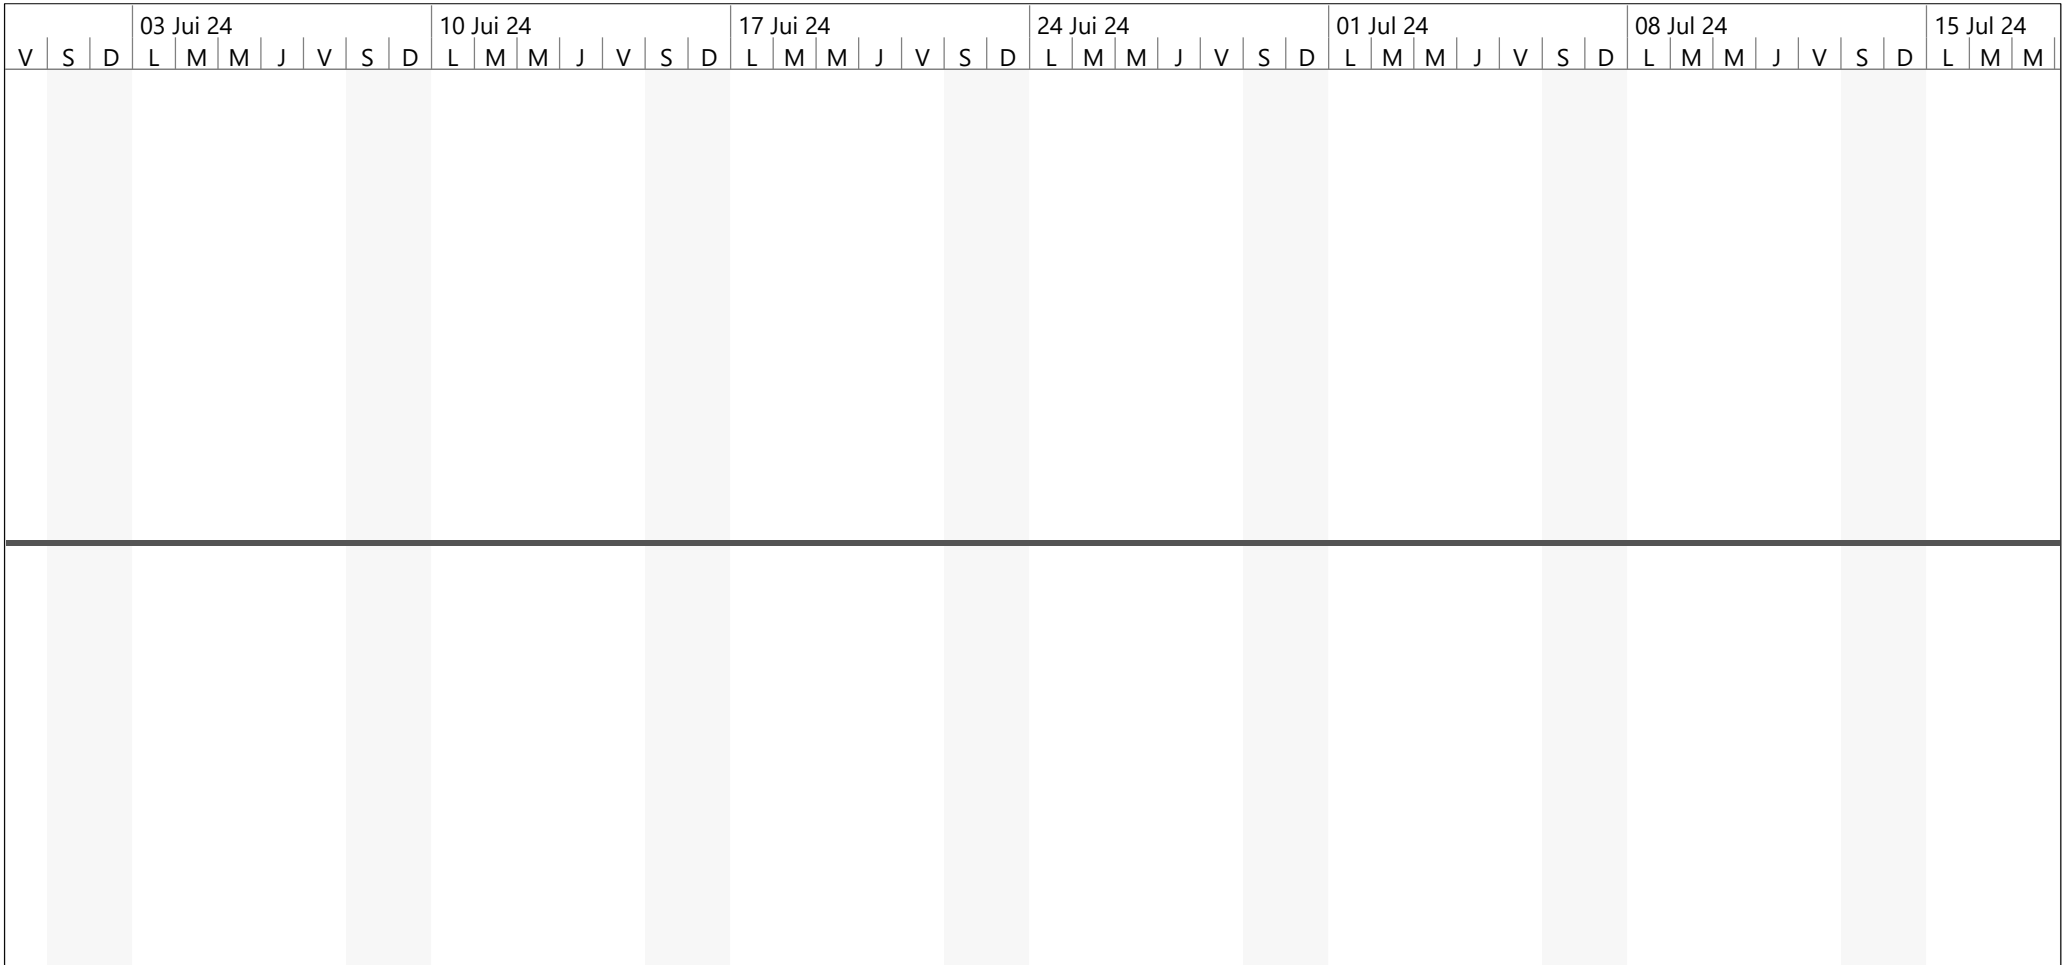

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

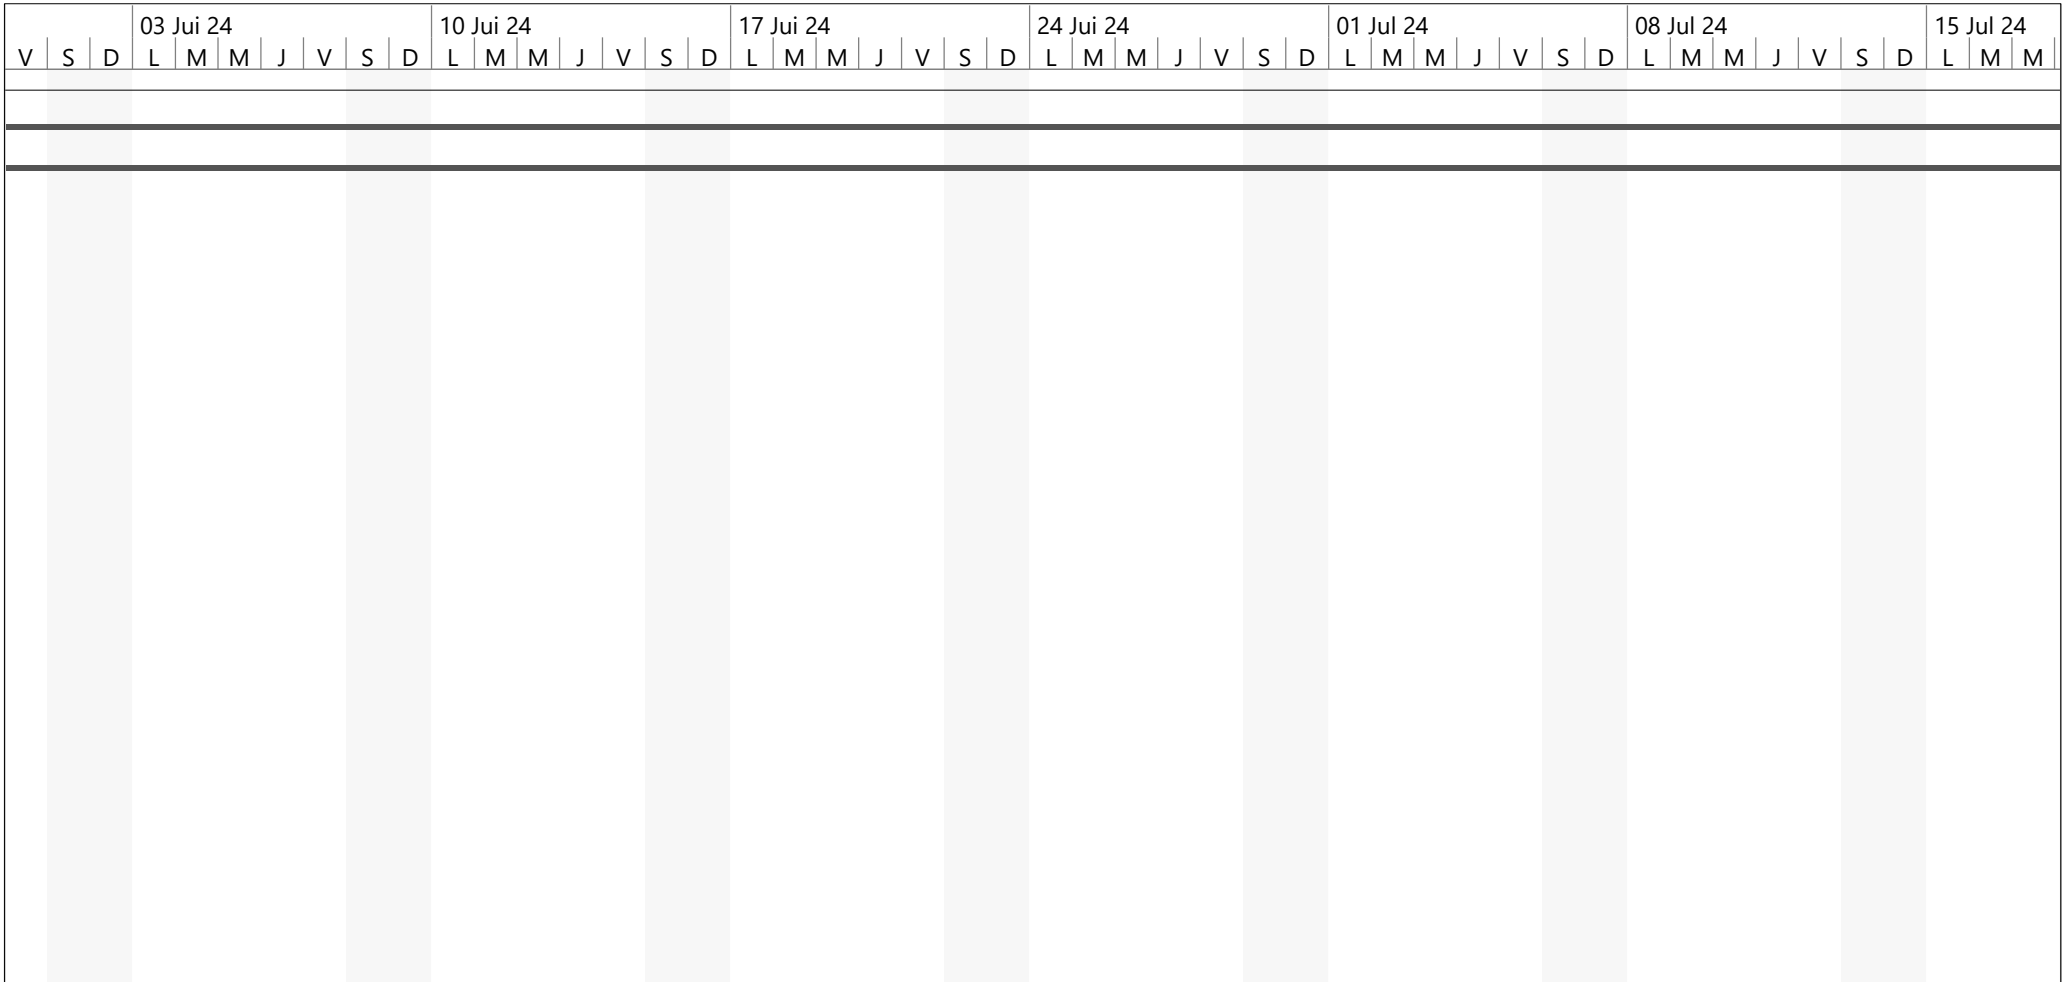

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

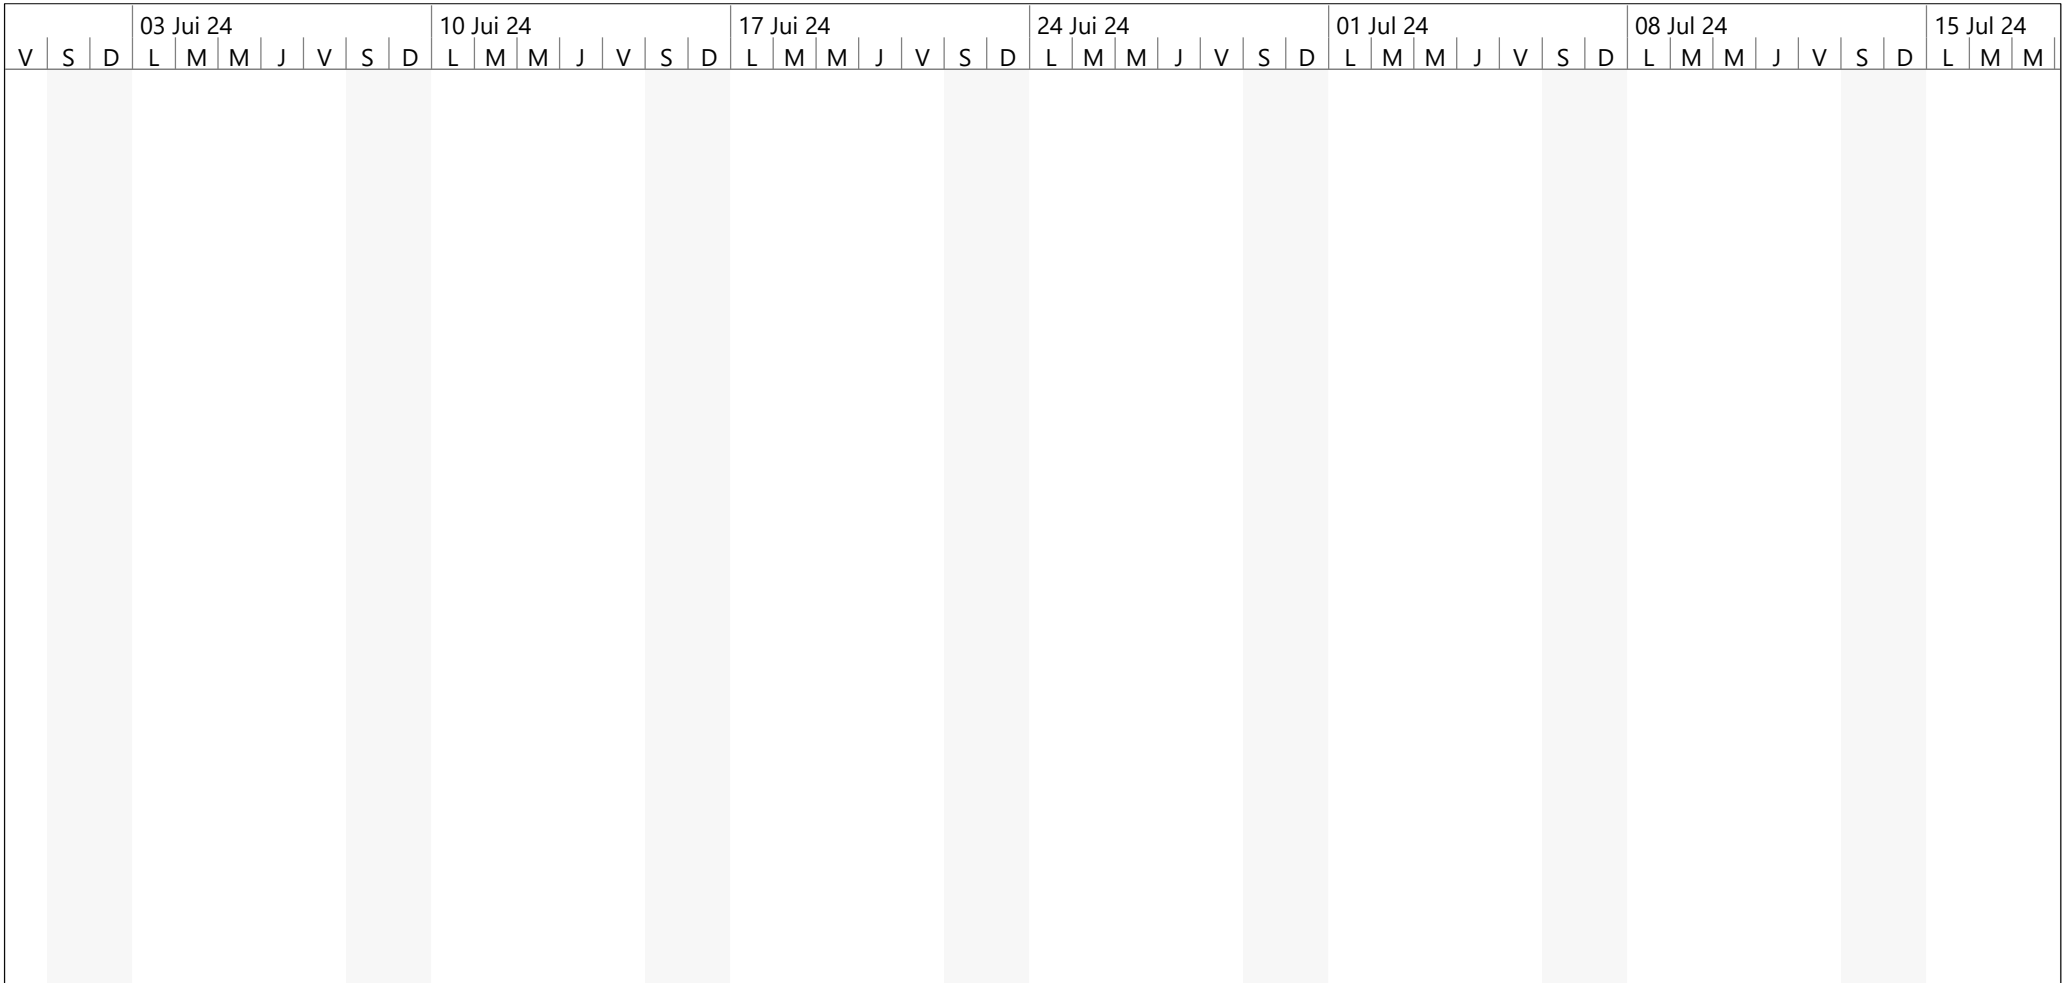

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

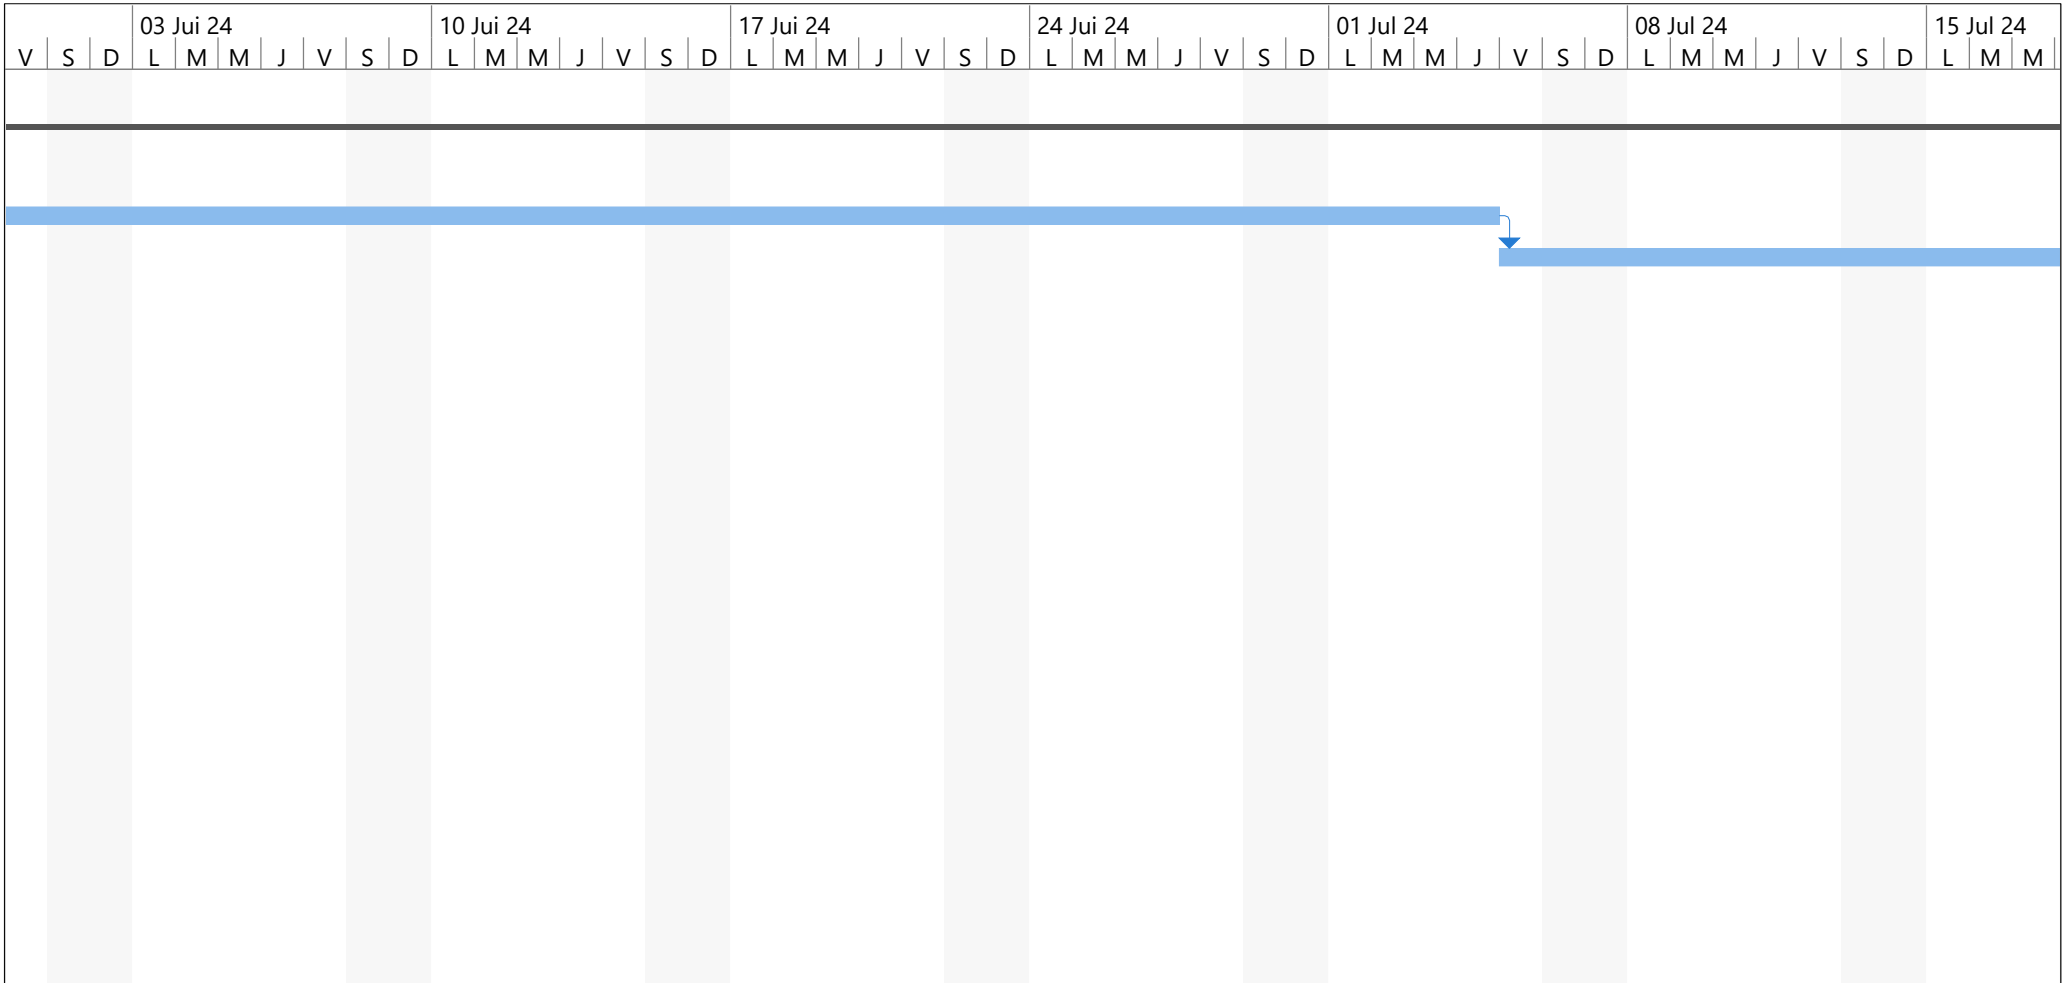

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

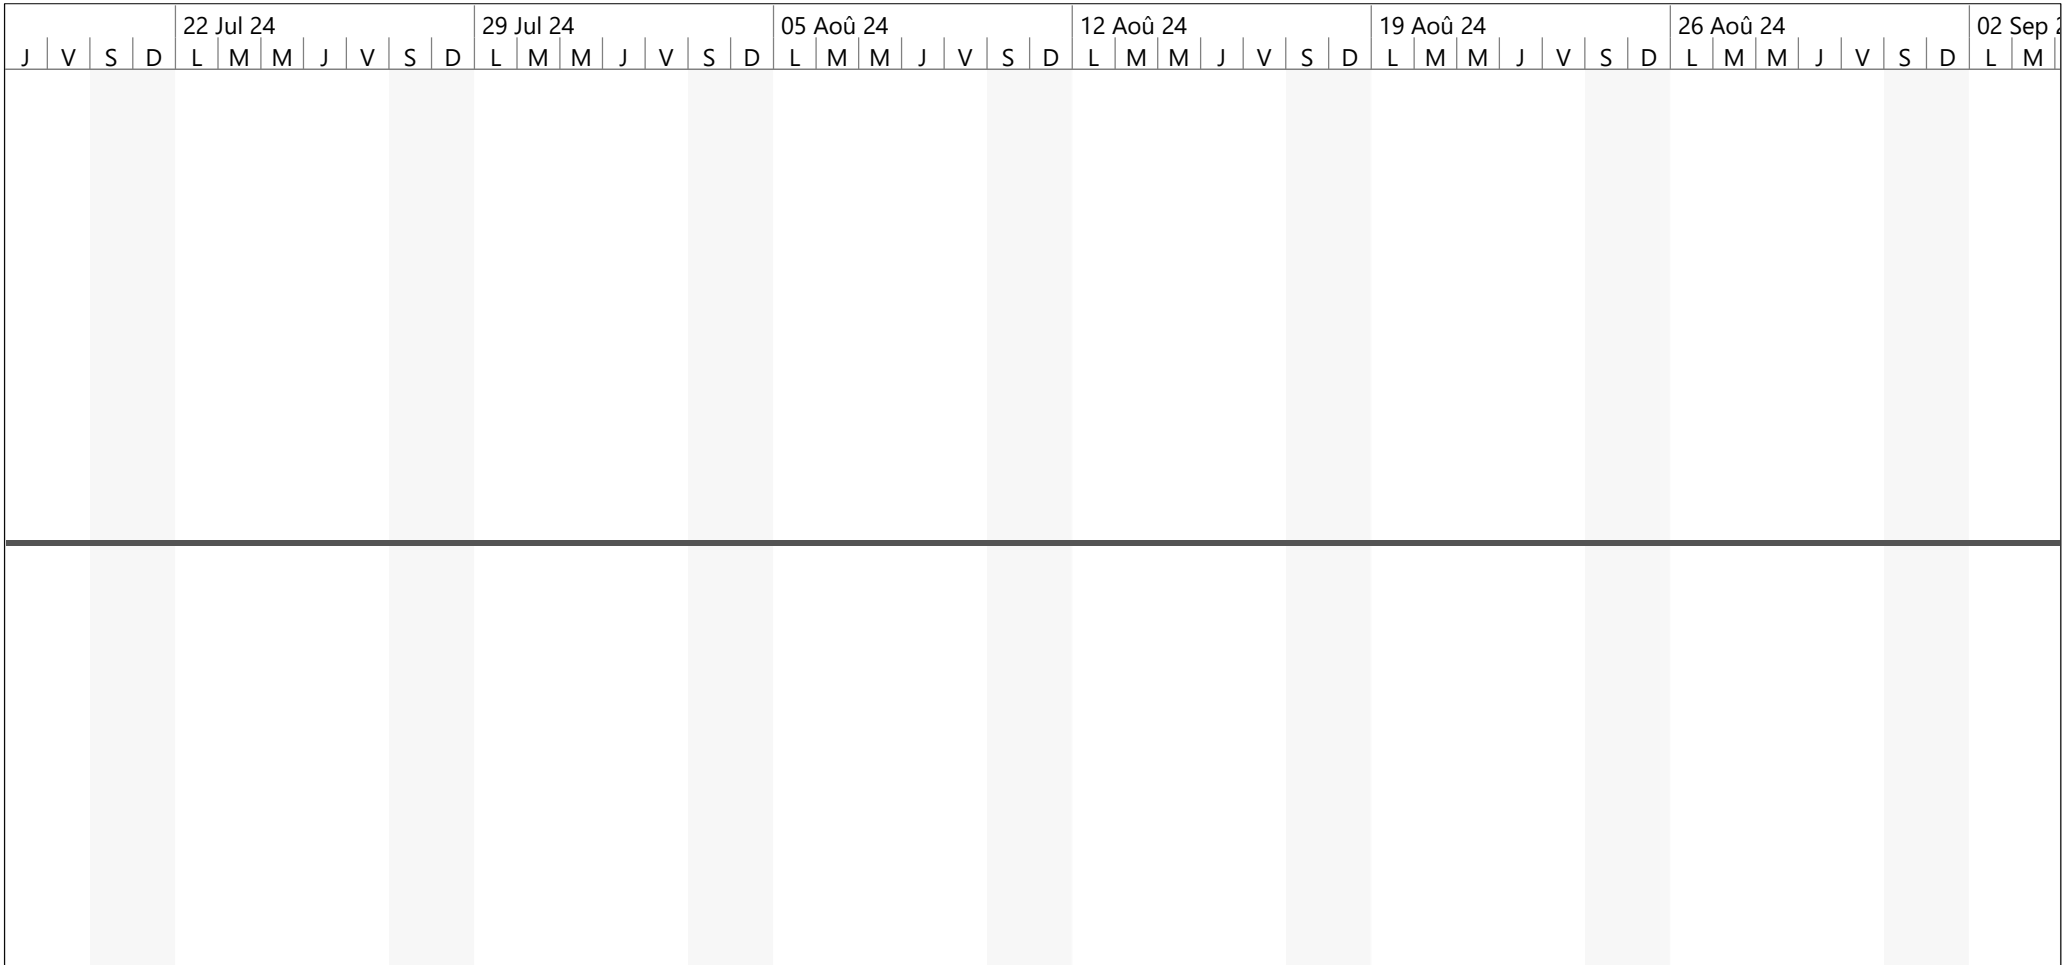

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

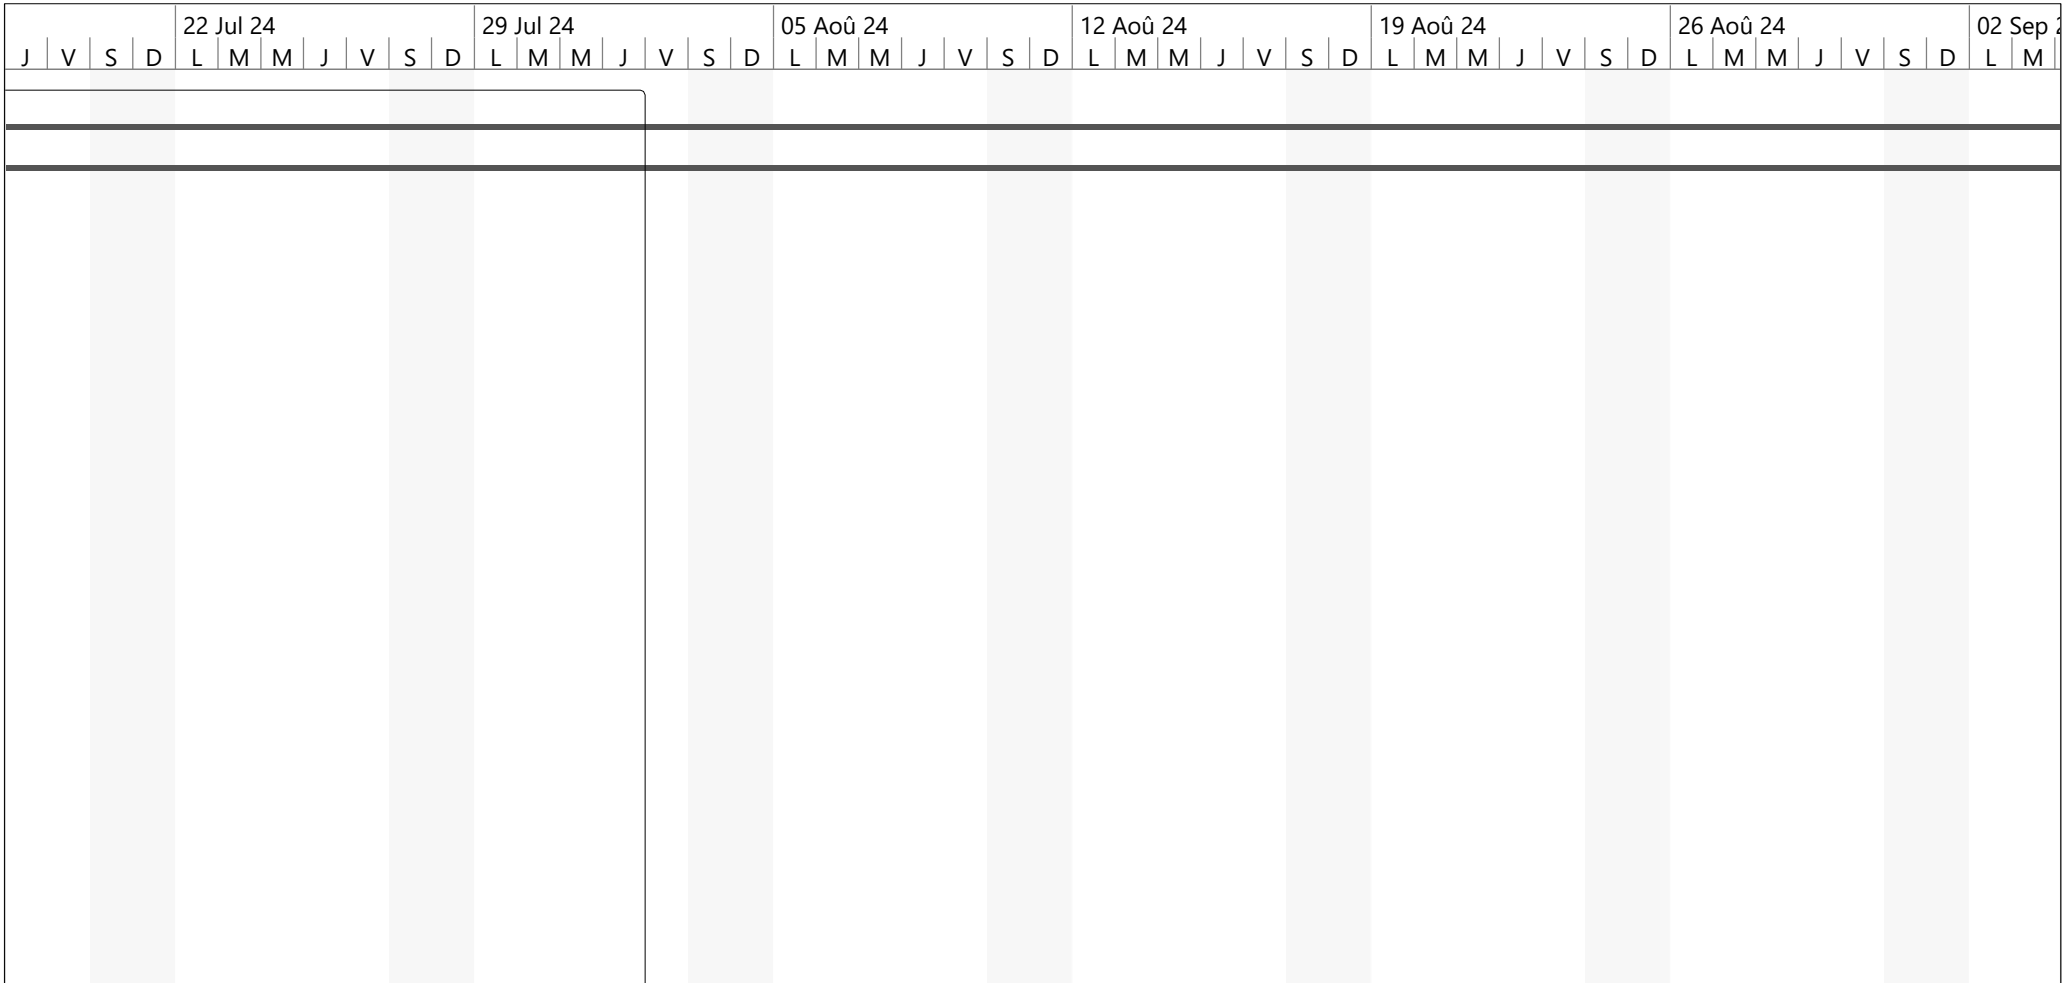

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

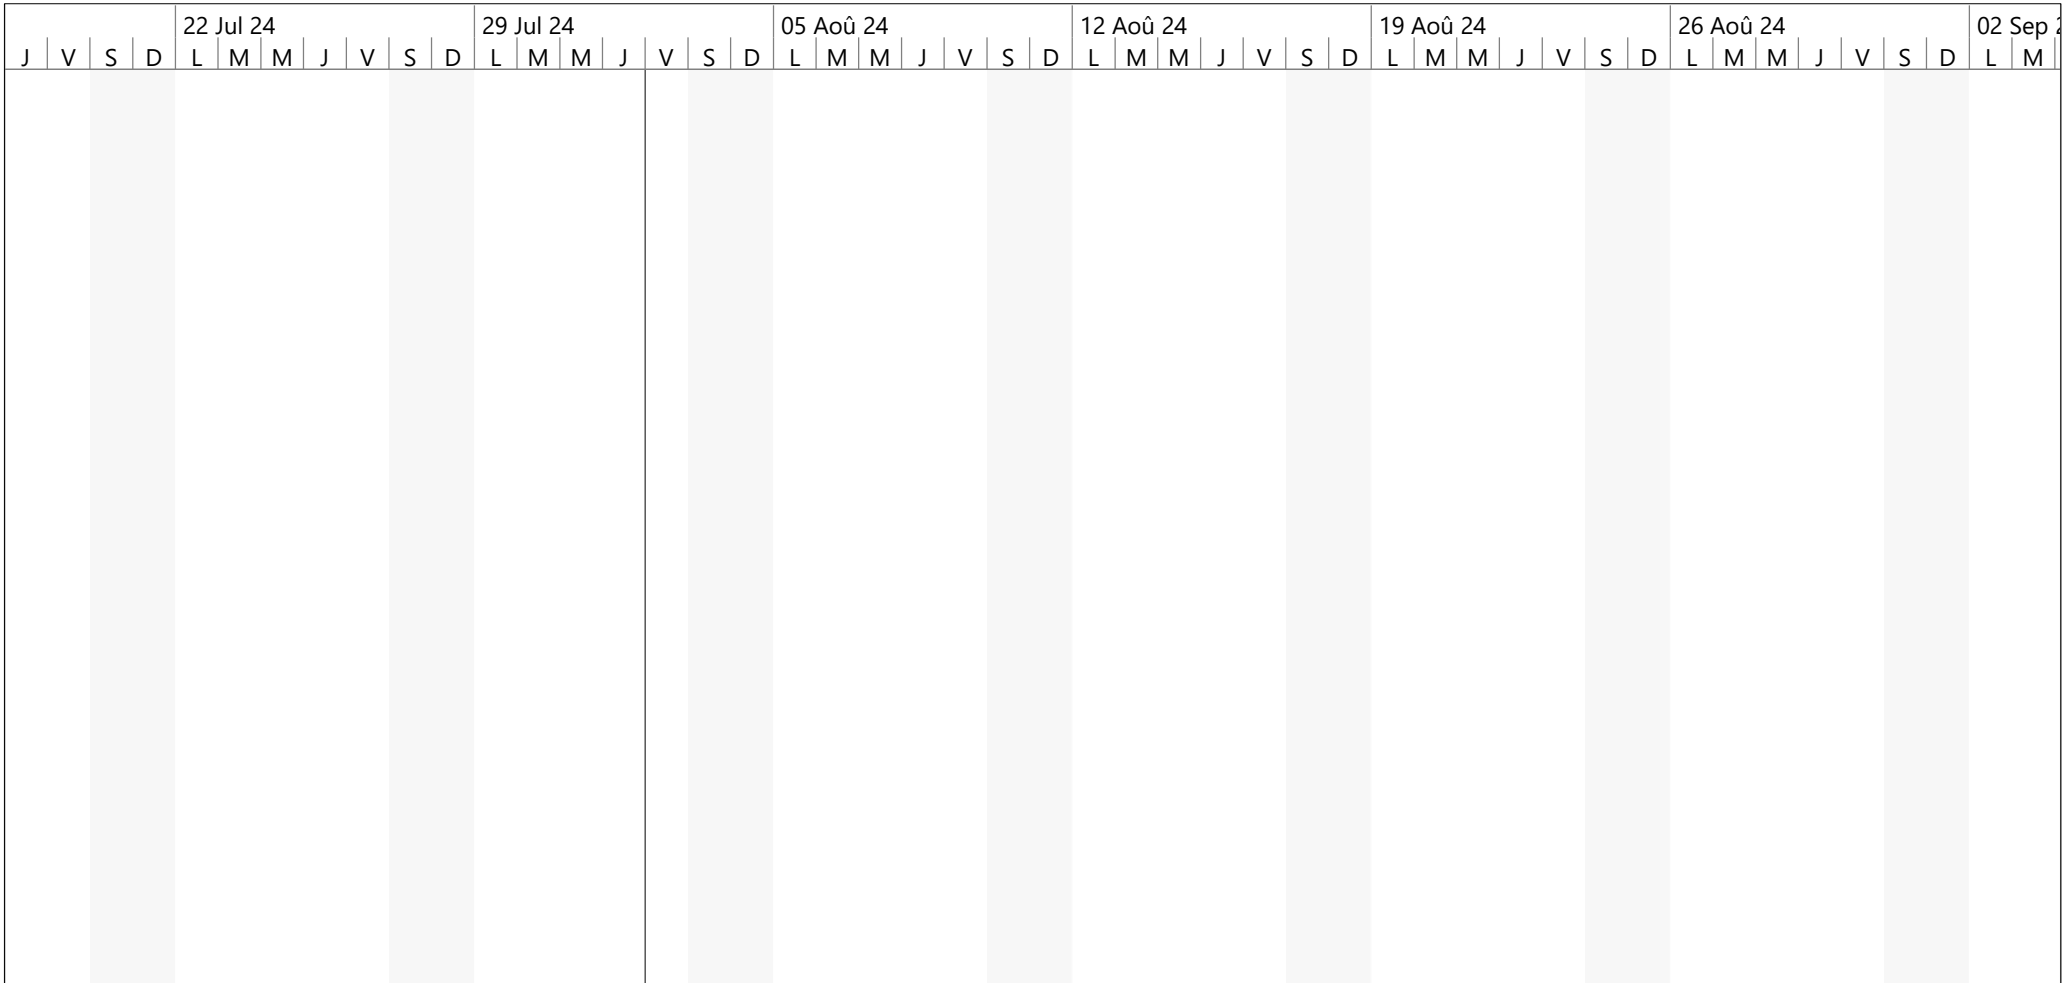

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

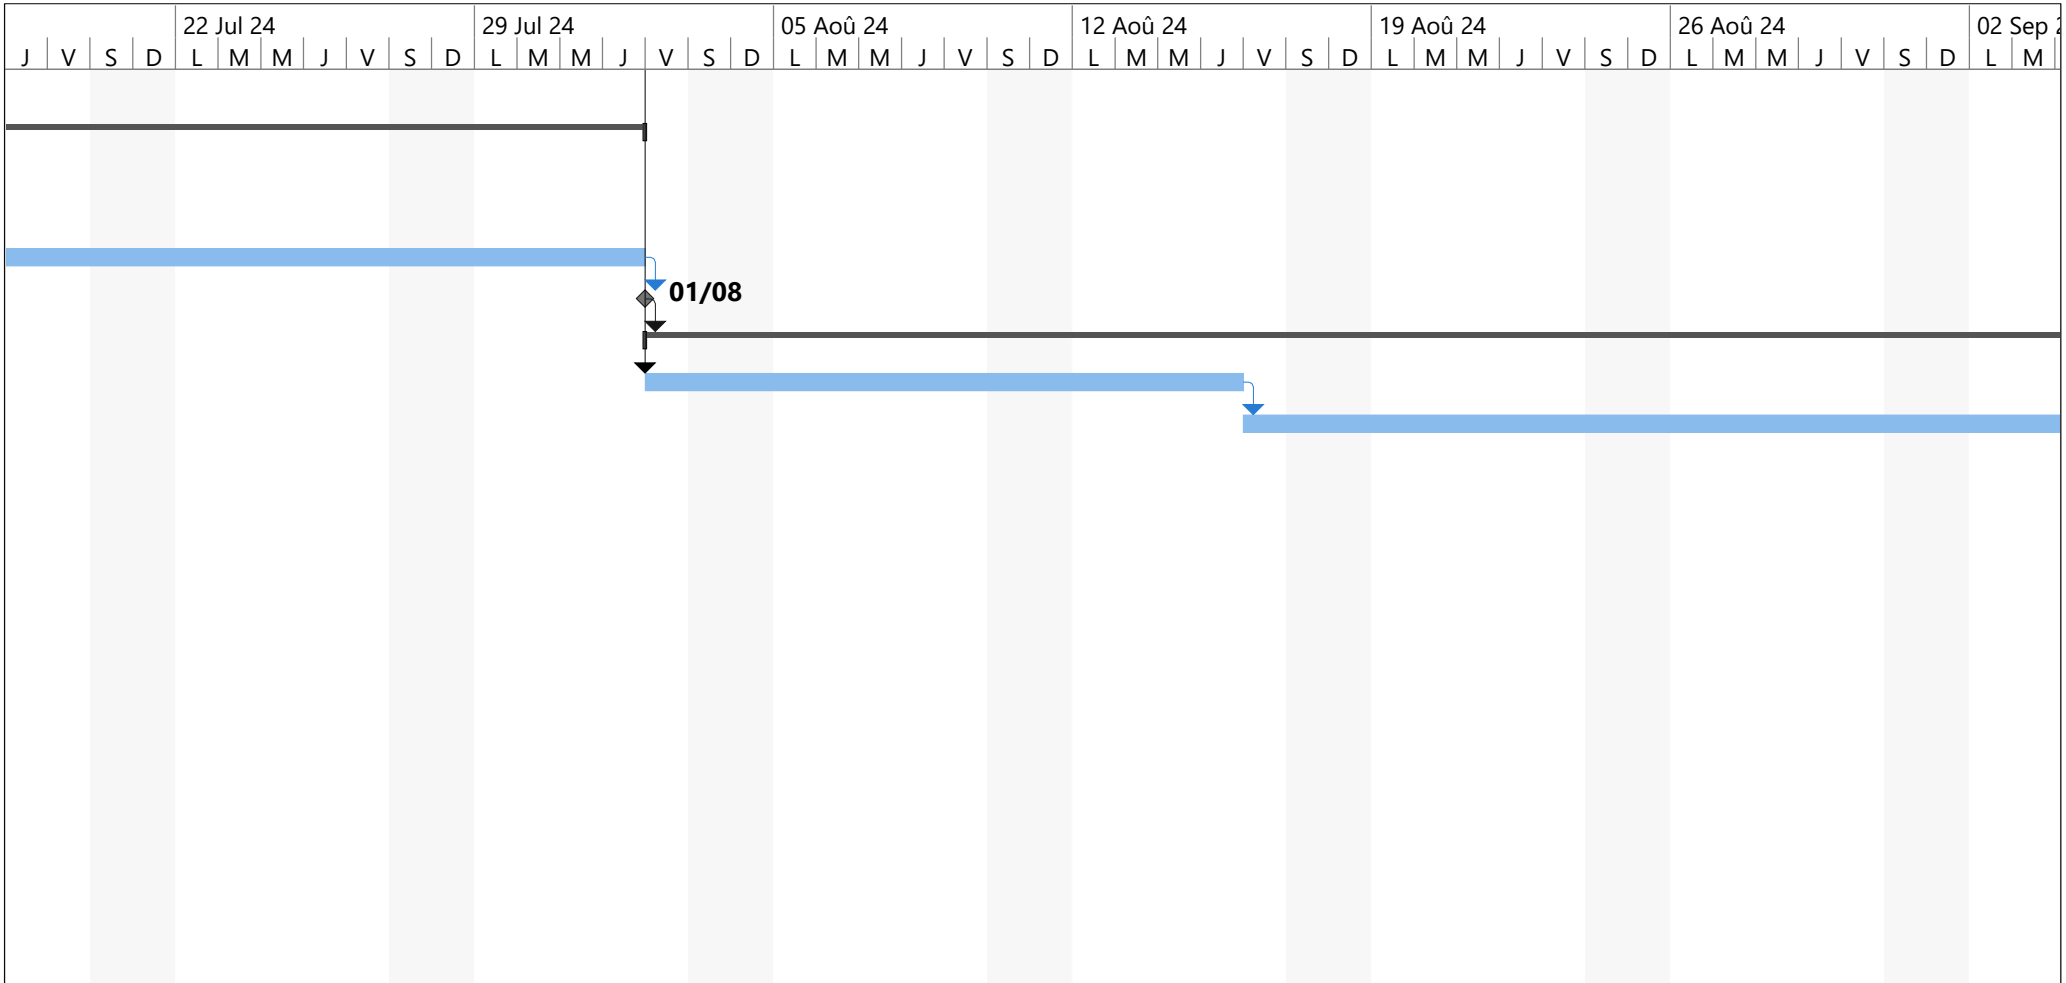

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

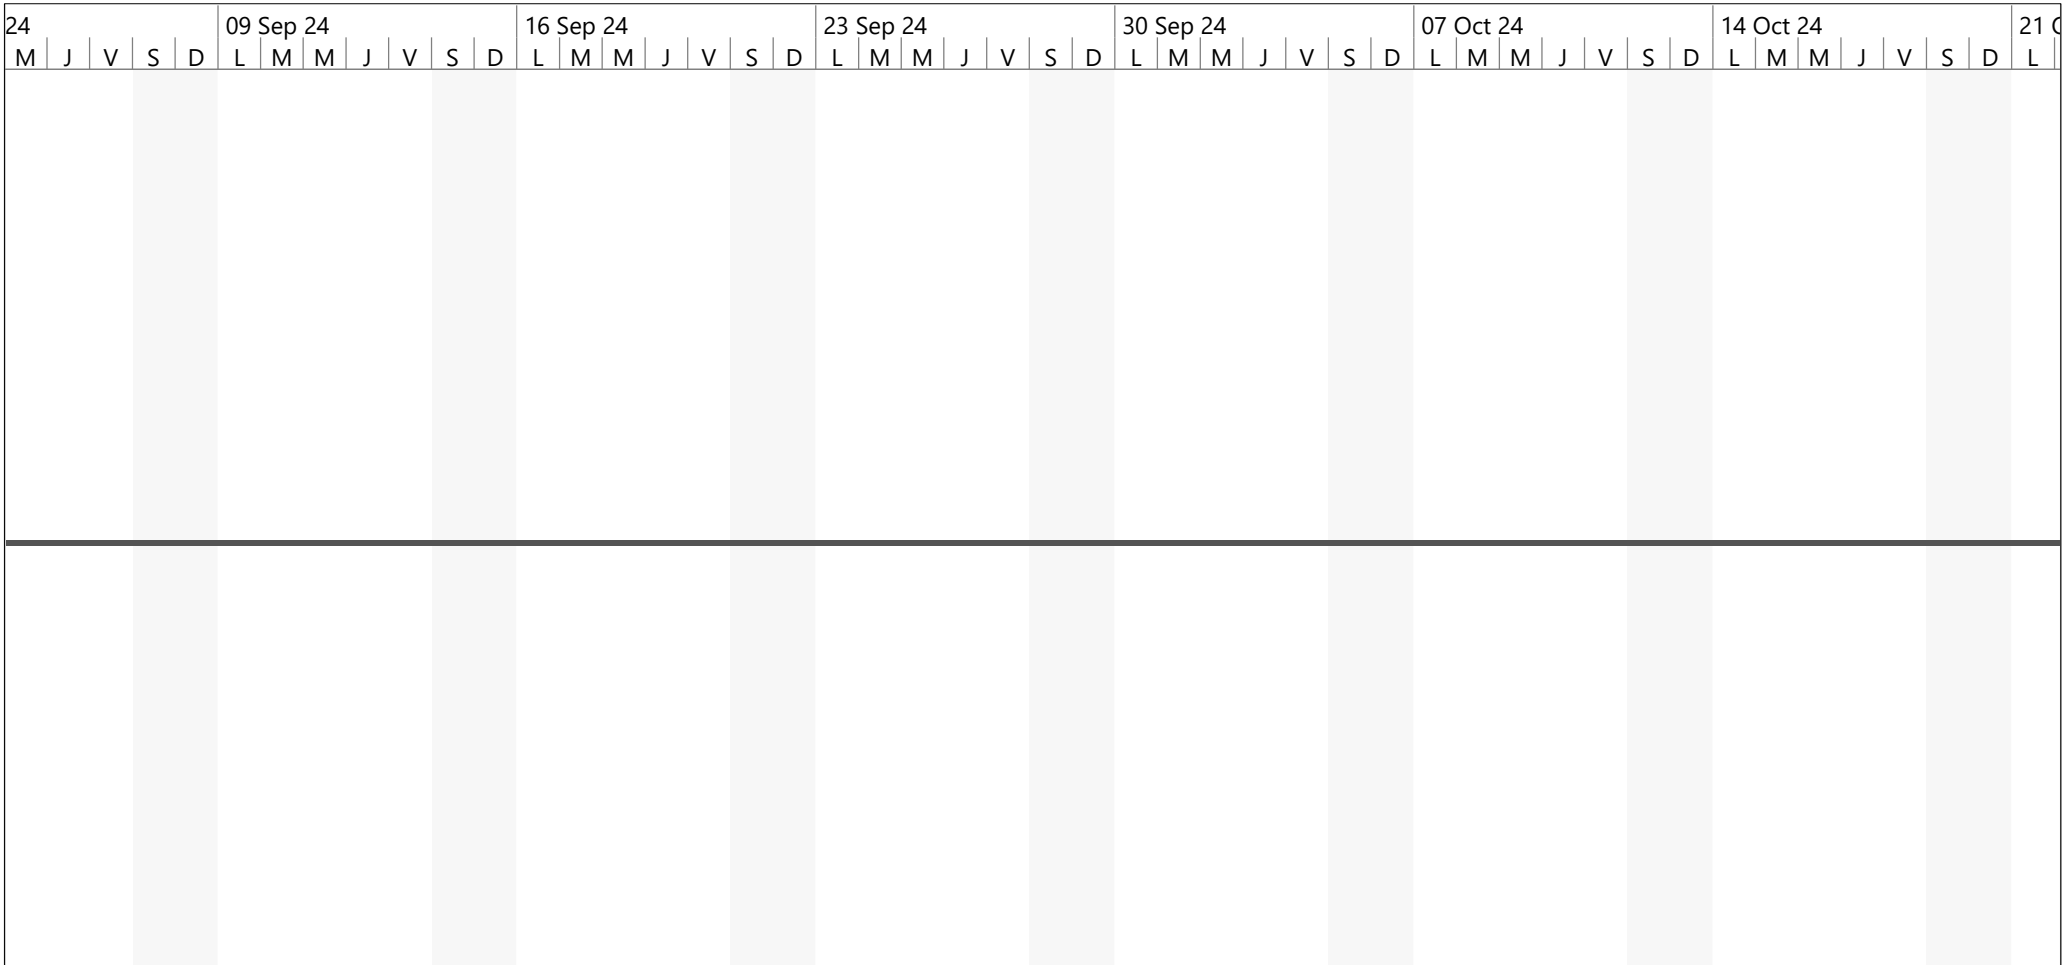

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

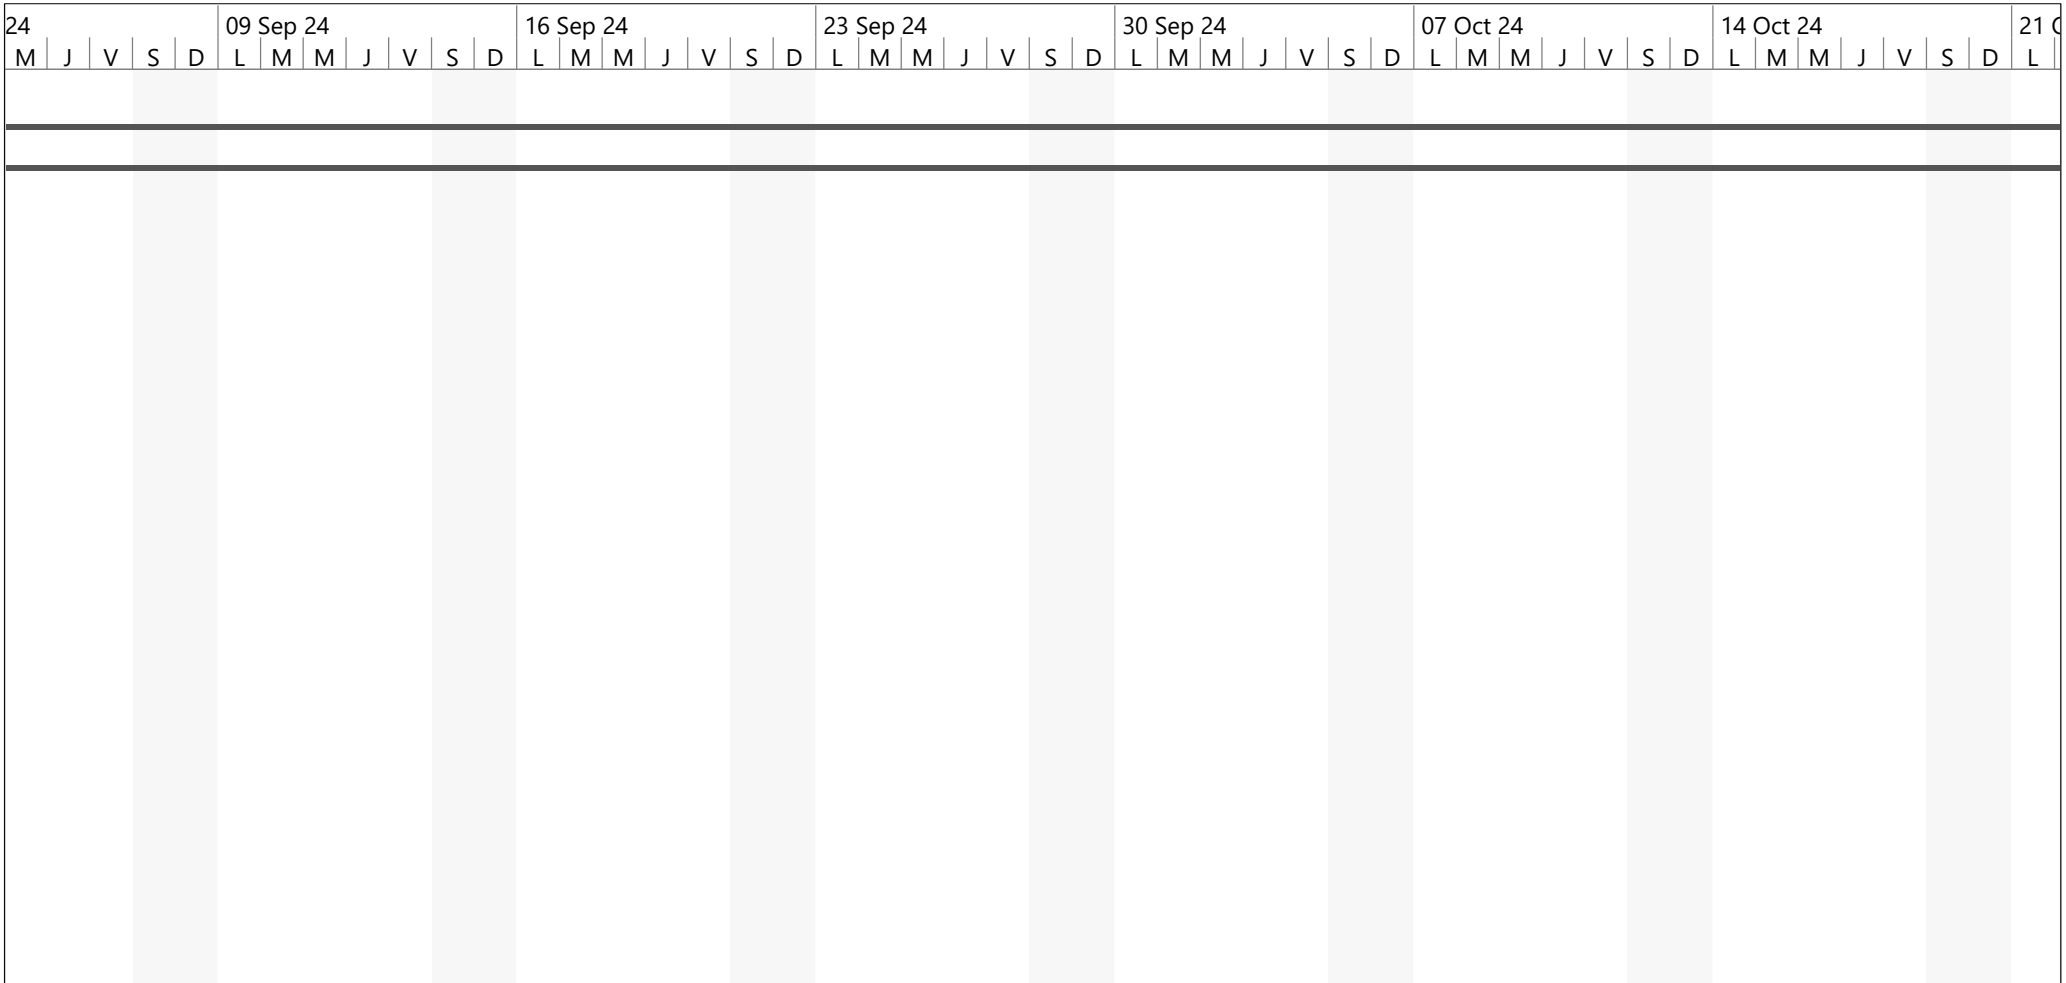

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

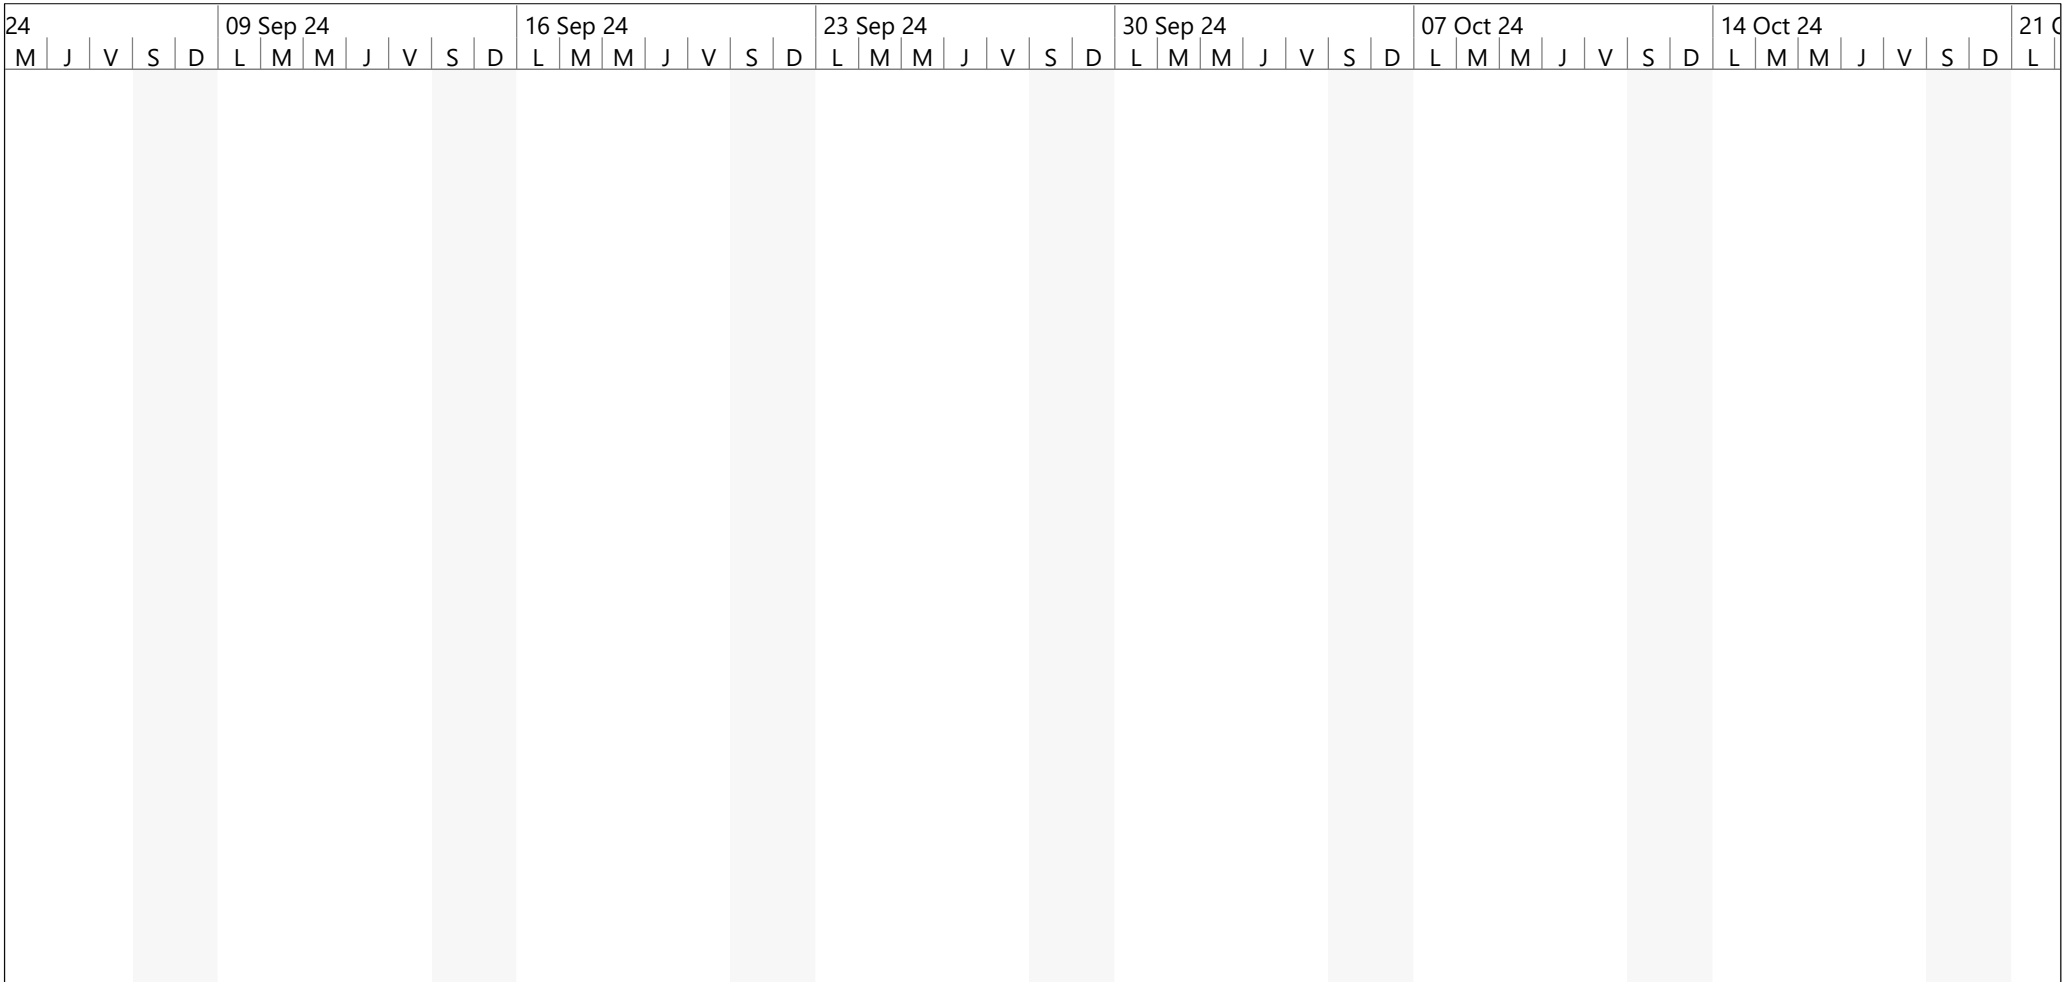

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

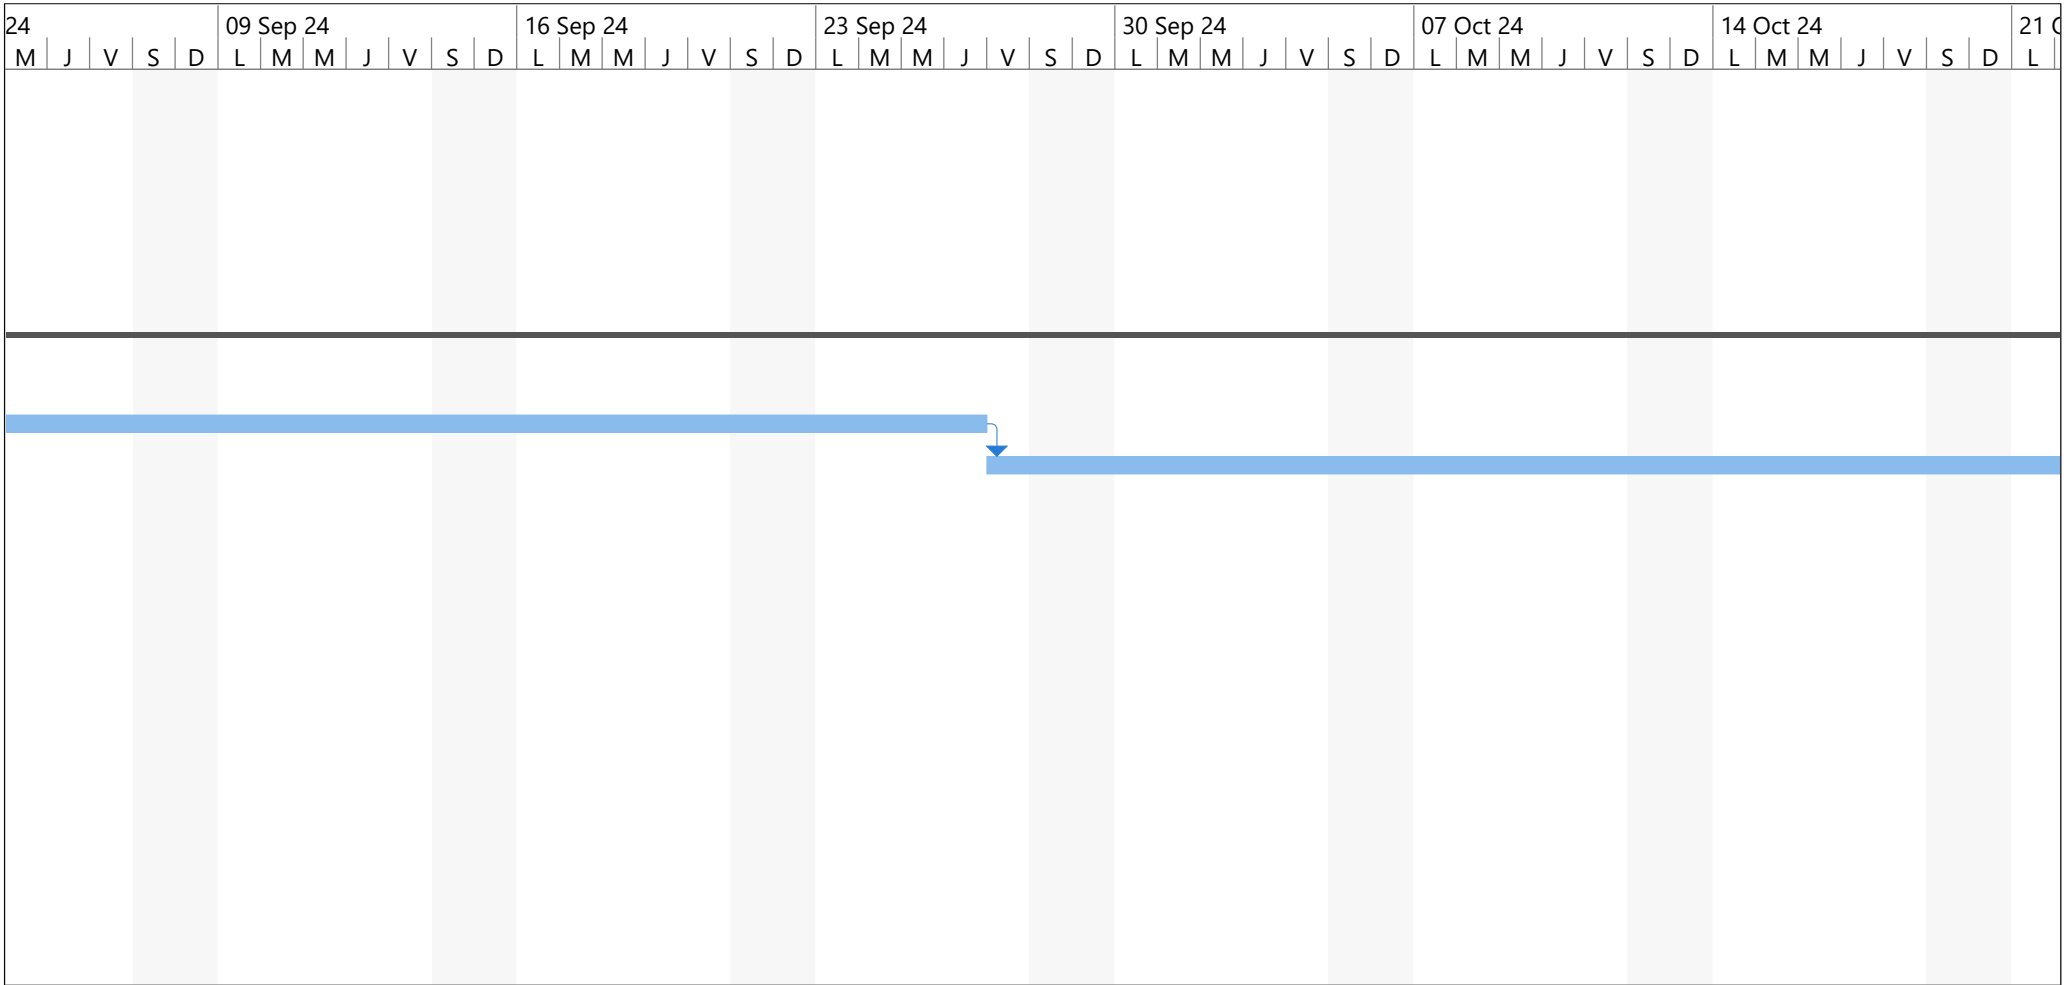

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

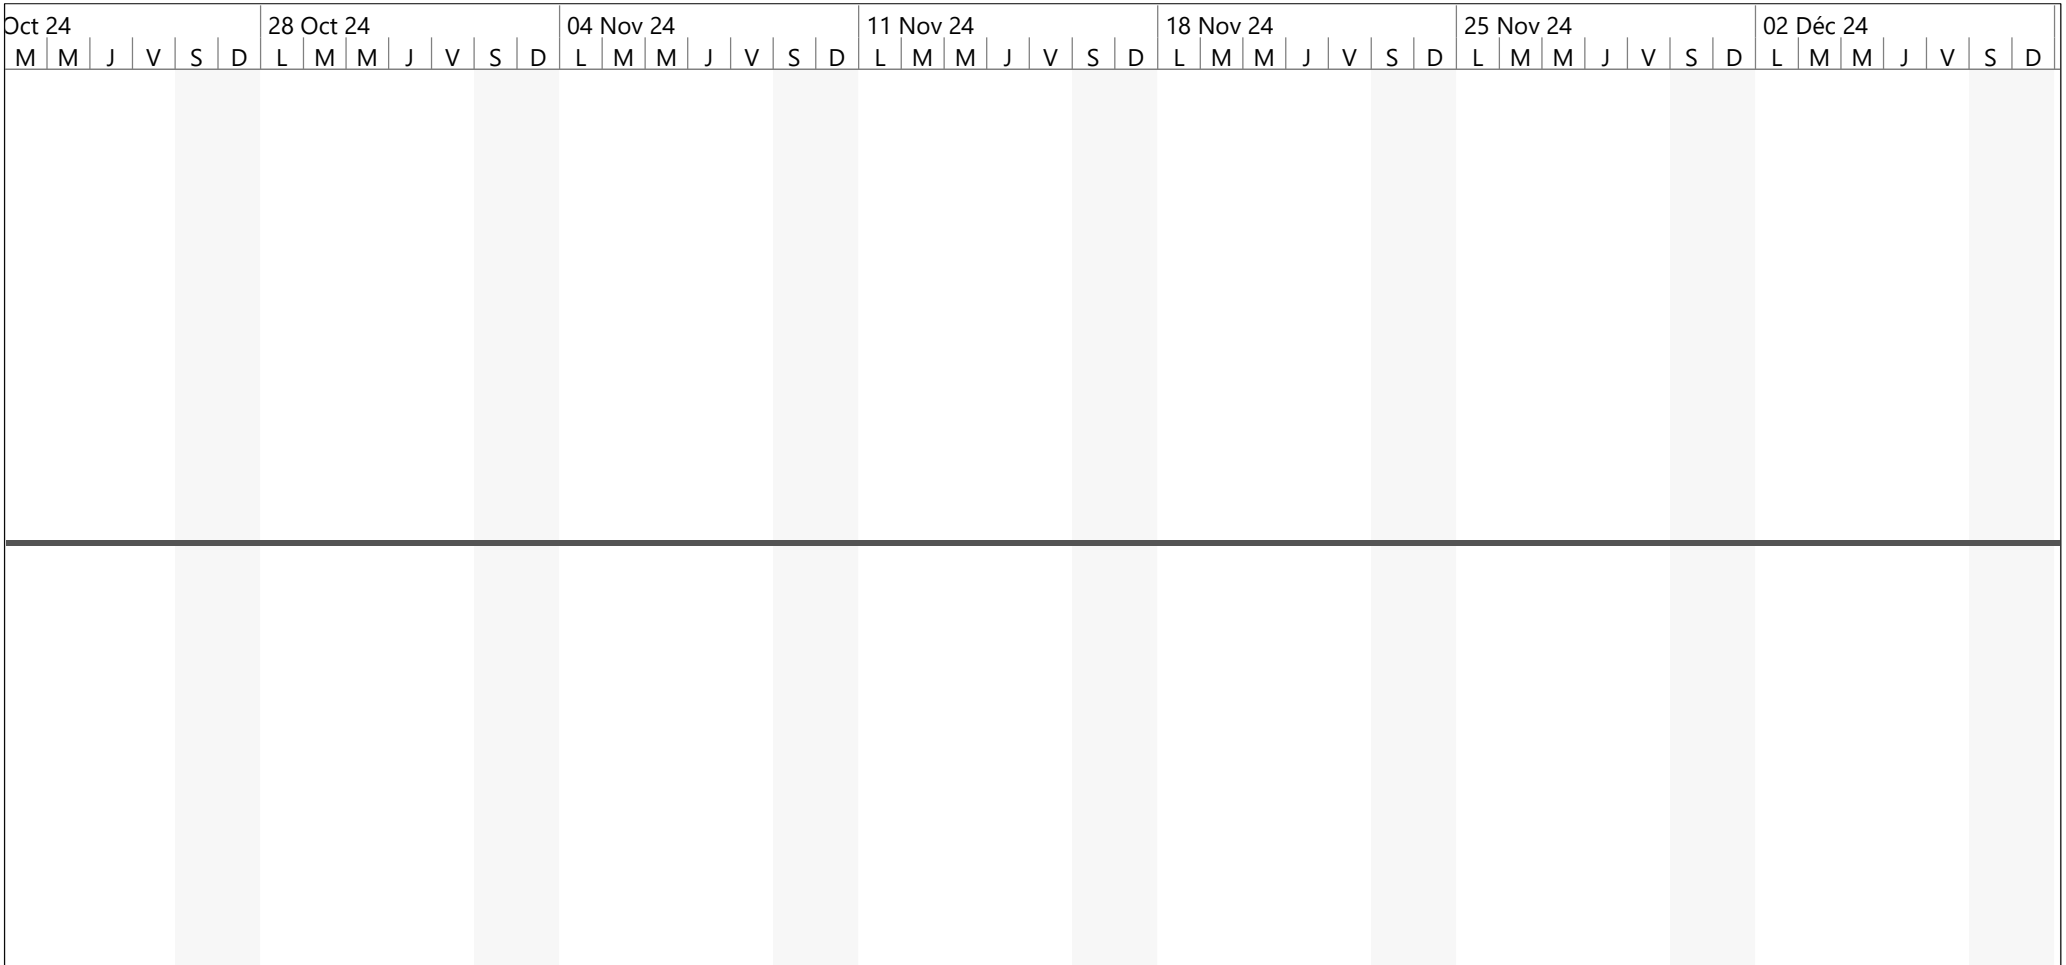

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

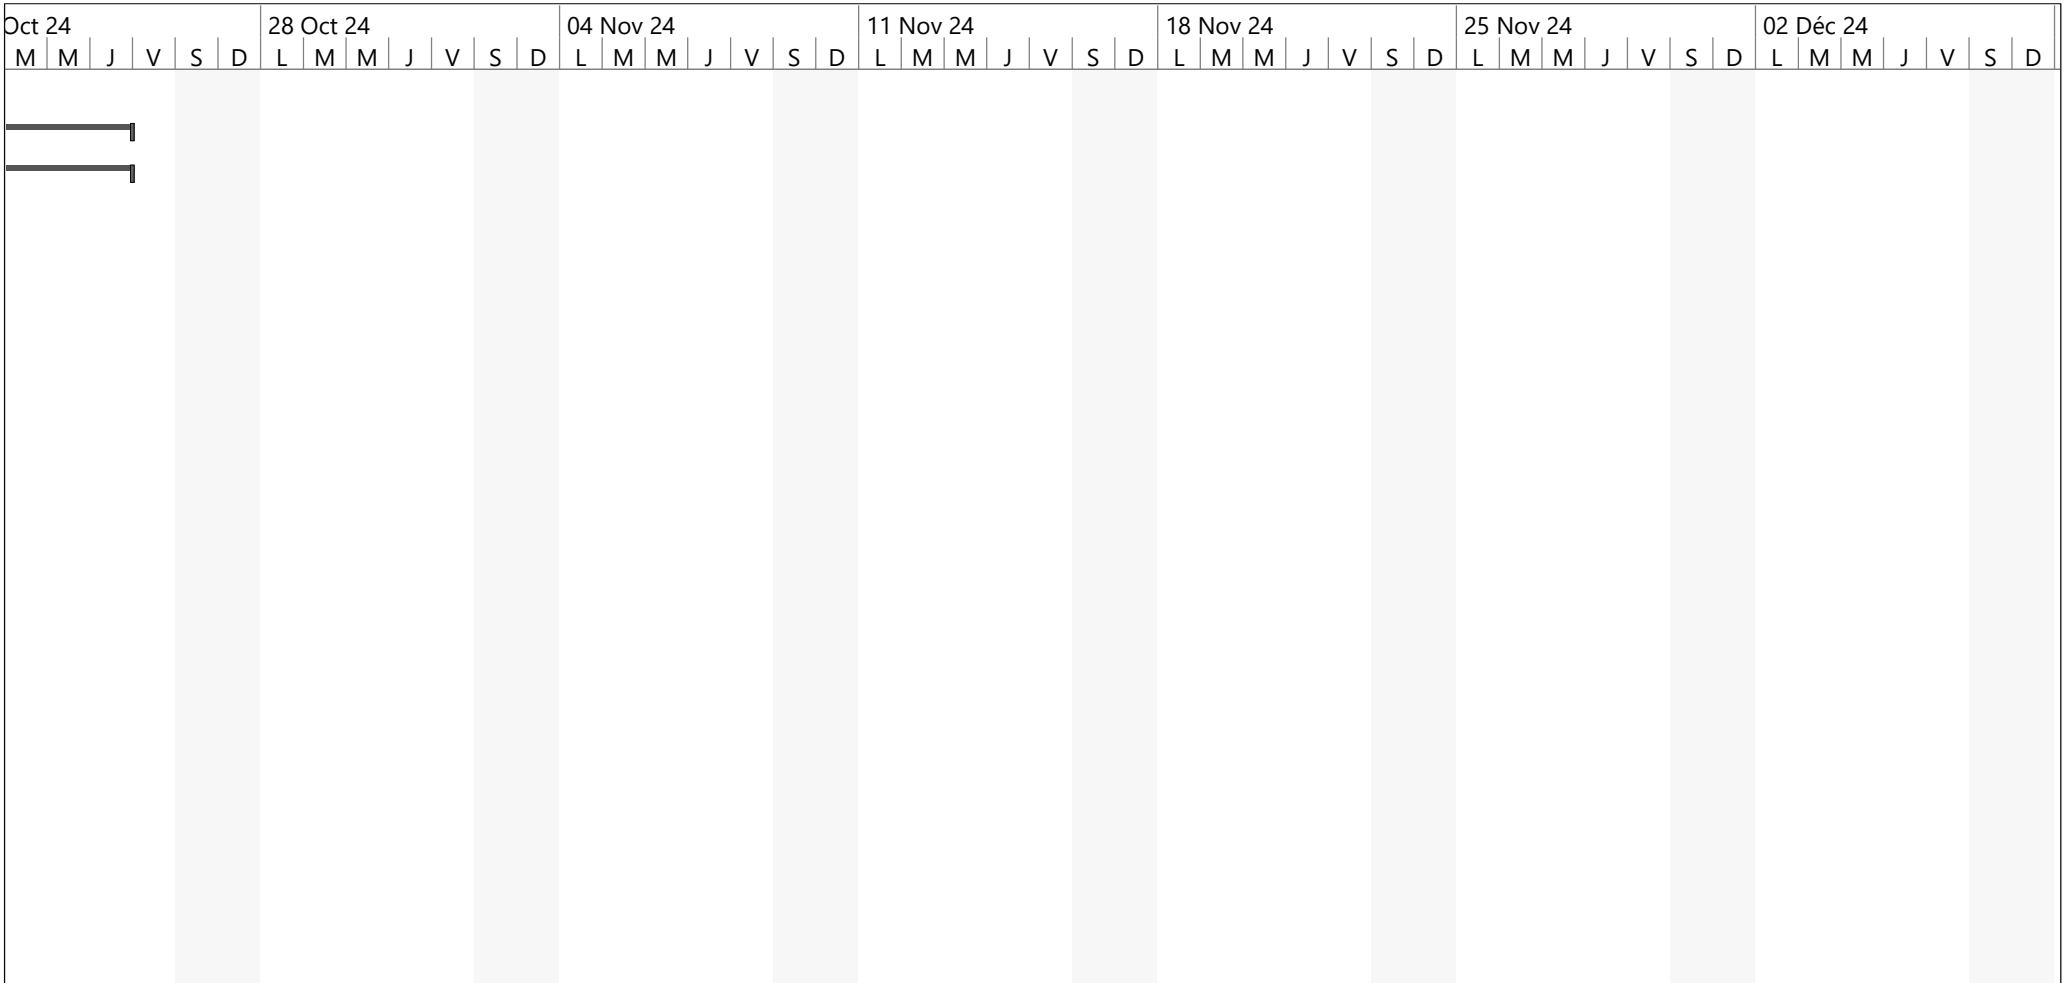

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

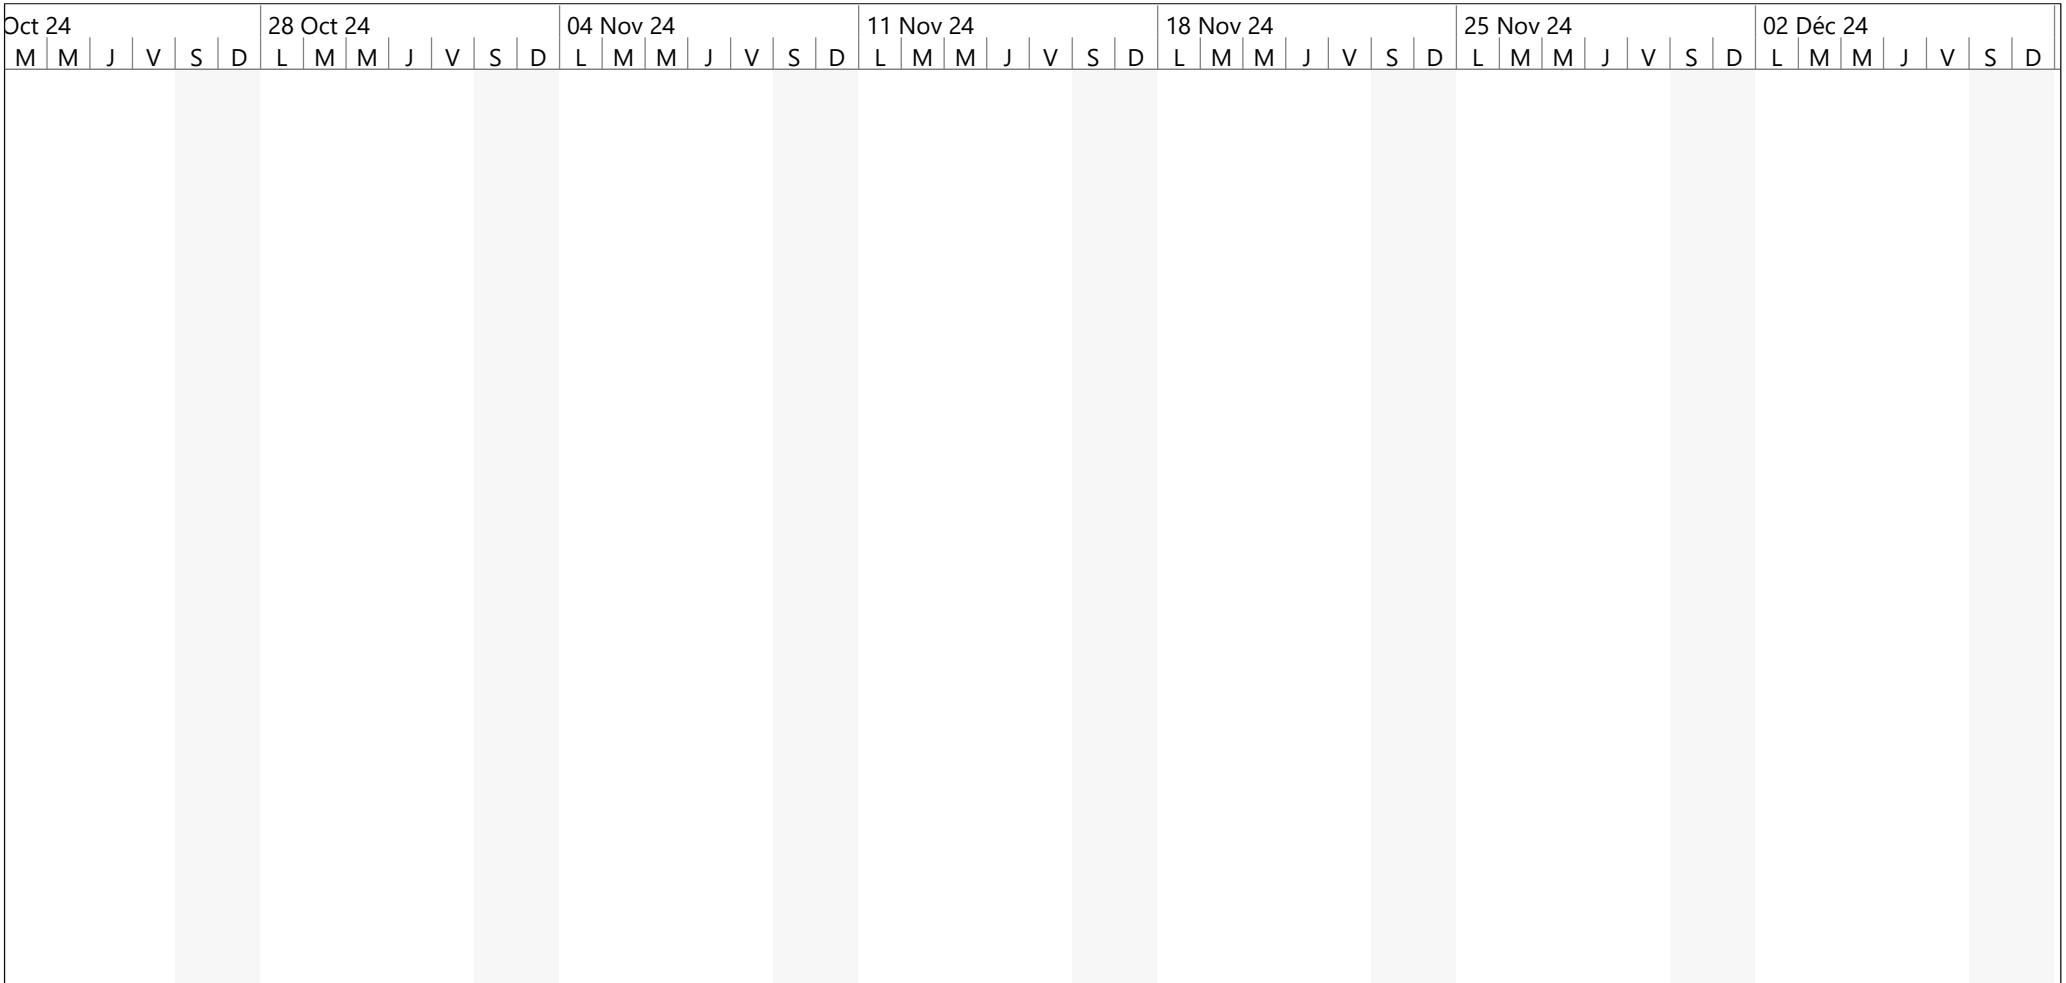

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

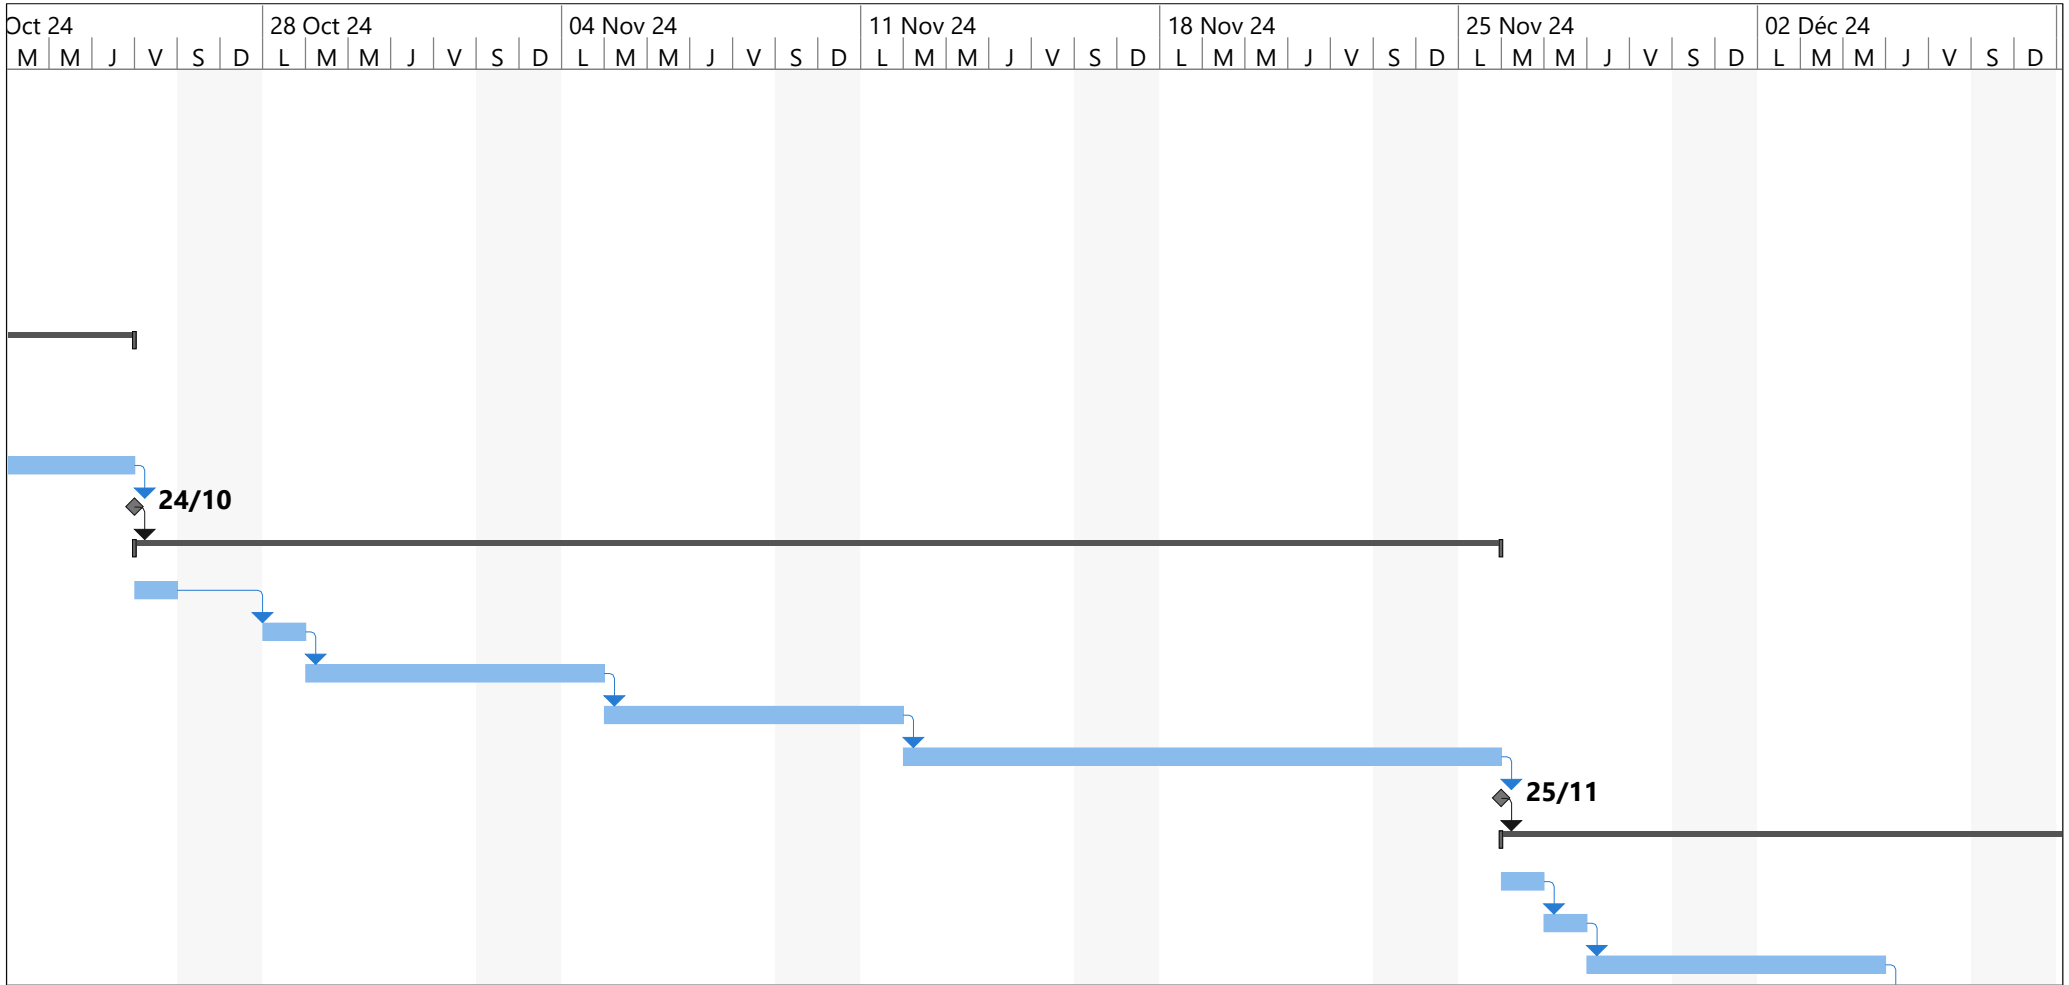

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

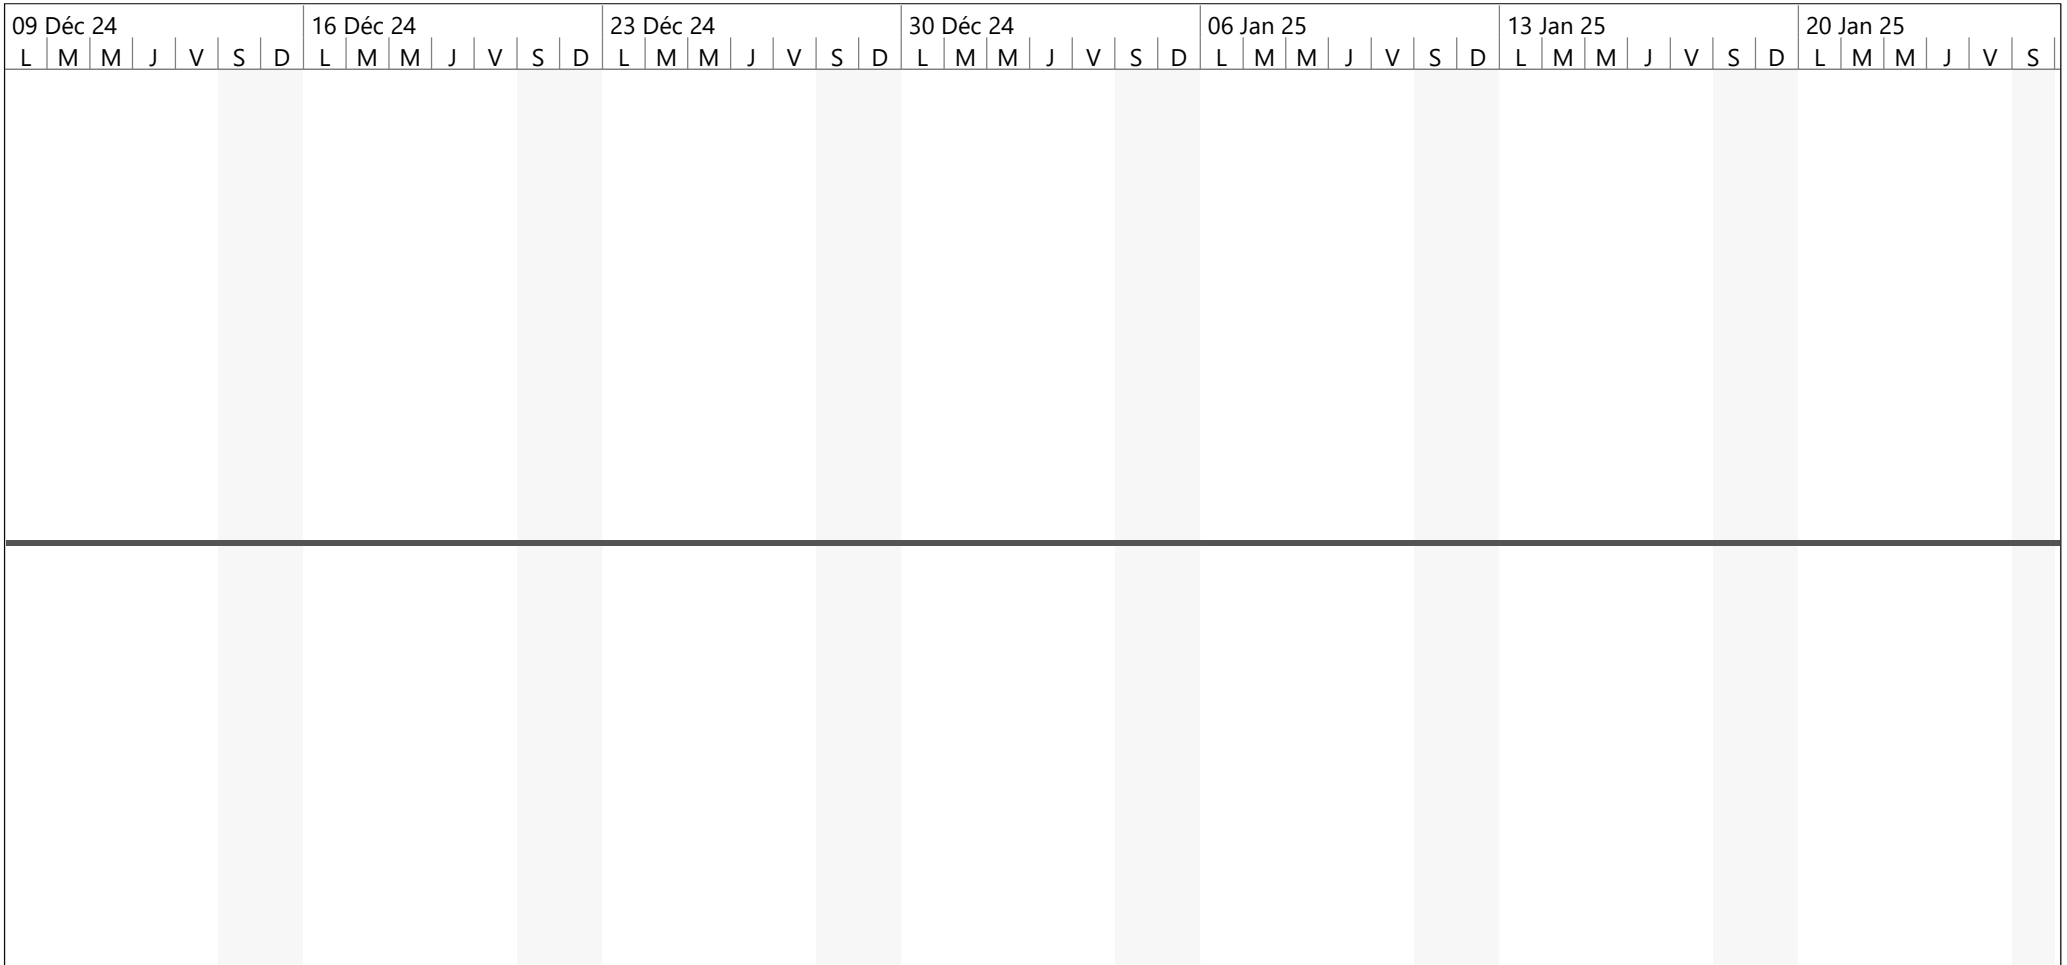

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

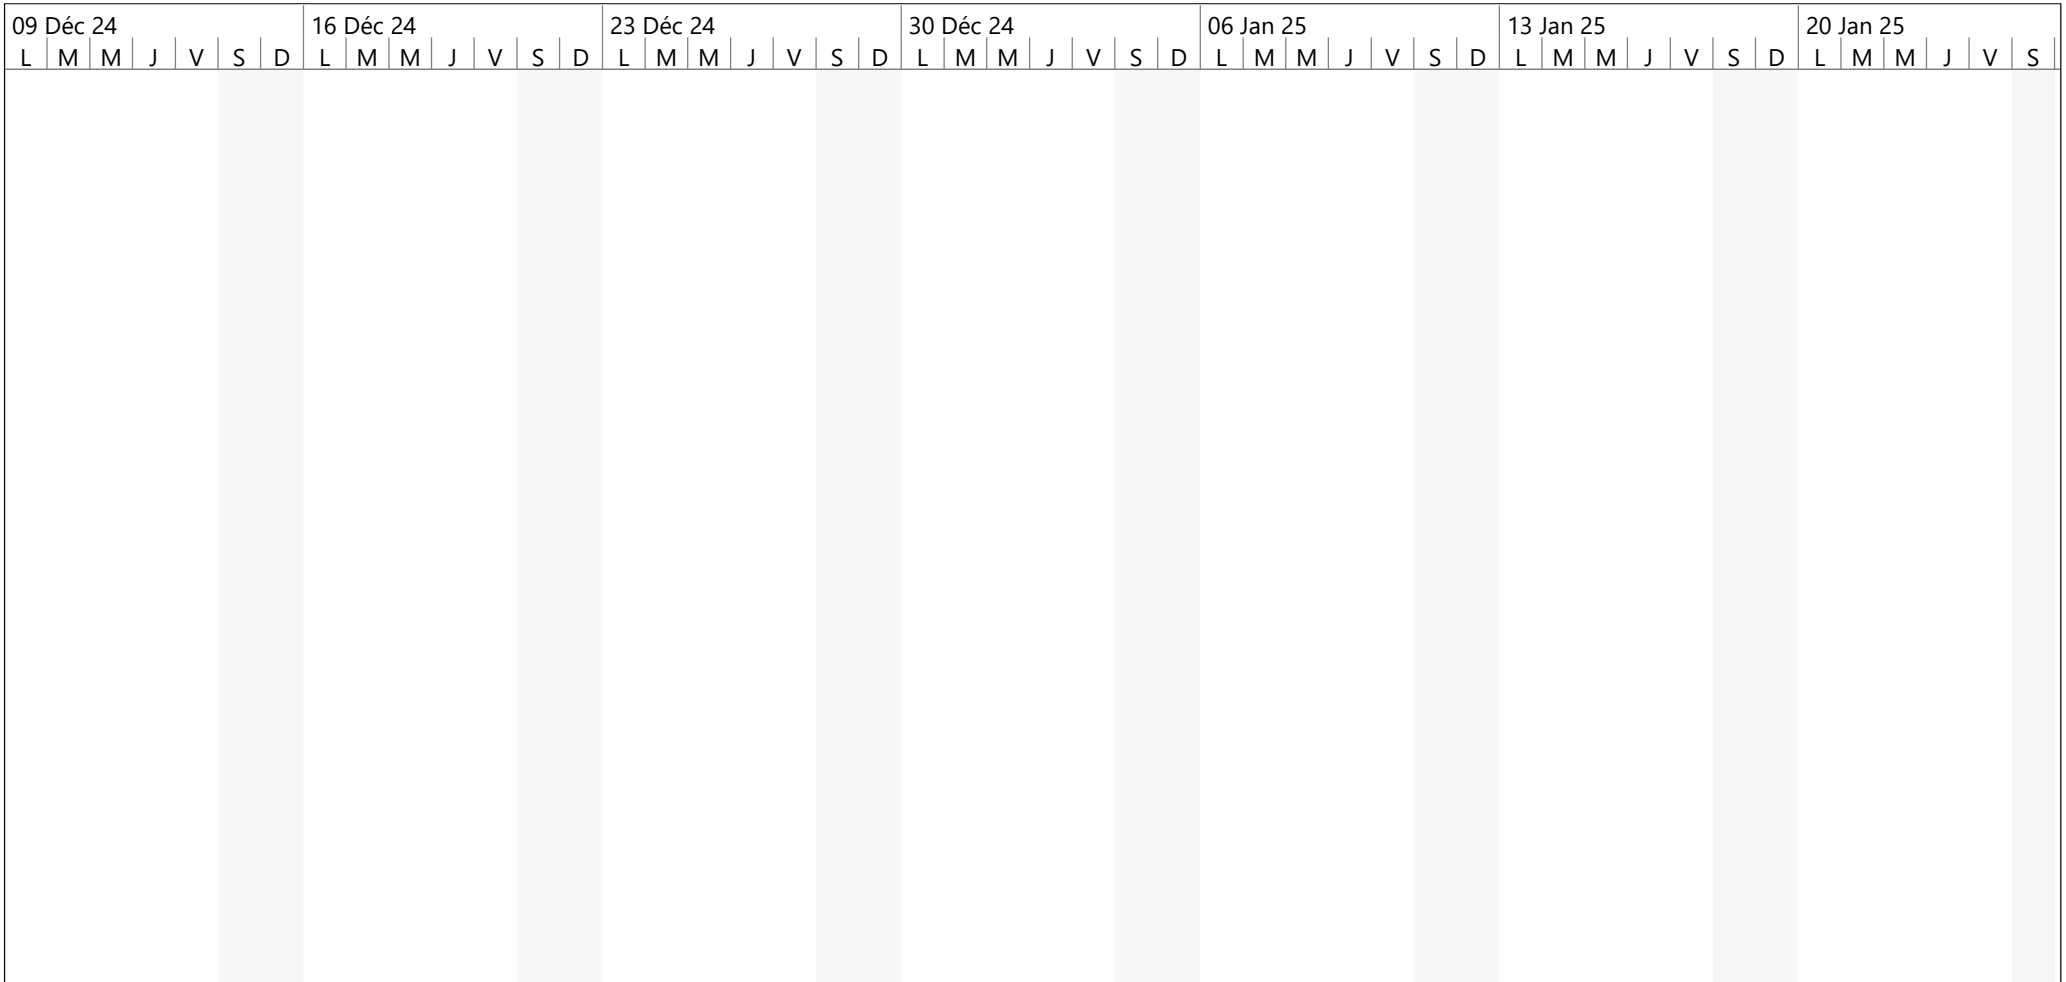

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

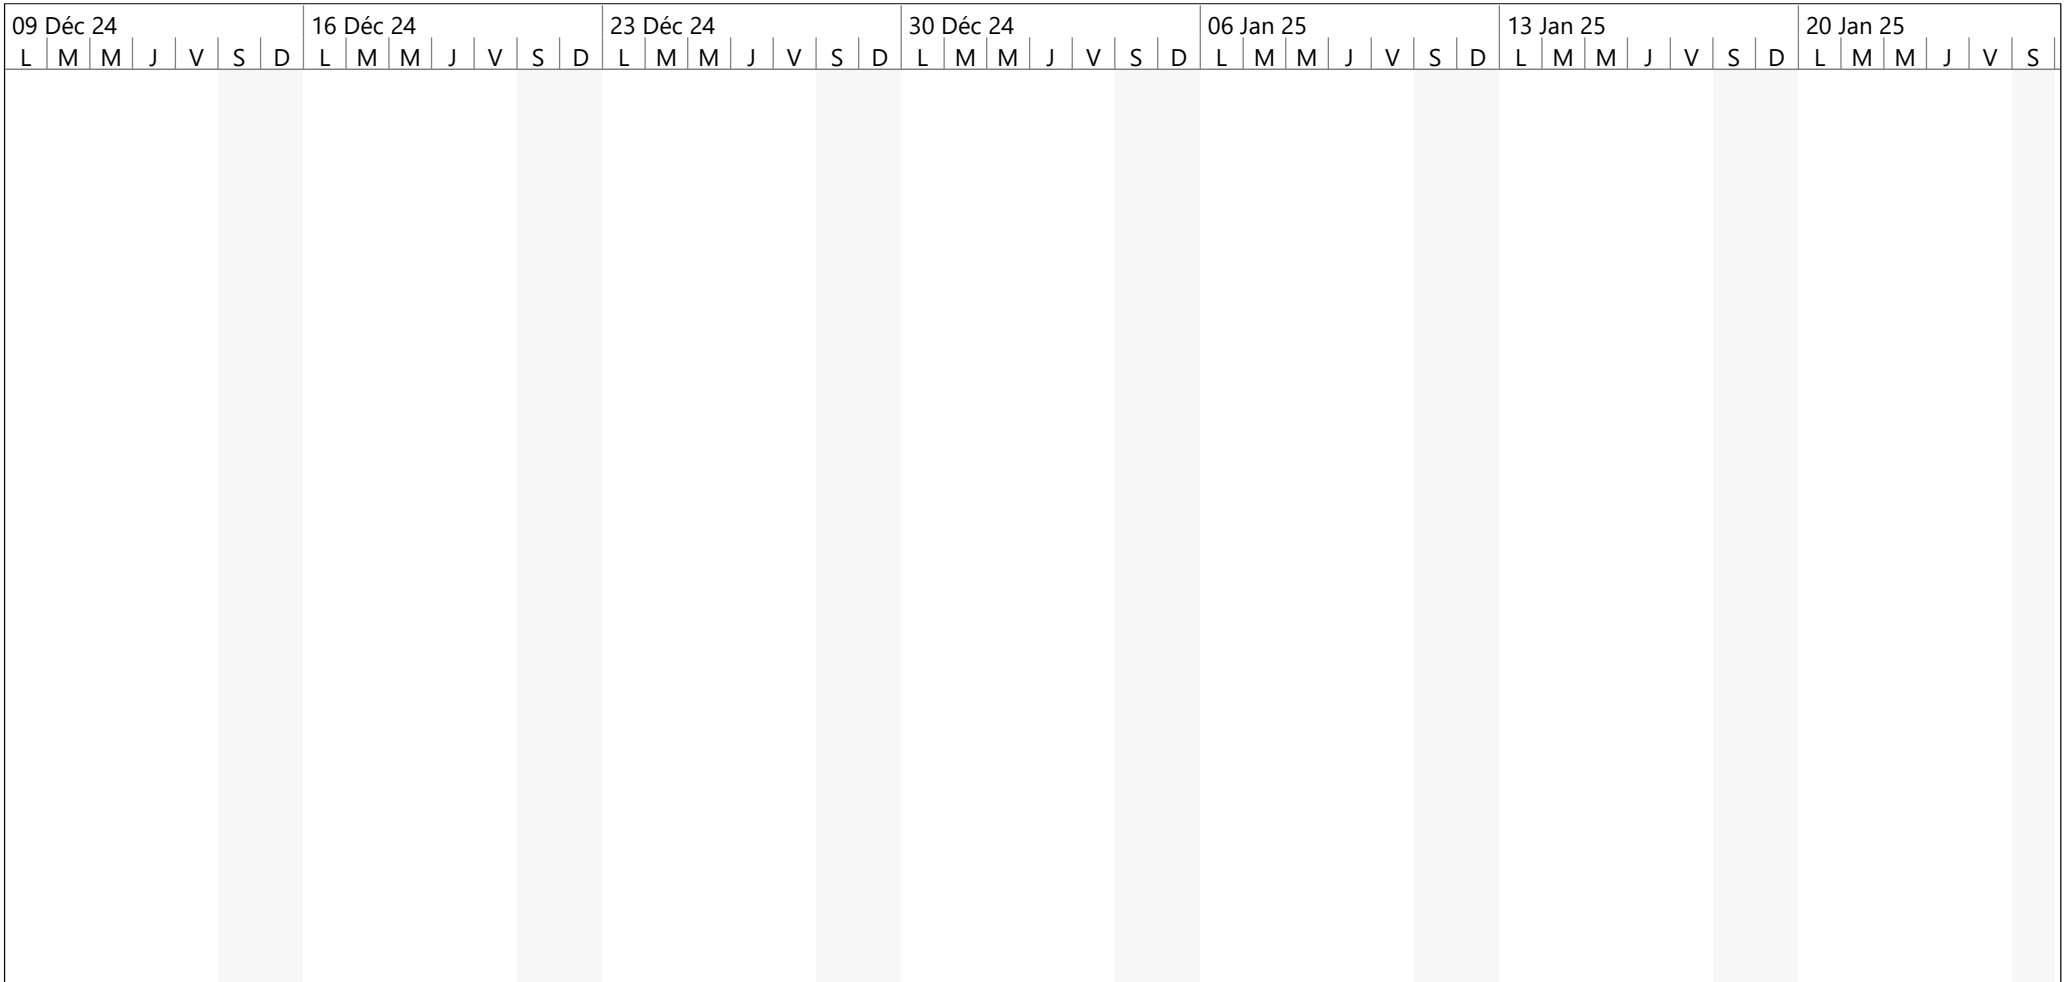

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

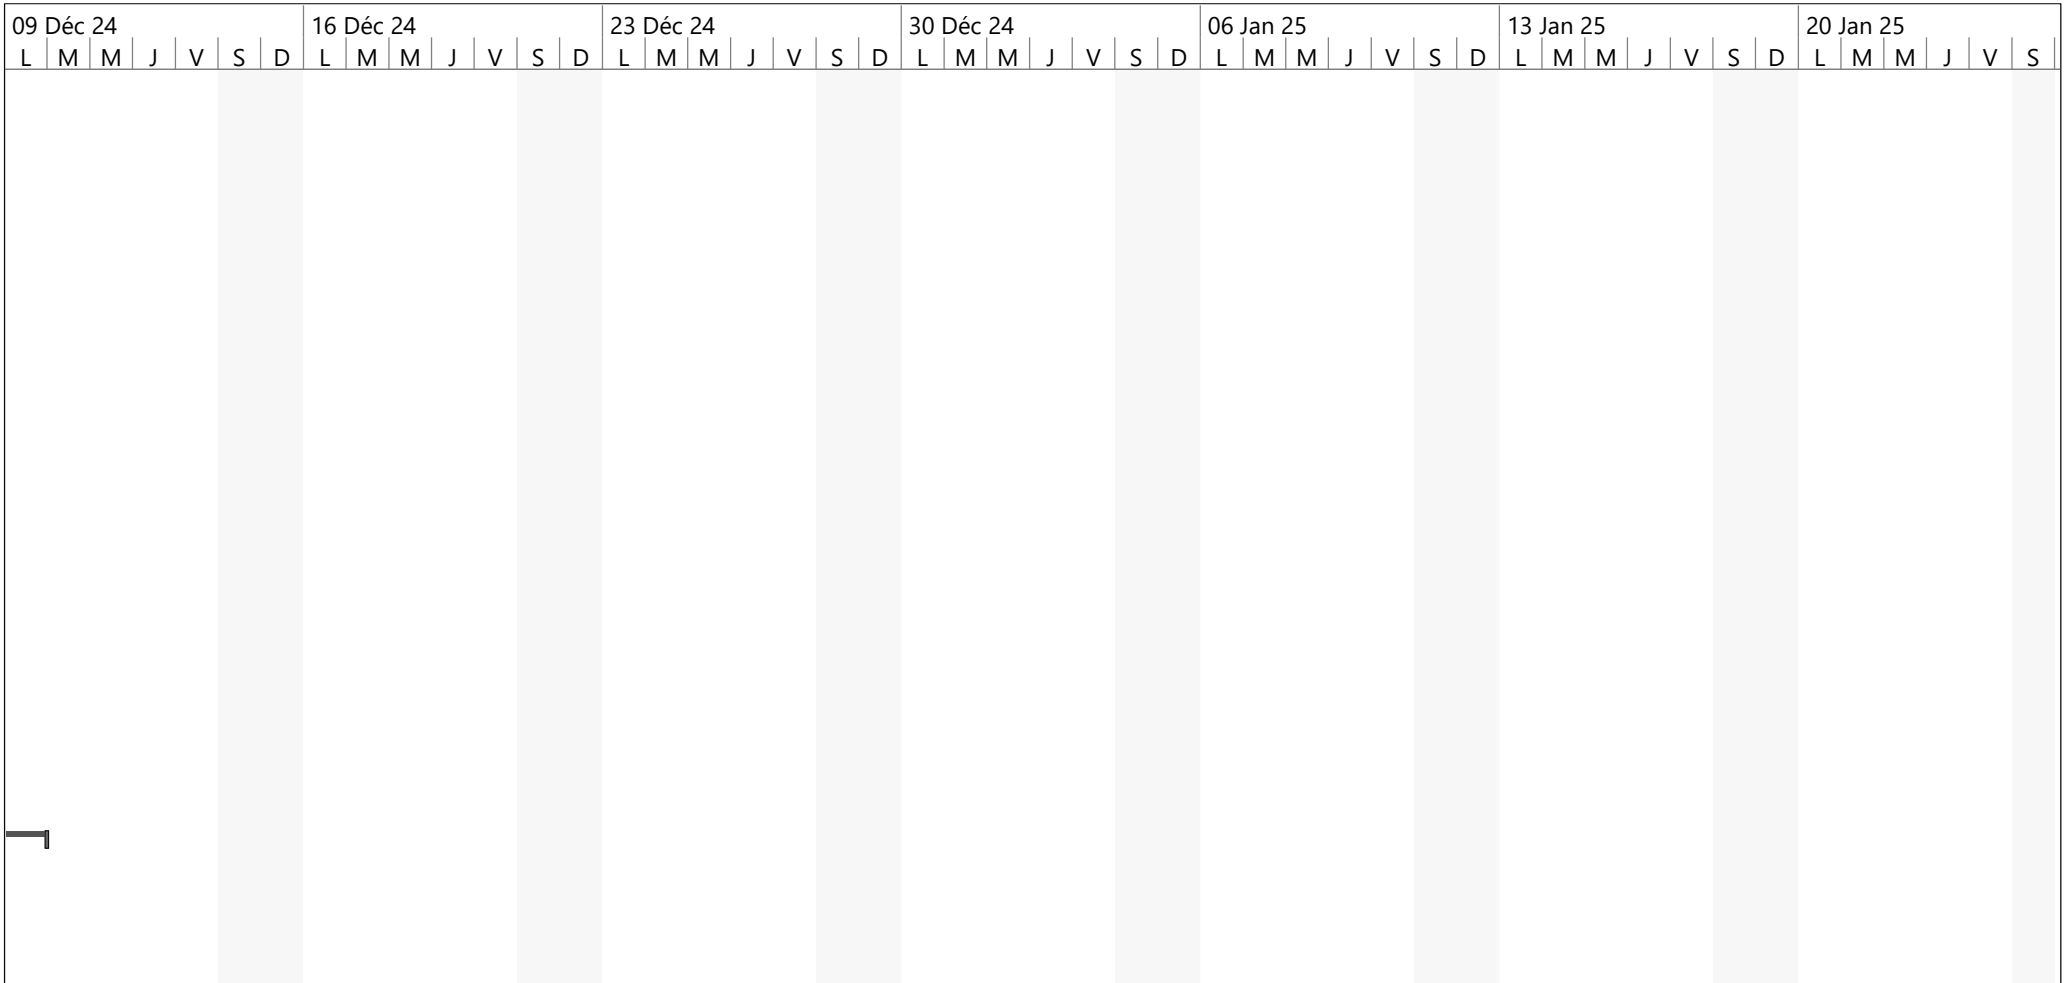

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

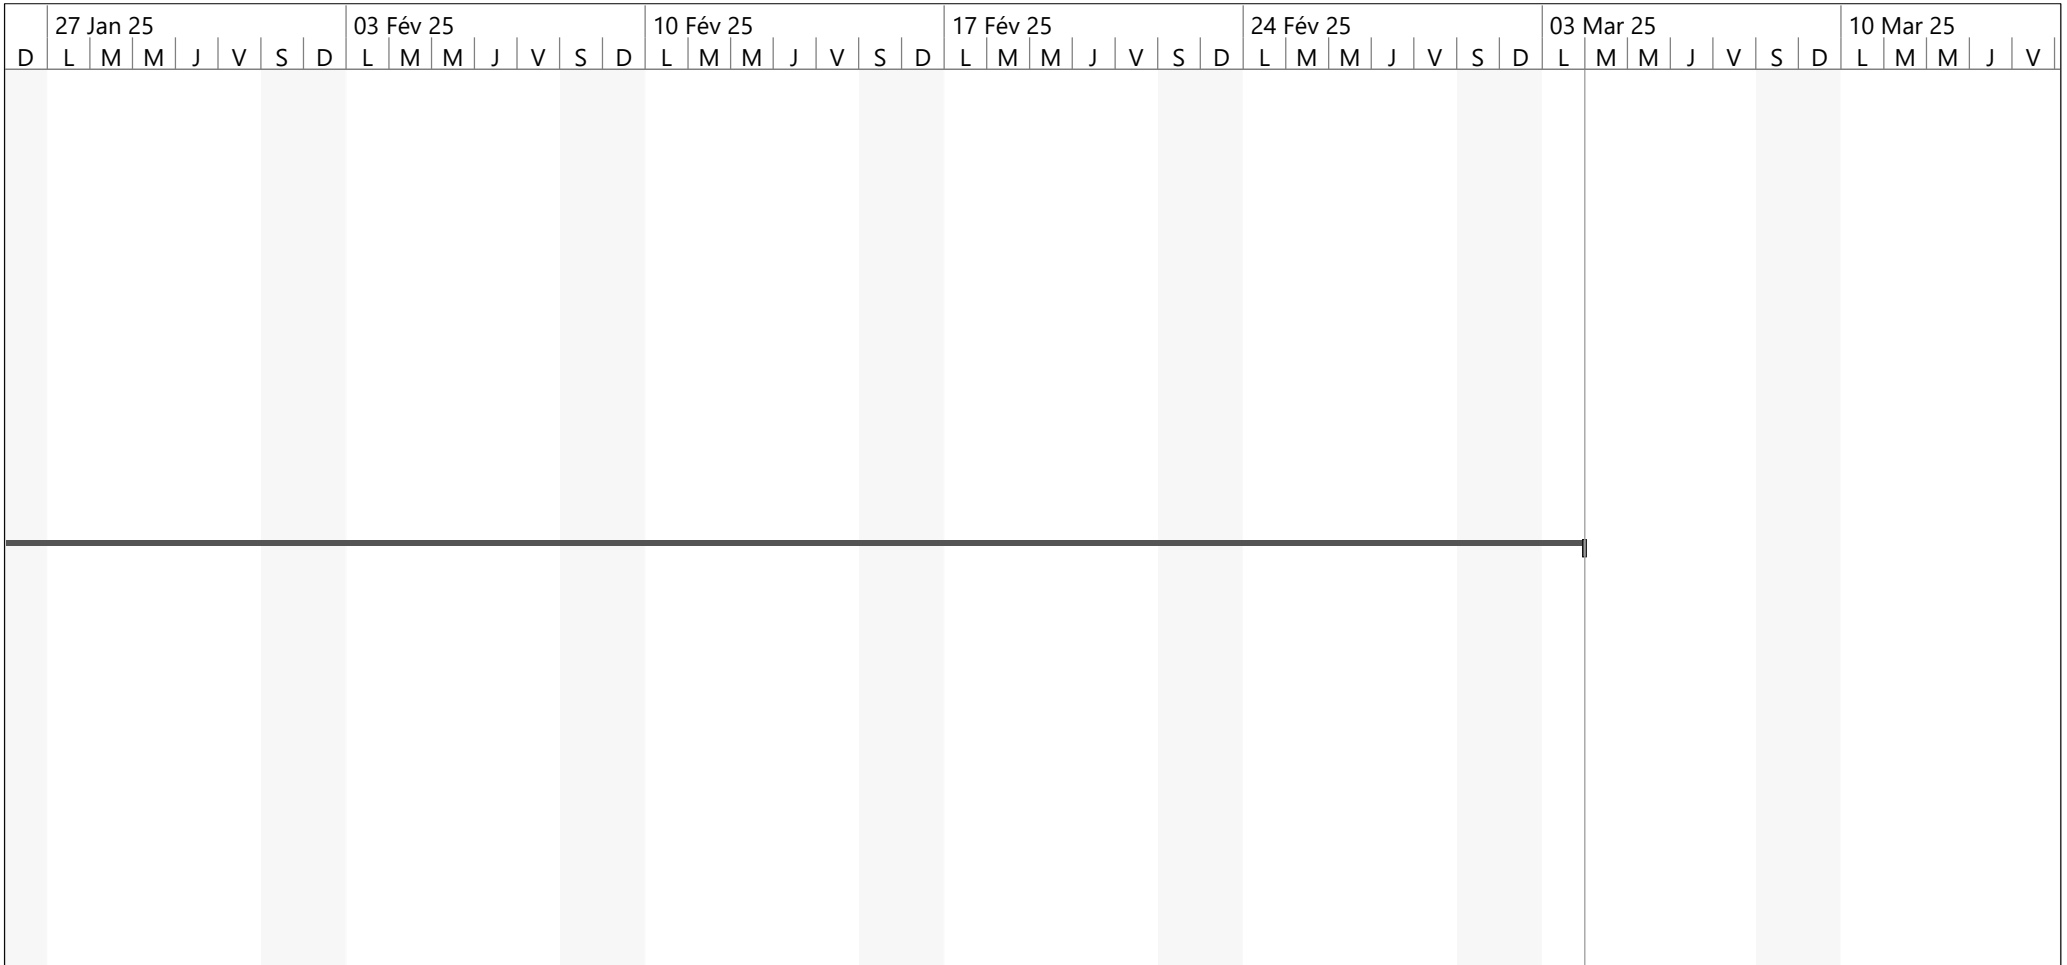

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

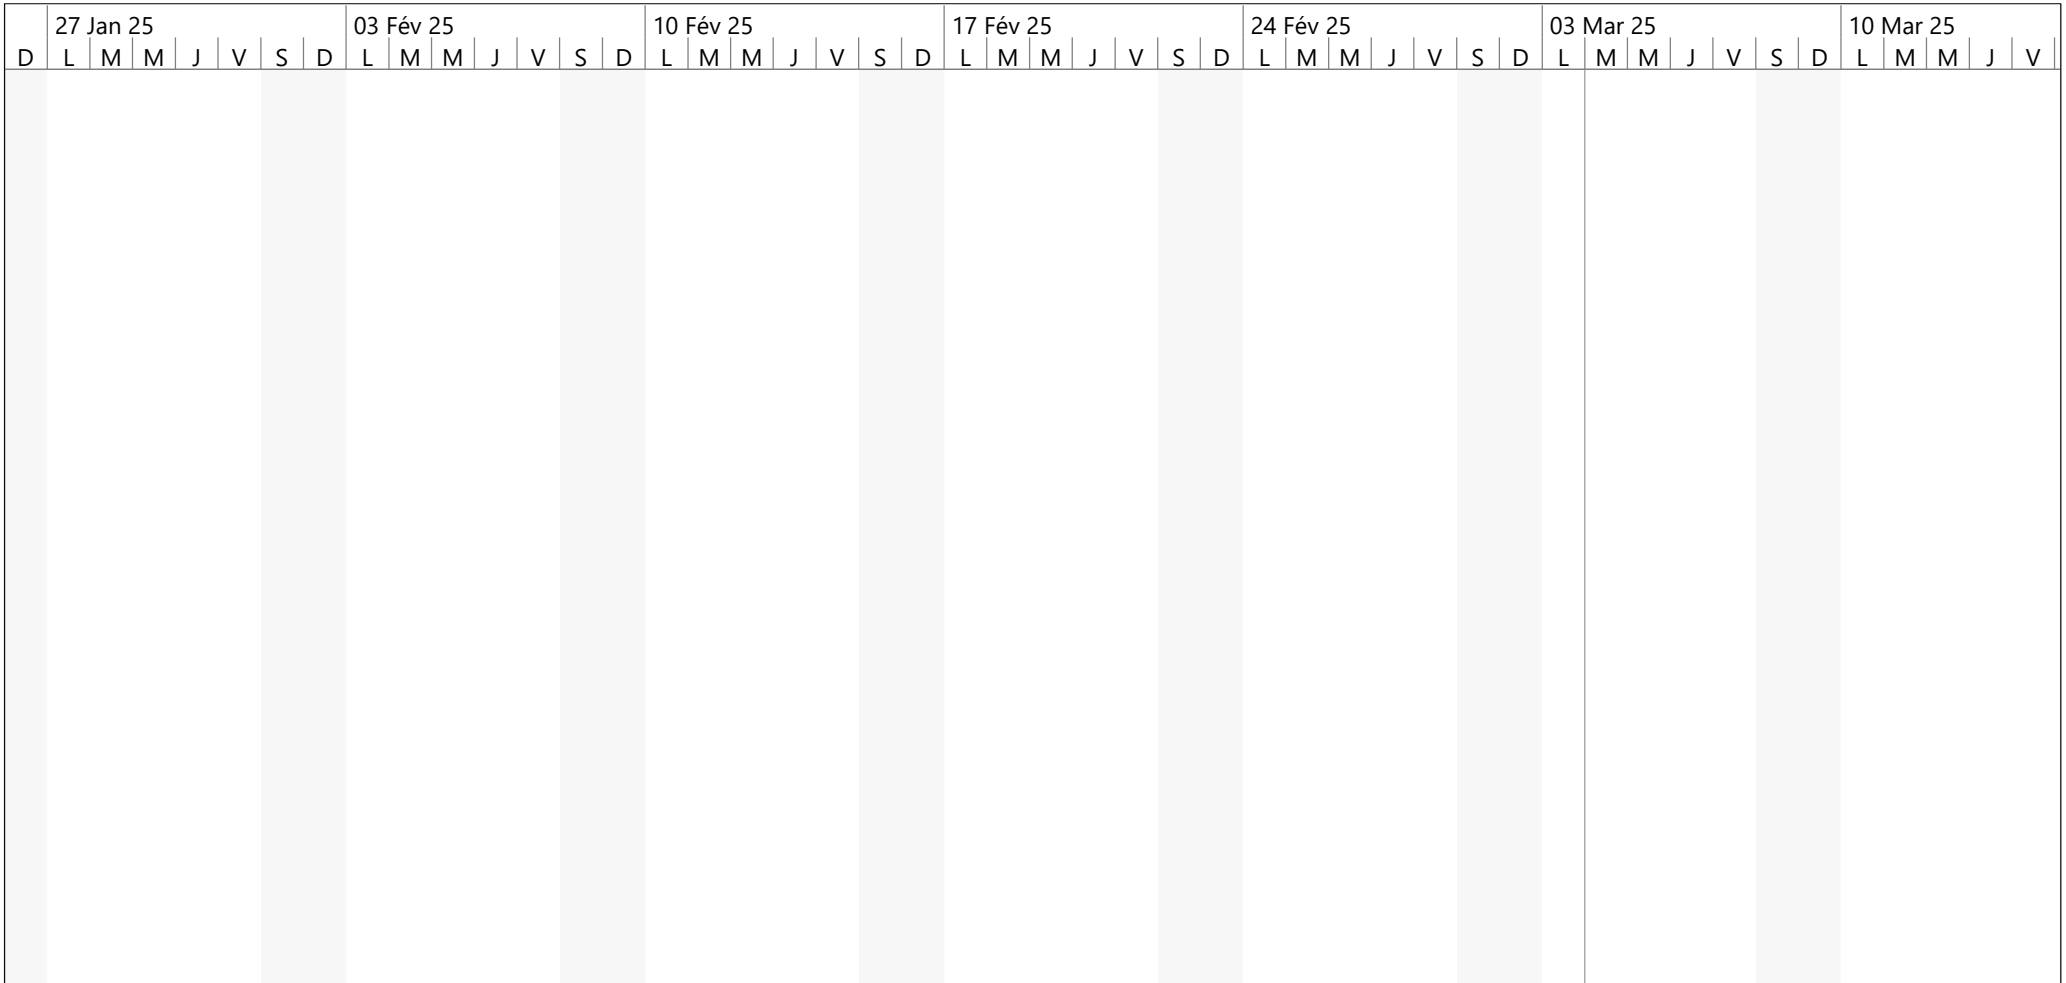

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

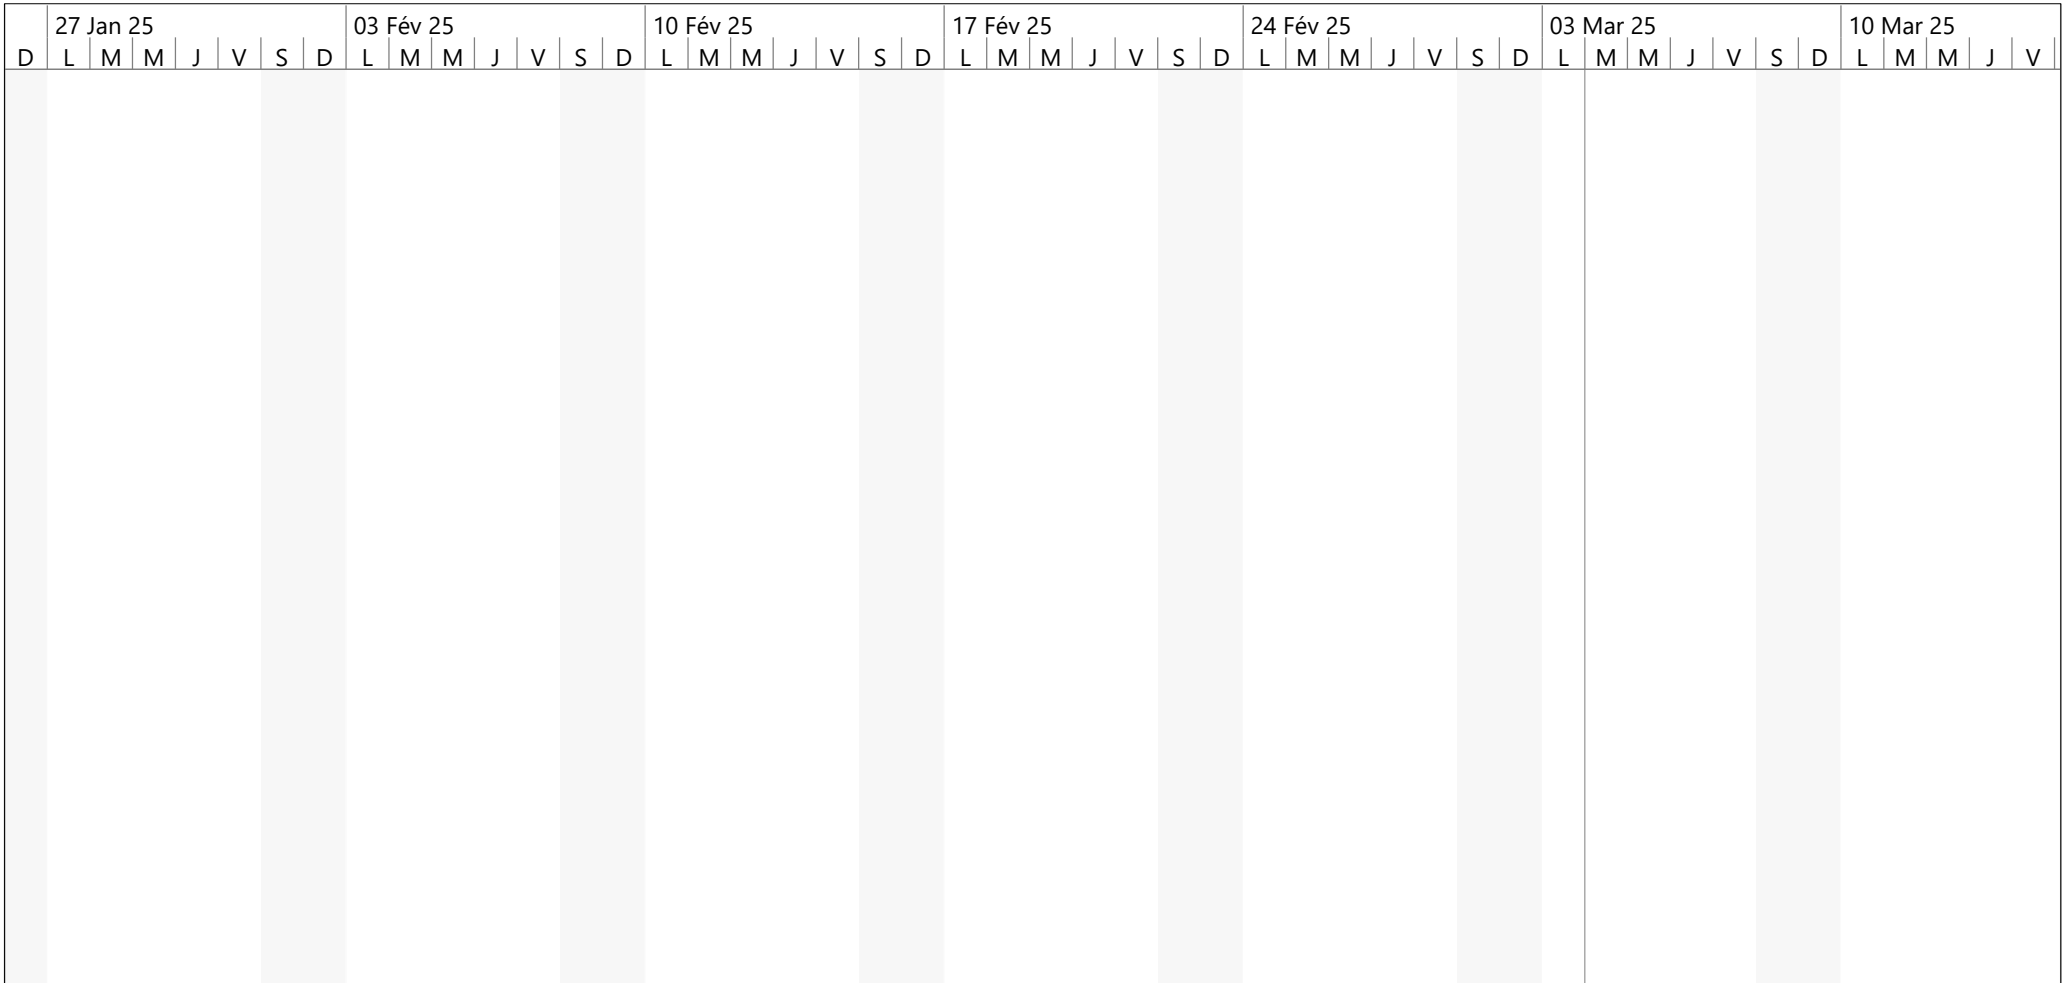

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

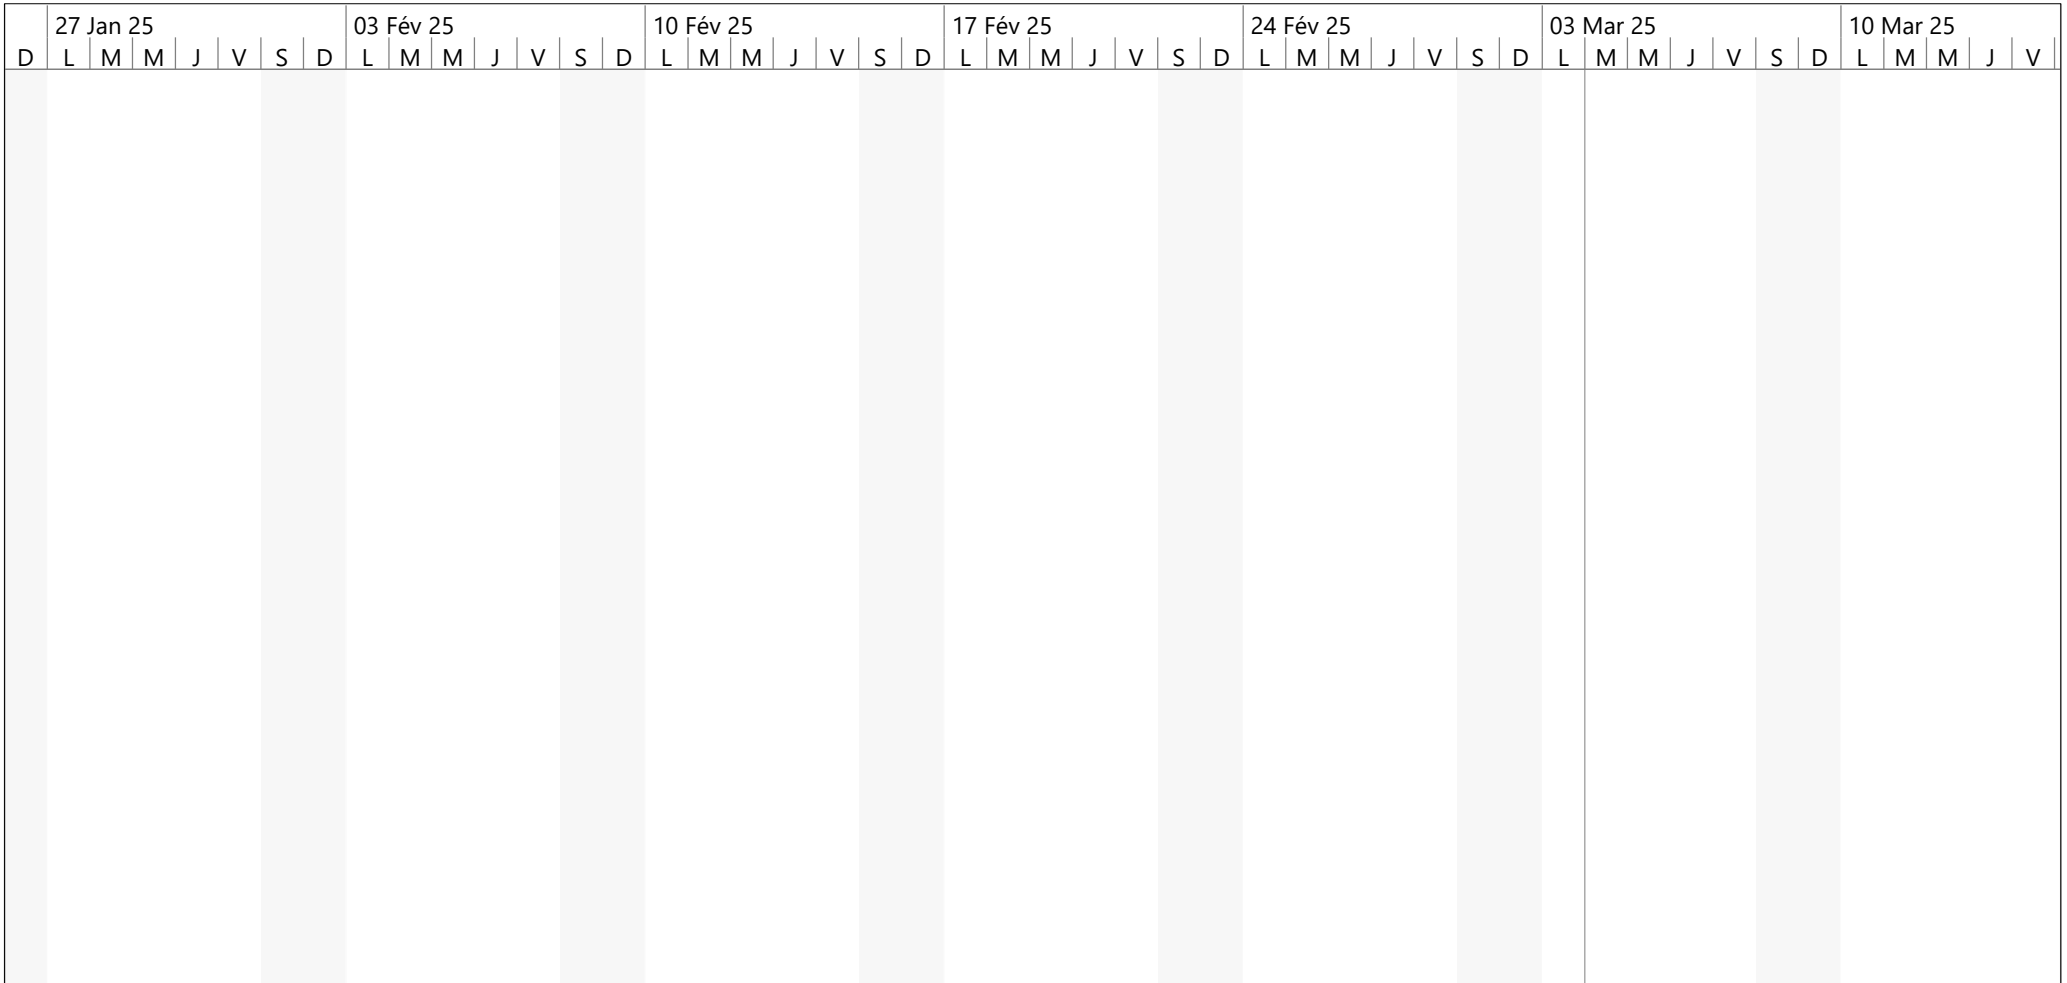

Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : UDM_ACADEMY_GLOB
Date : Dim 09/04/23

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			
